

| ID  |   | Task Mode | Art nr | Task Name                                     | Ühik | Duration   | Start        | Finish       | Notes | 2021 |                   |
|-----|---|-----------|--------|-----------------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|-------|------|-------------------|
|     |   |           |        |                                               |      |            |              |              |       | N    | Half 1, 2021<br>J |
| 1   |   |           |        | ETTEVALMISTAMINE                              |      | 384 days   | Mon 01.03.21 | Wed 31.08.21 |       |      |                   |
| 20  |   |           |        | MULLATÖÖD                                     |      | 346 days?  | Mon 29.03.21 | Fri 05.08.22 |       |      |                   |
| 21  |   |           |        | Põhitee 1 etapp PK 1713+00-1730+00 VP         |      | 126 days?  | Wed 28.04.21 | Mon 25.10.21 |       |      |                   |
| 33  |   |           |        | Põhitee 3 etapp Põhitee VP;T1,T2 täies mahu   |      | 268 days   | Tue 20.07.21 | Fri 05.08.22 |       |      |                   |
| 50  |   |           |        | Põhitee 2 etapp Põhitee PP                    |      | 43 days    | Wed 25.08.21 | Fri 22.10.21 |       |      |                   |
| 58  |   |           |        | Ramp 1 (2 etapp)                              |      | 151 days   | Thu 07.10.21 | Tue 10.05.22 |       |      |                   |
| 66  |   |           |        | Ramp 2 (0 etapp)                              |      | 181,9 days | Mon 29.03.21 | Mon 13.12.21 |       |      |                   |
| 74  |   |           |        | Kardla-Vorbuse tee (3etapp)                   |      | 277 days?  | Wed 05.05.21 | Fri 03.06.22 |       |      |                   |
| 81  |   |           |        | Ajutine tee Kärevere (0 etapp)                |      | 303 days?  | Mon 29.03.21 | Fri 03.06.22 |       |      |                   |
| 86  |   |           |        | Ajutine tee Kardla (0 etapp)                  |      | 299 days?  | Mon 05.04.21 | Fri 03.06.22 |       |      |                   |
| 91  |   |           |        | KATEND                                        |      | 308 days?  | Mon 03.05.21 | Tue 19.07.22 |       |      |                   |
| 92  | ✓ |           |        | Põhitee 1 etapp PK 1713+00-1730+00 VP         |      | 65 days    | Fri 21.05.21 | Tue 24.08.21 |       |      |                   |
| 99  |   |           |        | Põhitee 3 etapp Põhitee VP;T1,T2 täies mahu   |      | 97 days    | Tue 01.03.22 | Tue 19.07.22 |       |      |                   |
| 121 |   |           |        | Põhitee 2 etapp Põhitee PP                    |      | 62 days    | Fri 03.09.21 | Mon 29.11.21 |       |      |                   |
| 128 |   |           |        | Ramp 1 (3 etapp)                              |      | 42 days?   | Wed 11.05.21 | Mon 11.07.21 |       |      |                   |
| 136 |   |           |        | Ramp 2 (0 etapp)                              |      | 289 days   | Thu 13.05.21 | Fri 01.07.22 |       |      |                   |
| 140 |   |           |        | Kardla-Vorbuse tee (3etapp)                   |      | 19 days?   | Mon 09.05.21 | Thu 02.06.22 |       |      |                   |
| 147 | ✓ |           |        | Ajutine tee Kärevere (0 etapp)                |      | 14,5 days  | Mon 03.05.21 | Fri 21.05.21 |       |      |                   |
| 152 | ✓ |           |        | Ajutine tee Kardla (0 etapp)                  |      | 8 days     | Thu 13.05.21 | Mon 24.05.21 |       |      |                   |
| 157 |   |           |        | DRENAAŽ JA TRUUBID                            |      | 189 days   | Mon 12.04.21 | Wed 05.01.22 |       |      |                   |
| 171 |   |           |        | KONSTRUKTSIOONID                              |      | 379 days   | Tue 19.01.21 | Fri 15.07.22 |       |      |                   |
| 172 |   |           |        | Lahenduste valmine                            |      | 10 days    | Mon 01.03.21 | Fri 12.03.21 |       |      |                   |
| 173 |   |           |        | Projekteerimine (sh T3 ja T4 süvendi projekt) |      | 10 days    | Mon 15.03.21 | Fri 26.03.21 |       |      |                   |

Project: Põhimaantee nr 2 Käreve

Date: Mon 15.11.21

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only





































Finish-only




















Deadline

Progress































Manual Progress

Page 1




















| ID  |  | Task Mode                                                                         | Art nr | Task Name                                                                               | Ühik | Duration        | Start               | Finish              | Notes | 2021 |                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|---------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                   |                                                                                   |        |                                                                                         |      |                 |                     |                     |       | N    | Half 1, 2021<br>J                                                                   |
| 174 |                                                                                   |  |        | Kooskõlastamine                                                                         |      | 20 days         | Mon 29.03.21        | Mon 26.04.21        |       |      |  |
| 175 |                                                                                   |  |        | <b>T1 Suuruluki tunnel PK 1708+50,75</b>                                                |      | <b>215 days</b> | <b>Mon 01.03.21</b> | <b>Fri 31.12.21</b> |       |      |                                                                                     |
| 176 |  |  |        | Raadamine NB! pesitsusperiood                                                           | tk   | 25 days         | Fri 26.02.21        | Fri 02.04.21        |       |      |                                                                                     |
| 177 |  |  |        | T1 ettevalmistustööd - ajutise ümbersõidu ehitus, platsi (sh vaiatööde aluse) rajamine, |      | 5 days          | Mon 24.05.21        | Fri 28.05.21        |       |      |                                                                                     |
| 178 |  |  |        | T1 vaiatööd                                                                             |      | 26 days         | Mon 07.06.21        | Wed 14.07.21        |       |      |                                                                                     |
| 179 |  |  |        | T1 vaiade väljakaev, vaiade piikamine, roostvärkide aluste ehitus                       |      | 12 days         | Thu 15.07.21        | Fri 30.07.21        |       |      |                                                                                     |
| 180 |  |  |        | T1 roostvärkide ehitus                                                                  |      | 66 days         | Wed 30.06.21        | Thu 30.09.21        |       |      |                                                                                     |
| 181 |  |  |        | T1 sammaste ehitus                                                                      |      | 82 days         | Mon 03.01.21        | Thu 28.04.22        |       |      |                                                                                     |
| 182 |  |  |        | T1 tugiosade paigaldus                                                                  |      | 5 days          | Fri 29.04.22        | Thu 05.05.22        |       |      |                                                                                     |
| 183 |  |  |        | T1 metallkonstruktsiooni paigaldus                                                      |      | 11 days         | Fri 06.05.22        | Fri 20.05.22        |       |      |                                                                                     |
| 184 |  |  |        | T1 tekiplaadi ehitus                                                                    |      | 20 days         | Mon 23.05.21        | Fri 17.06.22        |       |      |                                                                                     |
| 185 |                                                                                   |  |        | <b>Vahetähtaeg</b>                                                                      |      | <b>0 days</b>   | <b>Fri 31.12.21</b> | <b>Fri 31.12.21</b> |       |      |                                                                                     |
| 186 |                                                                                   |  |        | <b>T2 Suuruluki tunnel PK 1734+62,5</b>                                                 |      | <b>215 days</b> | <b>Mon 01.03.21</b> | <b>Fri 31.12.21</b> |       |      |                                                                                     |
| 187 |  |  |        | Raadamine NB! pesitsusperiood                                                           |      | 25 days         | Fri 26.02.21        | Fri 02.04.21        |       |      |                                                                                     |
| 188 |  |  |        | T2 ettevalmistustööd - ajutise ümbersõidu ehitus, platsi (sh vaiatööde aluse) rajamine, |      | 5 days          | Mon 07.06.21        | Fri 11.06.21        |       |      |                                                                                     |
| 189 |  |  |        | T2 vaiatööd                                                                             |      | 10 days         | Mon 02.08.21        | Fri 13.08.21        |       |      |                                                                                     |
| 190 |  |  |        | T2 vaiade väljakaev, vaiade piikamine, roostvärkide aluste ehitus                       |      | 14 days         | Mon 16.08.21        | Fri 03.09.21        |       |      |                                                                                     |
| 191 |  |  |        | T2 roostvärkide ehitus                                                                  |      | 20 days         | Mon 13.09.21        | Sun 10.10.21        |       |      |                                                                                     |
| 192 |  |  |        | T2 sammaste ehitus                                                                      |      | 83 days         | Mon 15.11.21        | Fri 11.03.22        |       |      |                                                                                     |




|                                                        |                    |                                                                                     |                       |                                                                                       |                 |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Project: Põhimaantee nr 2 Käreve<br>Date: Mon 15.11.21 | Task               |  | Inactive Task         |  | Start-only      |  |
|                                                        | Split              |  | Inactive Milestone    |  | Finish-only     |  |
|                                                        | Milestone          |  | Inactive Summary      |  | Deadline        |  |
|                                                        | Summary            |  | Manual Task           |  | Progress        |  |
|                                                        | Project Summary    |  | Duration-only         |  | Manual Progress |  |
|                                                        | External Tasks     |  | Manual Summary Rollup |  |                 |                                                                                       |
|                                                        | External Milestone |  | Manual Summary        |  |                 |                                                                                       |






















| ID  |                                                                                   | Task Mode                                                                         | Art nr | Task Name                                         | Ühik                    | Duration         | Start               | Finish              | Notes |   | 2021              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------|---|-------------------|
|     |  |                                                                                   |        |                                                   |                         |                  |                     |                     |       | N | Half 1, 2021<br>J |
| 214 |  |  |        | T4 kaarepaigaldus                                 |                         | 10 days          | Mon 14.06.21        | Tue 29.06.21        |       |   |                   |
| 215 |  |  |        | T4 tagasitäide (sh betoniitmati paigaldus)        |                         | 5 days           | Wed 30.06.21        | Tue 06.07.21        |       |   |                   |
| 216 |  |  |        | T4 tee-ehitus (alused, asfalt, joonimine, piirid) |                         | 30 days          | Fri 23.07.21        | Fri 03.09.21        |       |   |                   |
| 217 |  |  |        | T4 muud töö                                       |                         | 20 days          | Thu 16.06.22        | Fri 15.07.22        |       |   |                   |
| 218 |                                                                                   |  |        | <b>Vahetähtaeg</b>                                |                         | <b>0 days</b>    | <b>Fri 31.12.21</b> | <b>Fri 31.12.21</b> |       |   |                   |
| 219 |                                                                                   |  |        | <b>LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID</b>                   |                         | <b>382 days?</b> | <b>Mon 01.03.21</b> | <b>Mon 29.08.21</b> |       |   |                   |
| 240 |                                                                                   |  |        | <b>TEHNOVÕRGUD</b>                                |                         | <b>334 days</b>  | <b>Wed 07.04.21</b> | <b>Thu 28.07.22</b> |       |   |                   |
| 241 |                                                                                   |  |        | <b>Elekter</b>                                    |                         | <b>266 days</b>  | <b>Wed 14.07.21</b> | <b>Thu 28.07.22</b> |       |   |                   |
| 257 |                                                                                   |  |        | <b>Side</b>                                       |                         | <b>259 days</b>  | <b>Wed 07.04.21</b> | <b>Mon 11.04.21</b> |       |   |                   |
| 266 |                                                                                   |  |        | <b>MAASTIKUKUJUNDUS</b>                           |                         | <b>107 days</b>  | <b>Mon 21.03.21</b> | <b>Fri 19.08.22</b> |       |   |                   |
| 282 |                                                                                   |  |        | HANKED välja                                      |                         | 258 days         | Wed 27.01.21        | Mon 31.01.21        |       |   |                   |
| 283 |  |  |        | ÜLDINE SKEEM Teedeehitus                          |                         | 1 day            | Tue 19.01.21        | Tue 19.01.21        |       |   |                   |
| 284 |  |  | 1      | Ajutine Kärevere+ ajutine T3 ja T4                | 22.03-1                 | 1 day            | Tue 19.01.21        | Tue 19.01.21        |       |   |                   |
| 285 |  |  | 2      | Ajutine tee Kardla                                | 22.03-1                 | 1 day            | Tue 19.01.21        | Tue 19.01.21        |       |   |                   |
| 286 |  |  | 3      | PK 1713+00-1731+00 VP 40%                         | Leping tähtaeg          | 243 days         | Tue 19.01.21        | Fri 31.12.21        |       |   |                   |
| 287 |                                                                                   |  | 4      | PK 1713+00-1731+00 PP 60%                         | Vabariigi 520401 pinnas | 51 days          | Fri 03.09.21        | Fri 12.11.21        |       |   |                   |
| 288 |                                                                                   |  | 5      | PK 1703+00-1713+00 T1                             |                         | 254 days         | Fri 03.09.21        | Wed 31.08.21        |       |   |                   |
| 289 |                                                                                   |  | 6      | PK 1731+00-1741+00 T2                             |                         | 254 days         | Fri 03.09.21        | Wed 31.08.21        |       |   |                   |
| 290 |  |  | 7      | Algus ja lõpp                                     |                         | 254 days?        | Fri 03.09.21        | Wed 31.08.21        |       |   |                   |
| 291 |                                                                                   |  |        | <b>NCN põhivalmidus 10%</b>                       |                         | <b>350 days</b>  | <b>Mon 29.03.21</b> | <b>Thu 11.08.22</b> |       |   |                   |


Project: Põhimaantee nr 2 Käreve  
Date: Mon 15.11.21


|                    |                                                                                     |                       |                                                                                       |                 |                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Task               |  | Inactive Task         |  | Start-only      |  |
| Split              |  | Inactive Milestone    |  | Finish-only     |  |
| Milestone          |  | Inactive Summary      |  | Deadline        |  |
| Summary            |  | Manual Task           |  | Progress        |  |
| Project Summary    |  | Duration-only         |  | Manual Progress |  |
| External Tasks     |  | Manual Summary Rollup |  |                 |                                                                                       |
| External Milestone |  | Manual Summary        |  |                 |                                                                                       |


| ID  |  | Task Mode                                                                         | Art nr | Task Name                                          | Ühik | Duration        | Start              | Finish              | Notes |   | 2021              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|---|-------------------|
|     |                                                                                   |                                                                                   |        |                                                    |      |                 |                    |                     |       | N | Half 1, 2021<br>J |
| 292 |                                                                                   |  |        | <b>Põhivalmidus saavutatud (meeskonna prognoos</b> |      | <b>342 days</b> | <b>Mon 29.03.2</b> | <b>Mon 01.08.2</b>  |       |   |                   |
| 293 |                                                                                   |  |        | <b>Lepinguline tähtaeg</b>                         |      | <b>386 days</b> | <b>Mon 29.03.2</b> | <b>Fri 30.09.22</b> |       |   |                   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


|                                                        |                    |                                                                                     |                       |                                                                                       |                 |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Project: Põhimaantee nr 2 Käreve<br>Date: Mon 15.11.21 | Task               |  | Inactive Task         |  | Start-only      |  |
|                                                        | Split              |  | Inactive Milestone    |  | Finish-only     |  |
|                                                        | Milestone          |  | Inactive Summary      |  | Deadline        |  |
|                                                        | Summary            |  | Manual Task           |  | Progress        |  |
|                                                        | Project Summary    |  | Duration-only         |  | Manual Progress |  |
|                                                        | External Tasks     |  | Manual Summary Rollup |  |                 |                                                                                       |
|                                                        | External Milestone |  | Manual Summary        |  |                 |                                                                                       |

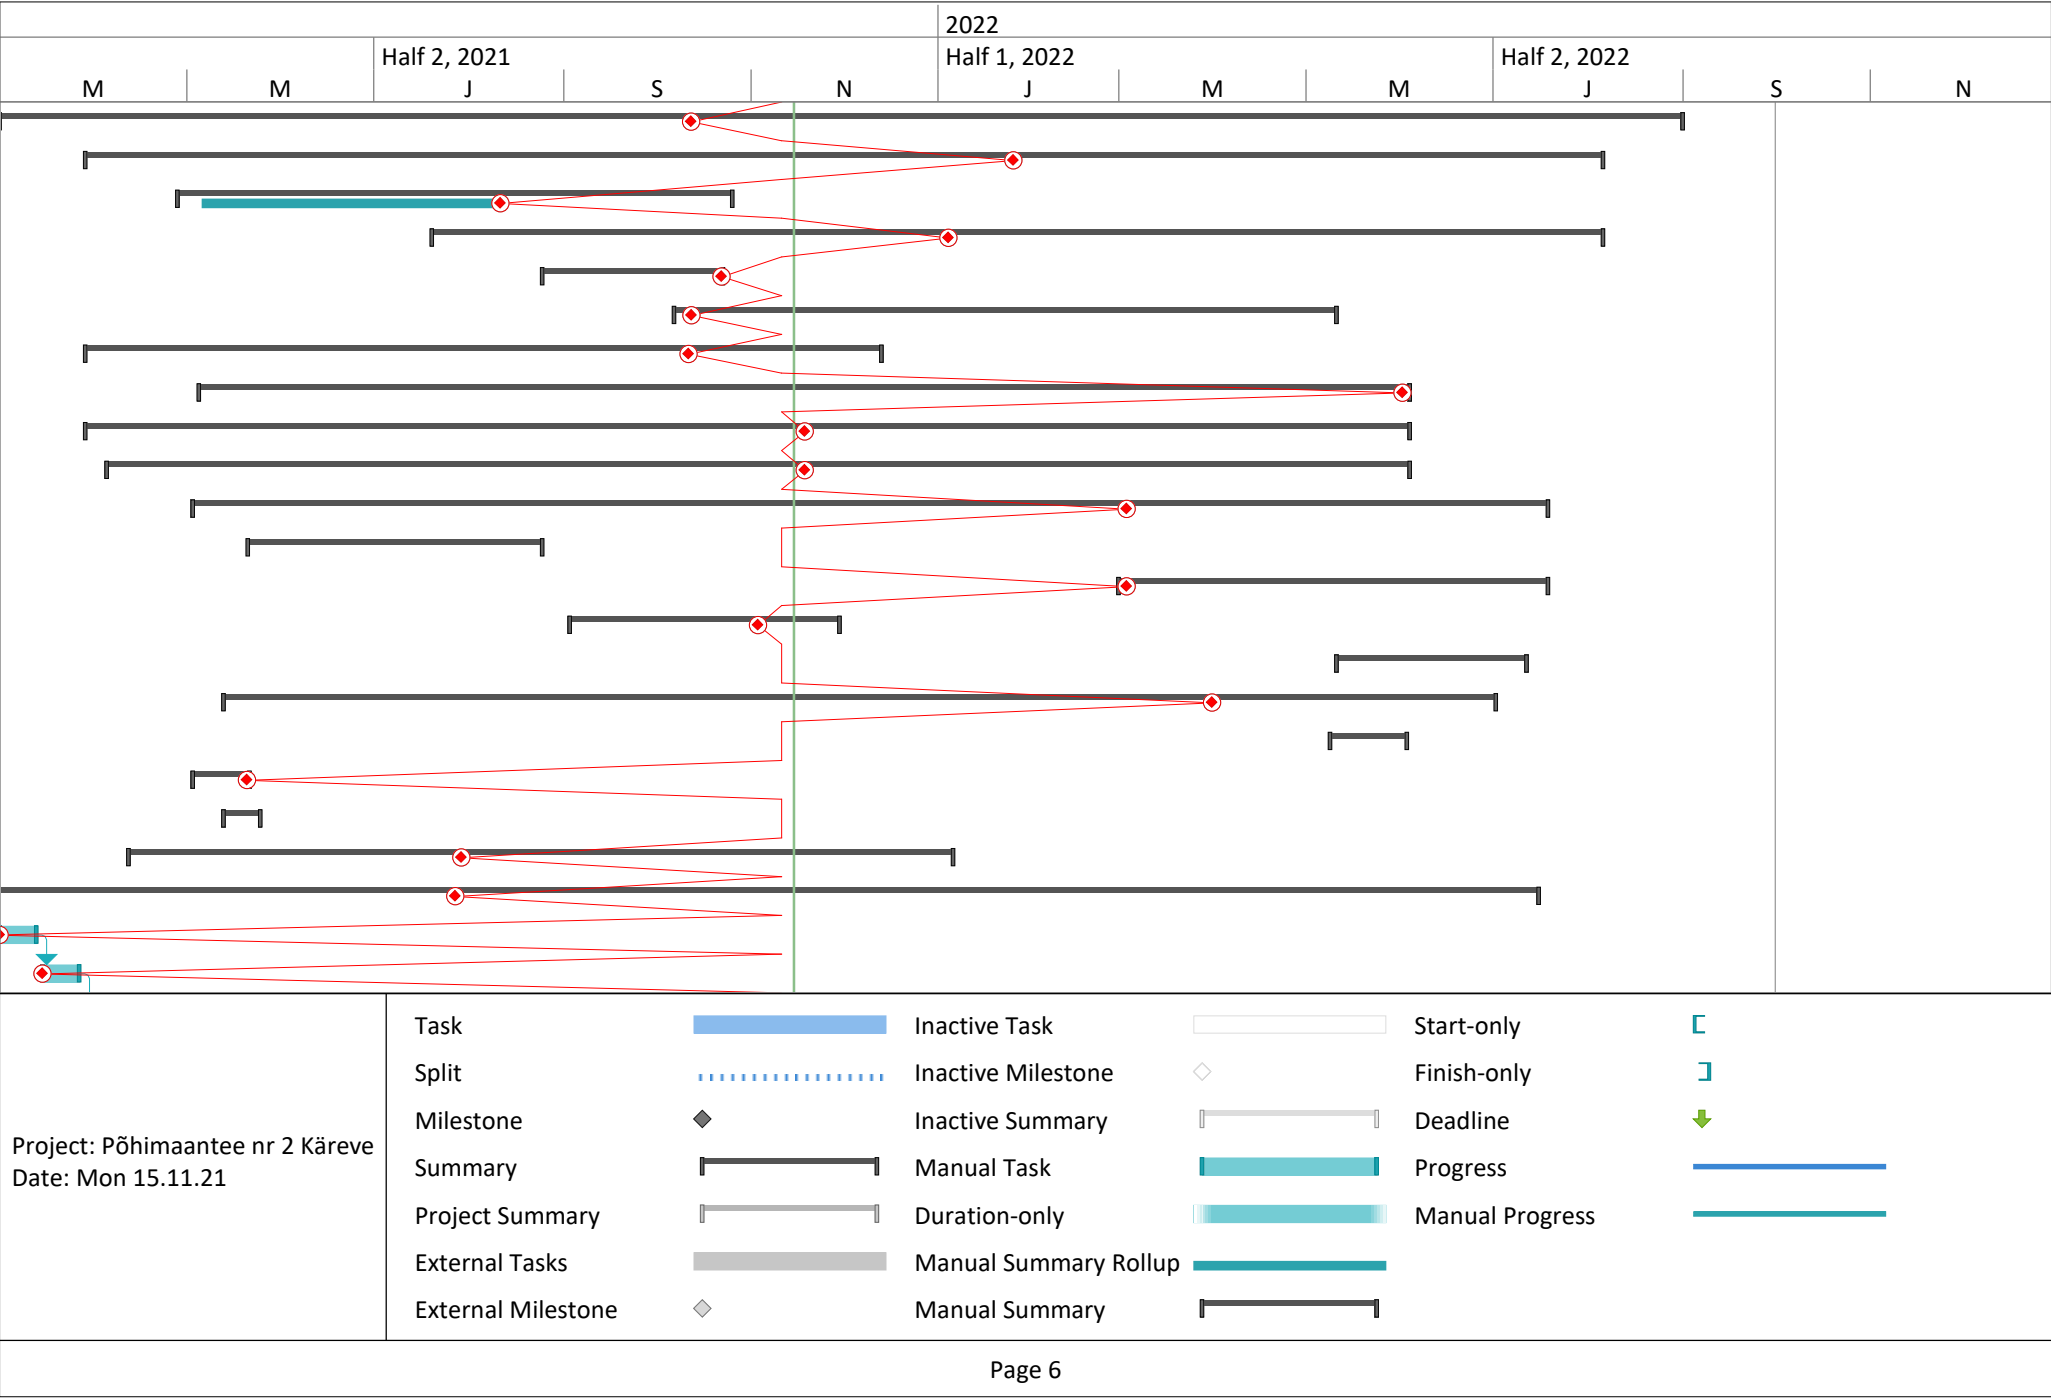

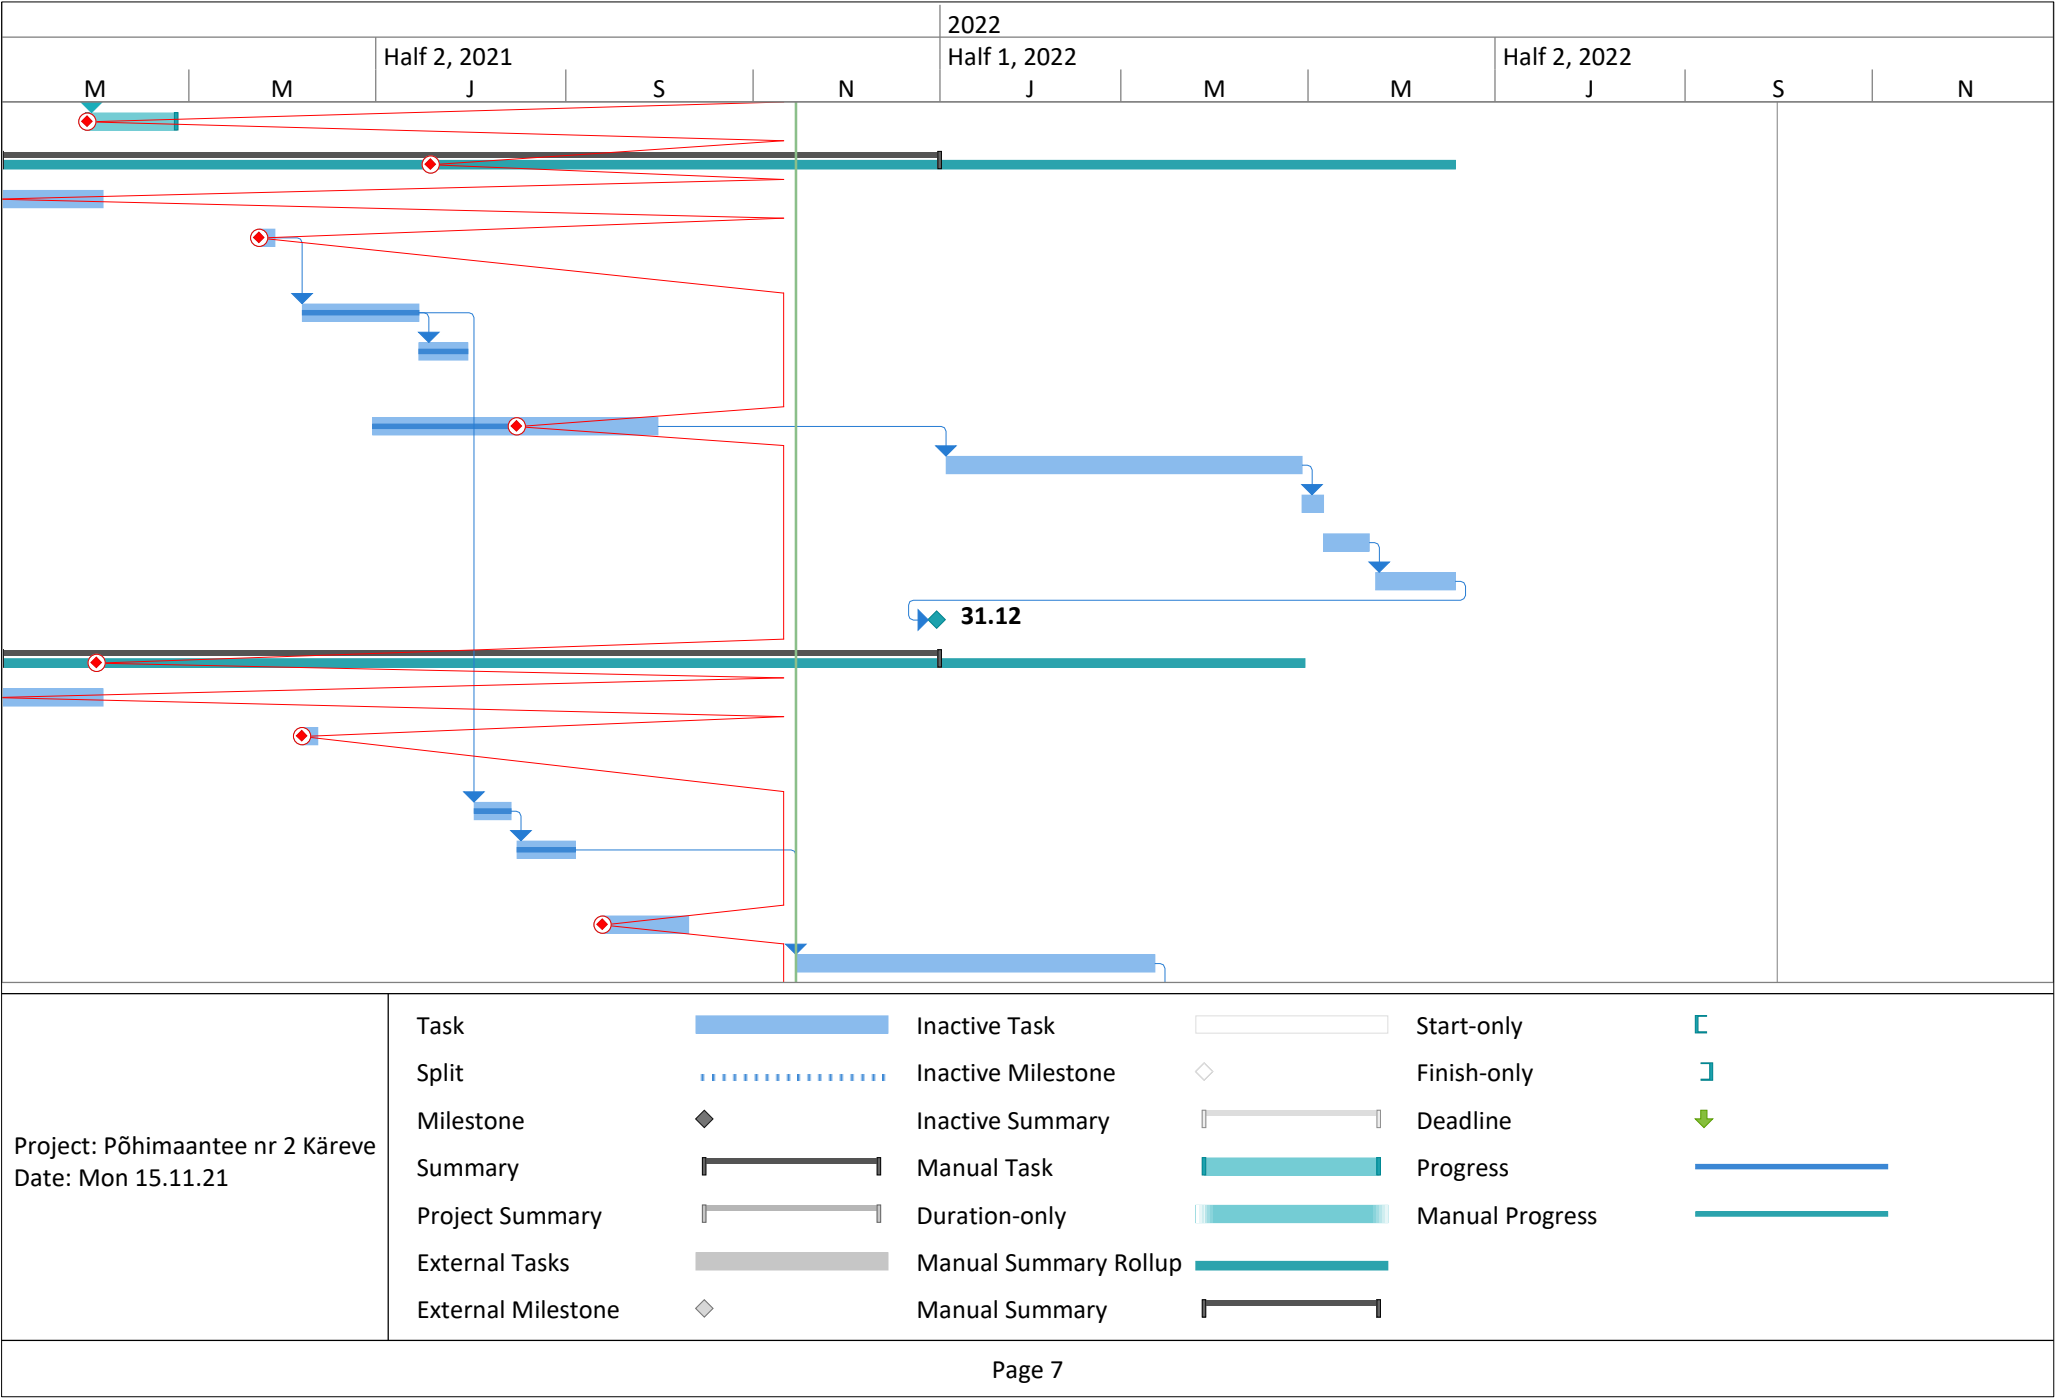

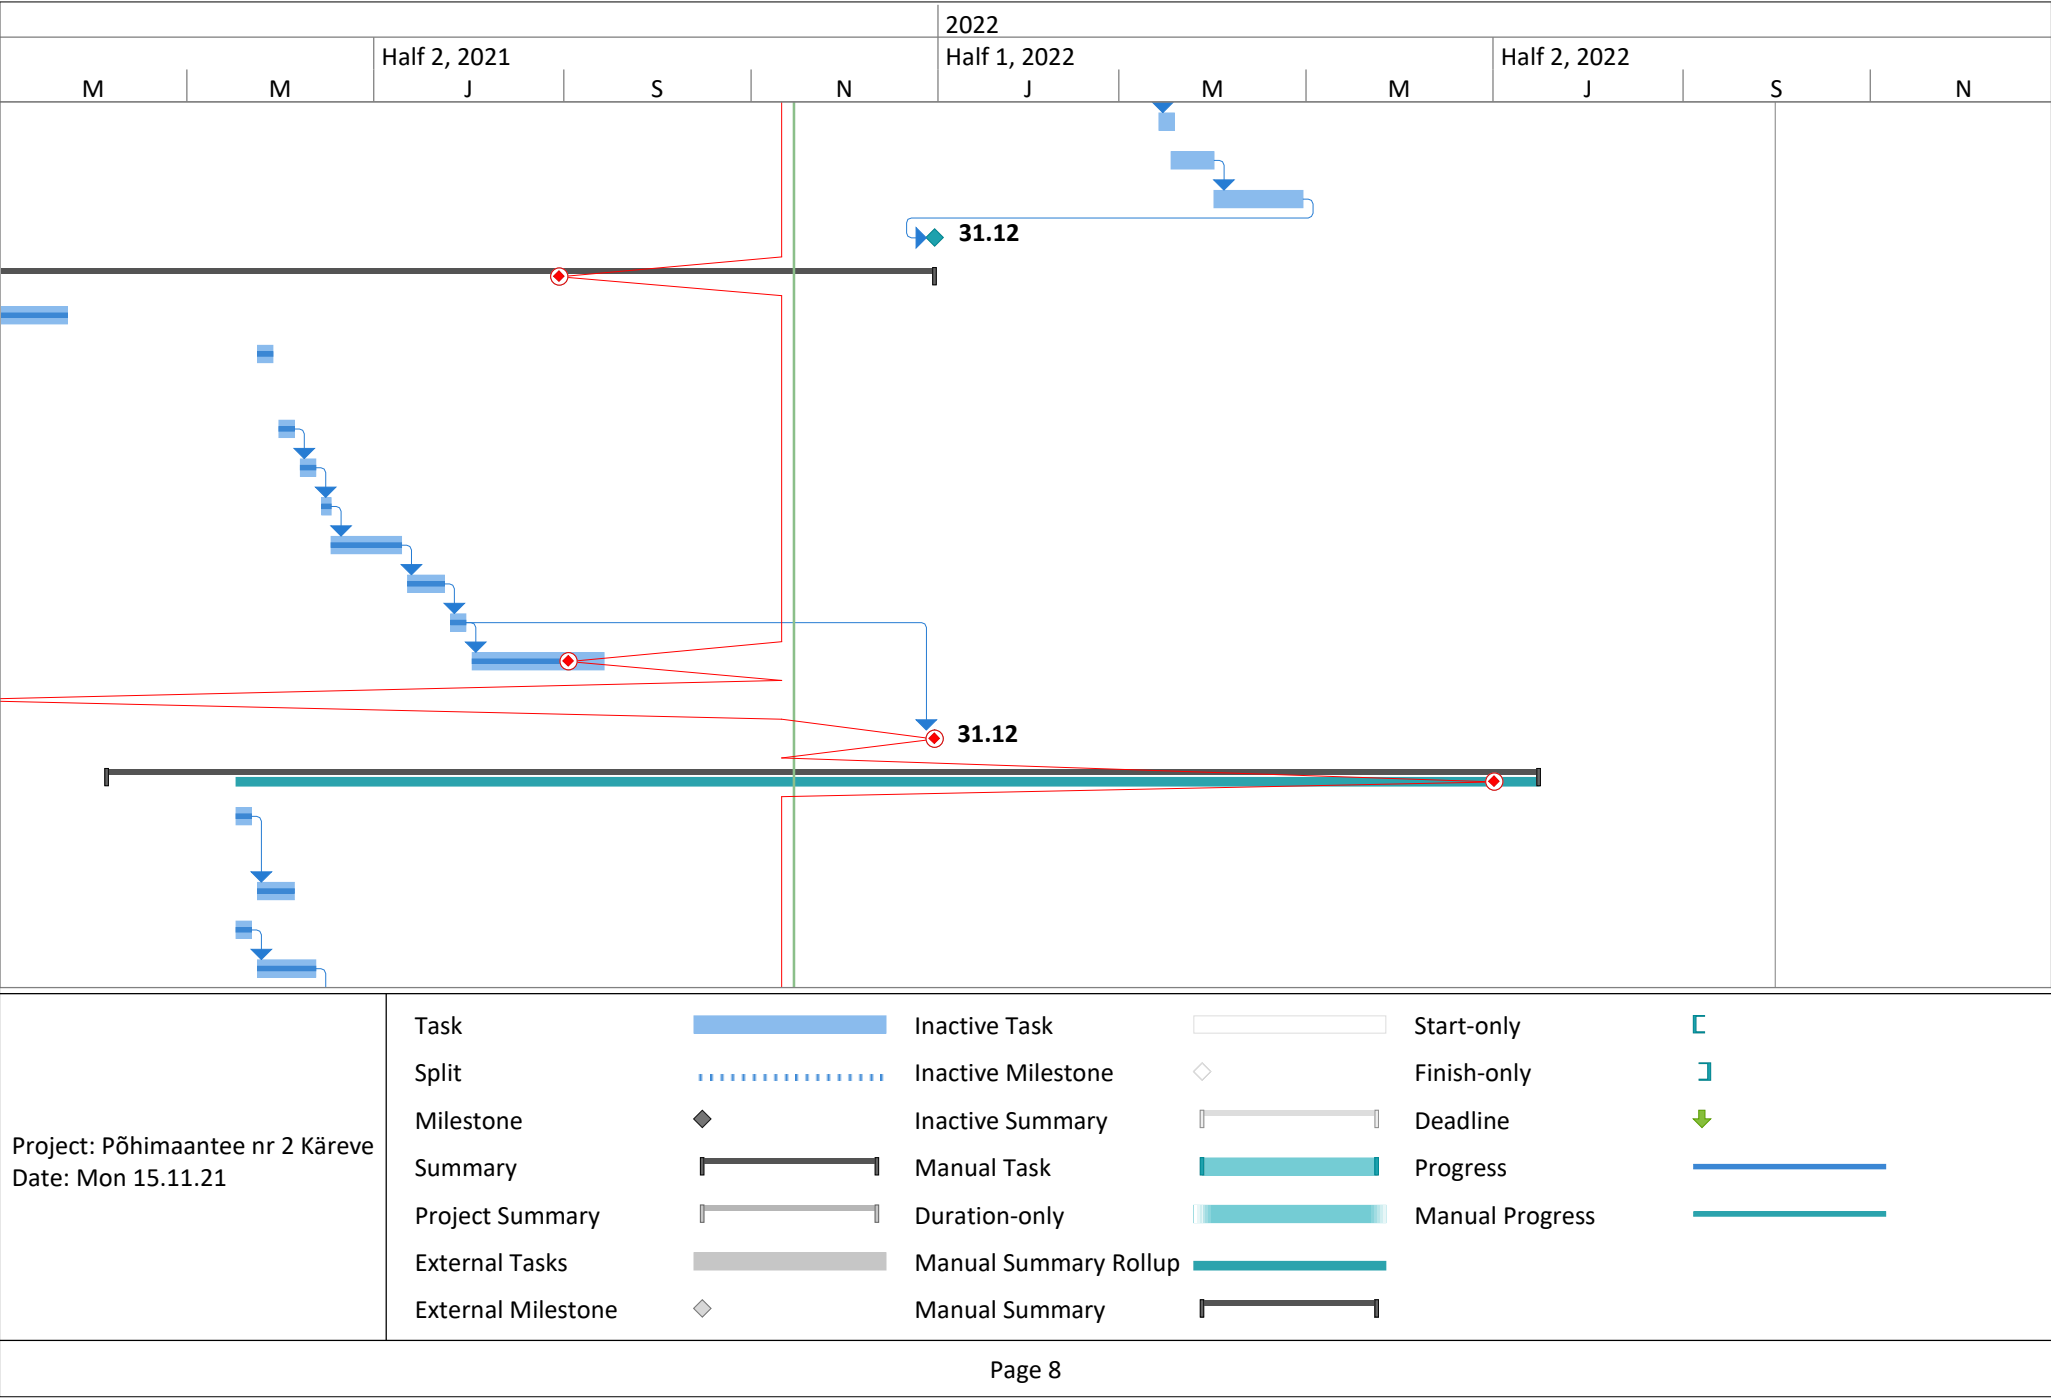



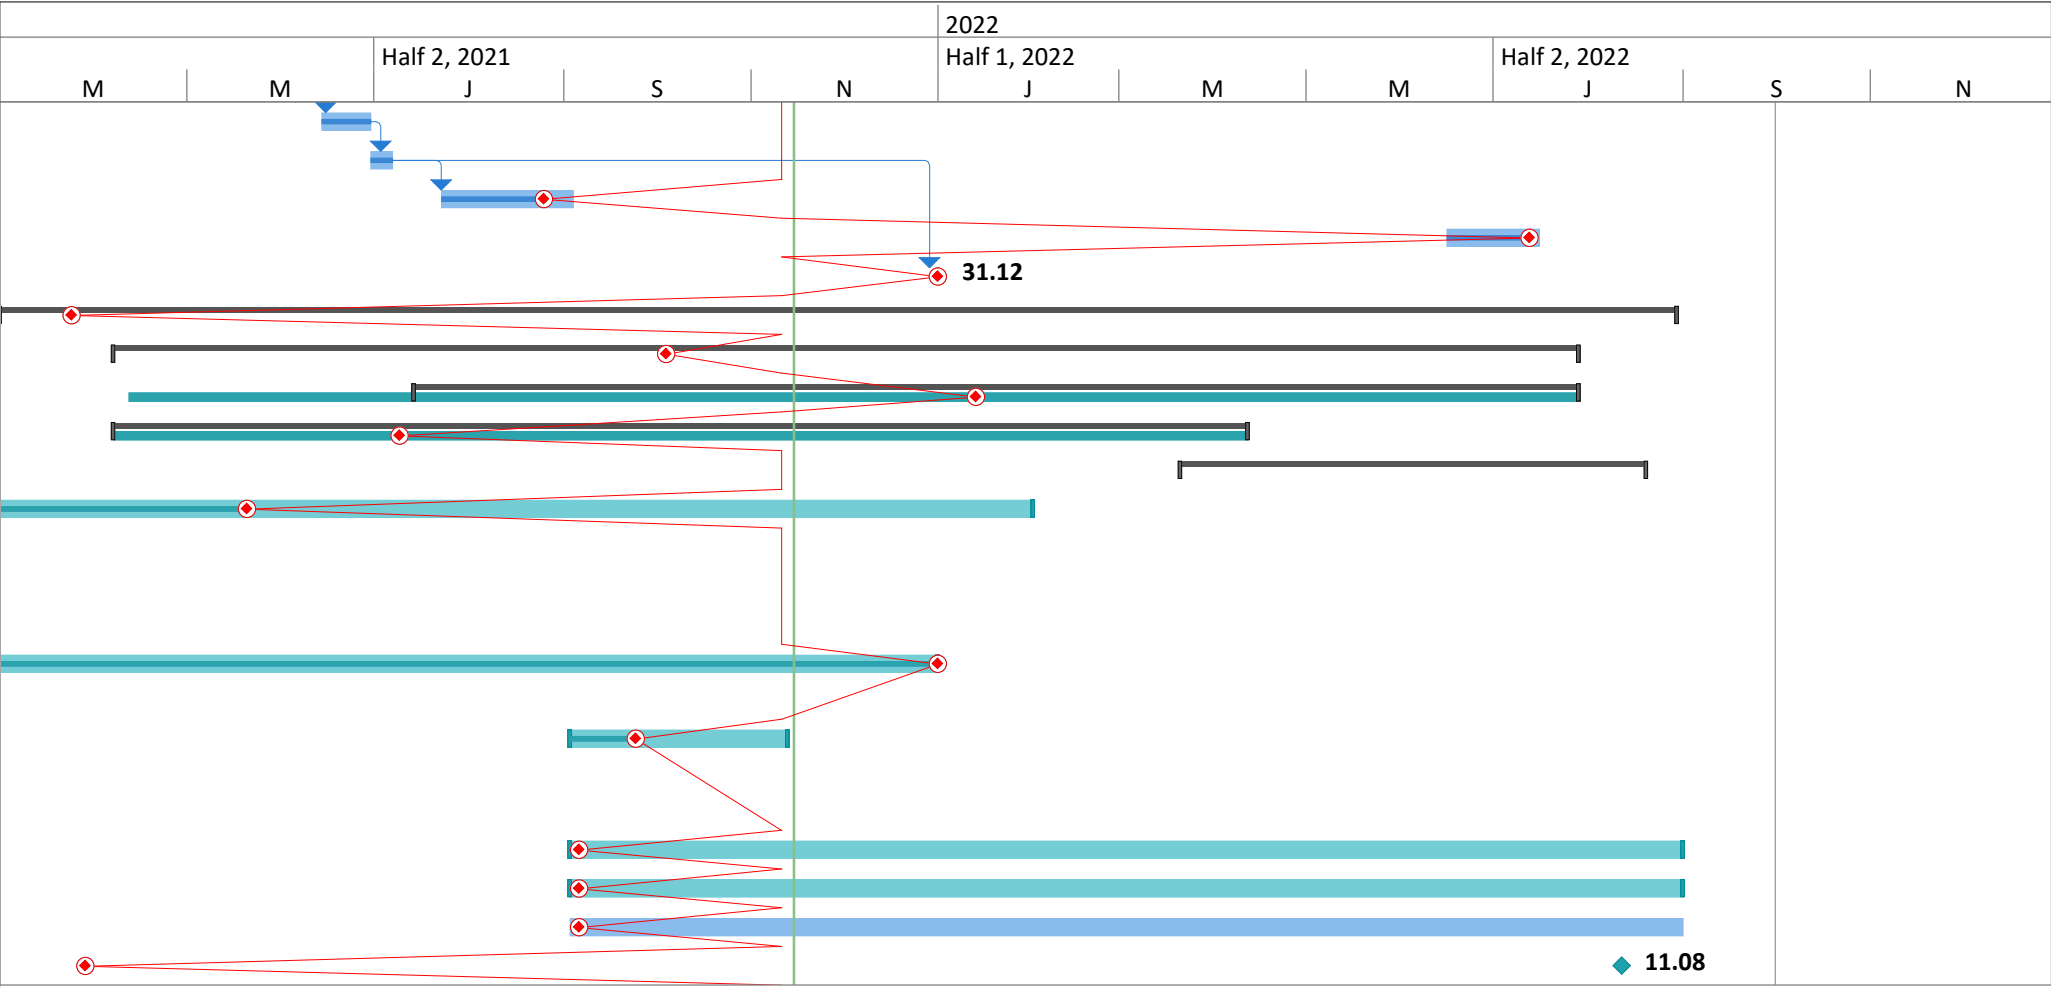

|                                                        |                    |  |                       |  |                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|
| Project: Põhimaantee nr 2 Käreve<br>Date: Mon 15.11.21 | Task               |  | Inactive Task         |  | Start-only      |  |
|                                                        | Split              |  | Inactive Milestone    |  | Finish-only     |  |
|                                                        | Milestone          |  | Inactive Summary      |  | Deadline        |  |
|                                                        | Summary            |  | Manual Task           |  | Progress        |  |
|                                                        | Project Summary    |  | Duration-only         |  | Manual Progress |  |
|                                                        | External Tasks     |  | Manual Summary Rollup |  |                 |  |
|                                                        | External Milestone |  | Manual Summary        |  |                 |  |

