

2. Ruila osas on KIKile esitatud kask KD nr 92 summas 11 212 ,2 eurot KMga ja D 147 summas 18 687,00 kmga kokku 29 899,2 eurot KM. Palun esitage ka puuduv osa lepingu maksumusest või selgitage, mille taga selle esitamine seisab .

Suured tänud kiire tagasiside eest

Ööle Janson
projektikoordinaator




Narva mnt 7A, Tallinn
Tel: 6 274 191
www.kik.ee
www.kik.ee/facebook

[Liitu KIKi uudiskirjaga](#)

From: Ööle Janson
Sent: teisipäev, 7. veebruar 2023 13:08
To: Saima Uusma <saima.uusma@rmk.ee>
Cc: Sander Sandberg <sander.sandberg@rmk.ee>; Kristjan Kalda <Kristjan.KALDA@kik.ee>
Subject: RE: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll - hange nr 246148- Mäeküla
Importance: High

Tere Saima

Saadan ka hanke nr 246148 (Mäeküla paisu projekteerimine) osas lepingu pikendamise küsimused.

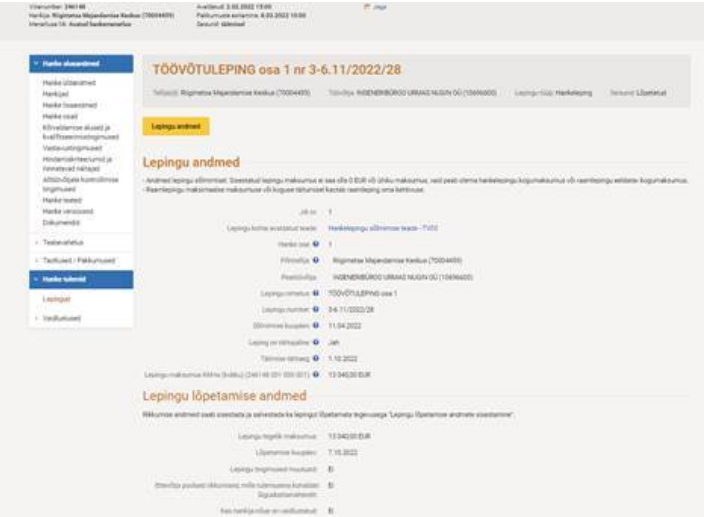

Töö üleandmine-vastuvõtmine AKT 3-6.11/2022/28-3 on koostatud 26.10.2022 ja tööde vastuvõtja poolt allkirjastatud 01.11.2022

Kuidas saite riigihangete registrisse tööde täitmisajaks 07.10.2022.

Palun selgitage lepingu tähtaja ületamist, kas pikendasite lepingut? Või alustasite lepingu rikkumist või rakendasite muud lepingust tulenevat tingimust.

Palun kirjadele vastata hiljemalt selle nädala lõpuks.

Ööle Janson
projektikoordinaator

Narva mnt 7A, Tallinn
Tel: 6 274 191
www.kik.ee
www.kik.ee/facebook

[Liitu KIKi uudiskirjaga](#)

From: Ööle Janson
Sent: esmaspäev, 6. veebruar 2023 08:20
To: Saima Uusma <saima.uusma@rmk.ee>
Cc: Sander Sandberg <sander.sandberg@rmk.ee>
Subject: FW: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll
Importance: High

Tere Saima

Meil on KIKis kõikide ühtekuuluvusfondi rahadega seotud hangete järelkontrollid ja on tekkinud küsimus seoses Helme projekteerimise hankega (245354).

Seoses lepingu tähtaja pikendamisega on mõned tähelepanekud:

- Lepingut on pikendatud (ja eelarvet suurendatud) tagant järgi. Esialgne täitmise tähtaeg oli 15.08.22. Muutmise kiri on tehtud 04.10.22. Muutmise kiri ei ole lepingu kohaselt kahe poolt allkirjastatud.
- Täiendava töö pakkumine on tehtud 05.09.22, ehk siis pärast lepingu täitmise tähtaega. Seega on küsimus, kas ka lepingus ettenähtud töid ei suudetud 15.08.22 lõpetada?
- miks need tegevused pärast täitmise tähtaega on toimunud?
- kas vahetähtaegade ületamise eest leppetrahvi rakendati?

Palun suhtle hangete osakonnaga ja andke meile kiiresti tagasisidet.

Suured tänud ette
Ööle Janson
projektikoordinaator



Narva mnt 7A, Tallinn
Tel: 6 274 191
www.kik.ee
www.kik.ee/facebook

[Liitu KIKi uudiskirjaga](#)
