


Tähelepanekud 29.08.2025


- Palume täpsustada projekti materjalides, kuidas on tagatud juurdepääs Saustinõmme viadukti alla (TRAMil peab olema võimalus teostada viadukti hooldustöid). Esitatud materjalidest nähtub, et kavandatavad kraavid ja piirdeaed lõikavad ära võimaluse pääseda viadukti alla.

Lisaks palume täpsustada, kuidas saadakse juurde truubi CU0787 hooldusele läänepoolsest küljest.

- Lisaks palume täpsustada, kuidas on planeeritud Saustinõmme viadukti all raudteeäärsete sademeveesüsteemide toimimine kas trüüpide või kraavide kaudu. Esitatud asendiplaanil kajastuvad kraavid, kuid varasemates dokumentides on planeeritud trüübid. Palume kontrollida materjale ning korrigeerida.

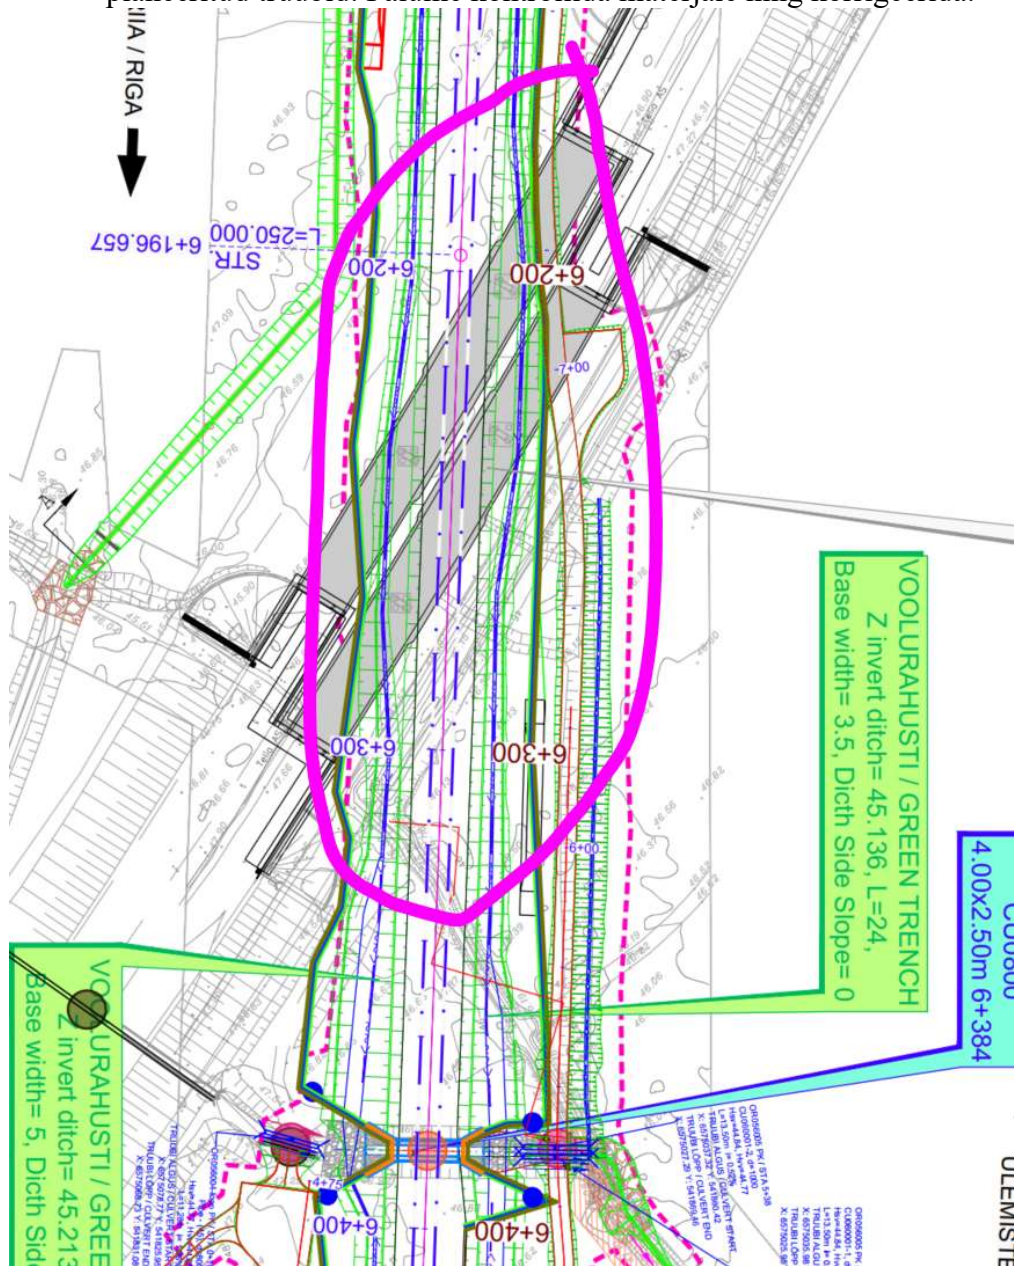

- [illegible]

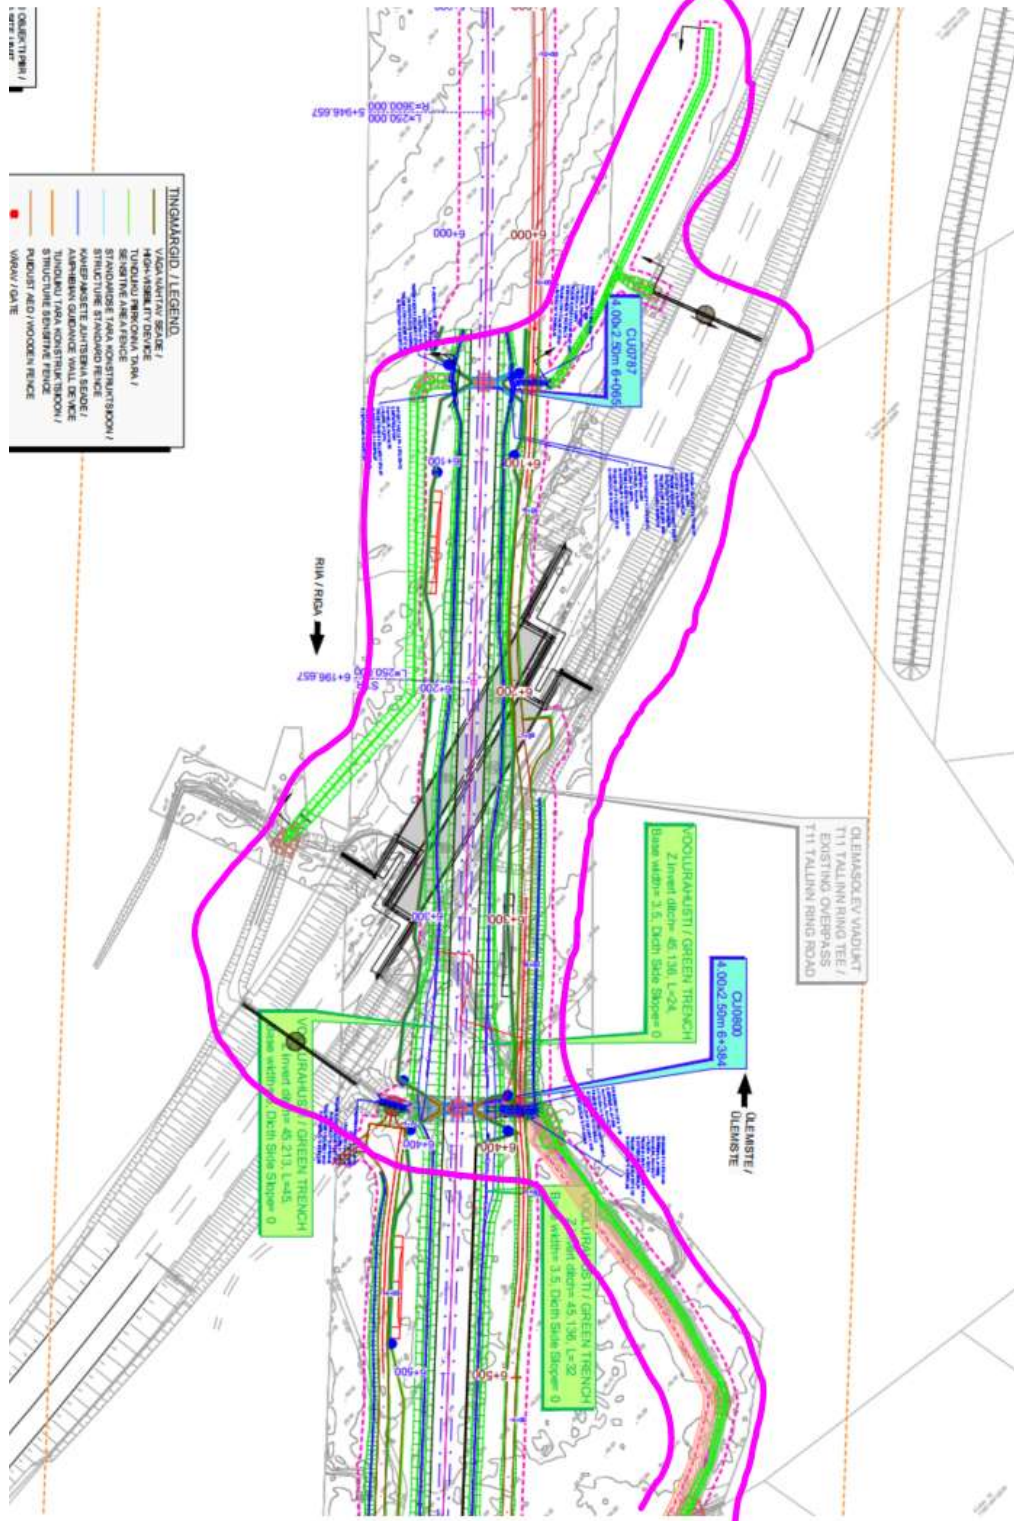

- Kuna Saustinõmme viadukti asukohas on lisandunud kraave, mida varasemalt TRAMi poolt kooskõlastatud ehitusloa taotluses (nr 2411271/00676, menetluse nr 415580) ei kajastunud, siis palume antud EHR menetluses nr 500497 kajastada ka puuduolevate/lisandunud kraavide asjaolud ja kontuurid.
- Esitatud materjalidest nähtub, et sademevee ja pinnasevee juhtimise osas on lahendust muudetud ning esitatud materjalides ei kajastunud vooluhulkade arvutusi. Seega palume hinnata olemasolevaid ja arendustegevusest lisanduvaid vooluhulki, riigitee kraavide ja truupide läbilaskevõimet (esitada truupide läbilaskearvutused), sh truupide seisukorda ja teostada läbilaskearvutused kuni riikliku eesvooluni.

Esitatud lahendusega tuleb tagada truupide, kraavide läbilaskevõime ja riigitee muldkeha niiskusrežiim.
