

PUURAUKUDE JA KAEVANDITE LIKVIDEERIMISE AKT

Objekti nimetus:

Jaakna IV uuringuruum, pindala 5,43 ha, (geoloogilise uuringu luba L.MU/521664) ja Jaakna V uuringuruum, pindala 13,60 ha, (geoloogilise uuringu luba L.MU/521995).

Uuringupunktide asukohad: Lääne maakond Lääne-Nigula vald Jaakna küla Piirsalu metskond 47 (44101:001:1432) ja Allikmaa külas katastriüksusel Piirsalu metskond 56 (44101:001:1547), Jaakna IV ja V uuringuruumide piires.

Uuringupunktide rajamise aeg: 19.09.- 20.09.2024; 23.09.2024; 11.02.2025.

Uuringupunktid: Jaakna IV uuringuruumi rajati 4 puurauku sügavusega 6,8 - 10,0 m ja 9 kaevandit sügavusega 2,6 - 5,0 m. Jaakna V uuringuruumi rajati 26 kaevandit sügavusega 0,1 - 6,0 m.

Puuraugud rajati tigupuurimise meetodil iseliikuva roomikpuurpingiga. Kaevandid rajati roomikekskavaatoriga.

Rajatud uuringupunktide sügavused, asukohtade koordinaadid ja mõõdetud põhjaveetasemed on esitatud tabelis 1 ja 2, asukohad näidatud joonisel 1 ja 2.

Uuringupunktide likvideerimise põhjus: geoloogiline ülesanne täidetud - uuringuaukudest võeti pinnaseproovid ja tehti vajalikud kirjeldused ning mõõtmised

Likvideerimise aeg ja moodus: Puuraugud ja kaevandid likvideeriti koheselt pärast geoloogilise läbilõike kirjeldamist ja vajalike proovide võtmist ajavahemikul 19.09. - 20.09.2024; 23.09.2024; 11.02.2025. Uuringuaukude aeti kinni kasutades materjali, mida uuringuteks väljati ja maapind tasandati. Uuringuaukude ümbrus on korrastatud ning taastatud uuringueelne seisund.

Fotod likvideeritud uuringupunktidest on toodud lisas 1.

Uuringuloa valdaja /allkirjastatud digitaalselt/ Lääne Teed OÜ

Maaomanik /allkirjastatud digitaalselt/ Riigimetsa Majandamise Keskus

Uuringutöö teostaja /allkirjastatud digitaalselt/ OÜ Inseneribüroo STEIGER

Tabel 1. Rajatud uuringupunktid Jaakna IV uuringuruumis


Uuringupunkti nr	Koordinaadid			Uur.punkti süg, m	Põhjaveetase maapinnast, m	Mõõtmise aeg
	X	Y	Z			
K-1	6537737,58	498430,69	39,72	4,5	-	-
K-2	6537718,12	498425,02	36,97	3,5	2,0	19.09.24
K-3	6537653,12	498389,47	39,94	3,0	2,5	19.09.24
K-4	6537573,42	498447,65	37,15	2,6	1,9	19.09.24
K-5	6537624,28	498306,44	37,17	4,0	2,7	19.09.24
K-6	6537691,88	498299,15	37,46	3,5	2,5	19.09.24
K-7	6537672,33	498175,79	37,64	4,0	2,5	19.09.24
K-8	6537628,73	498175,70	35,69	5,0	0,7	19.09.24
K-9	6537643,34	498045,28	36,28	5,0	1,2	19.09.24
PA-1	6537627,59	498428,54	37,17	7,0	1,0	11.02.25
PA-2	6537642,63	498238,40	36,45	7,3	0,6	11.02.25
PA-3	6537652,45	498073,88	36,04	10,0	0,8	11.02.25
PA-4	6537640,70	498161,11	35,87	6,8	0,3	11.02.25

Tabel 2. Rajatud uuringupunktid Jaakna V uuringuruumis

Uuringupunkti nr	Koordinaadid			Uur.punkti süg, m	Põhjaveetase maapinnast, m	Mõõtmise aeg
	X	Y	Z			
K-10	6537699,28	497712,16	39,81	3,6	1,2	19.09.24
K-11	6537647,60	497648,43	36,41	4,0	1,0	19.09.24
K-12	6537665,10	497679,99	38,53	6,0	3,8	19.09.24
K-13	6537680,31	497723,16	39,52	0,1	-	-
K-14	6537661,39	497734,56	37,06	3,3	1,7	19.09.24
K-15	6537587,65	497530,52	42,44	4,8	2,3	20.09.24
K-16	6537554,54	497531,98	40,41	4,8	-	-
K-17	6537513,49	497458,16	43,41	4,9	-	-
K-18a	6537486,36	497380,54	46,41	4,0	-	-
K-18b	6537485,85	497399,30	41,35	3,0	-	-
K-19	6537397,13	497258,22	37,30	5,0	2,5	20.09.24
K-20	6537295,45	497161,49	36,49	5,5	2,0	20.09.24
K-21	6537243,39	497070,85	36,49	4,4	2,0	20.09.24
K-22	6537147,25	497075,68	35,83	3,0	1,2	20.09.24
K-23	6537159,07	497219,93	35,31	4,8	0,7	20.09.24
K-24	6537229,59	497262,25	35,44	4,0	0,9	20.09.24
K-25	6537194,56	497252,81	35,43	2,4	0,7	23.09.24
K-26	6537262,21	497293,68	35,86	4,5	1,0	23.09.24
K-27	6537301,76	497337,86	35,92	3,3	1,2	23.09.24
K-28	6537335,99	497317,63	37,49	4,5	2,7	23.09.24
K-29	6537365,13	497380,03	37,33	4,9	2,5	23.09.24
K-30	6537382,78	497427,00	35,96	5,0	0,6	23.09.24
K-31	6537489,11	497535,87	35,87	4,8	0,4	23.09.24
K-32	6537611,03	497722,18	36,20	4,5	1,5	23.09.24
K-33	6537564,08	497648,16	35,88	4,5	1,5	23.09.24
K-34	6537575,20	497610,51	38,28	4,9	3,5	23.09.24



Joonis 1. Jaakna IV uuringuruumi puuraukude ja kaevandite asukohad. Plaani koostamisel on kasutatud Maa- ja Ruumiameti kaardirakendust.

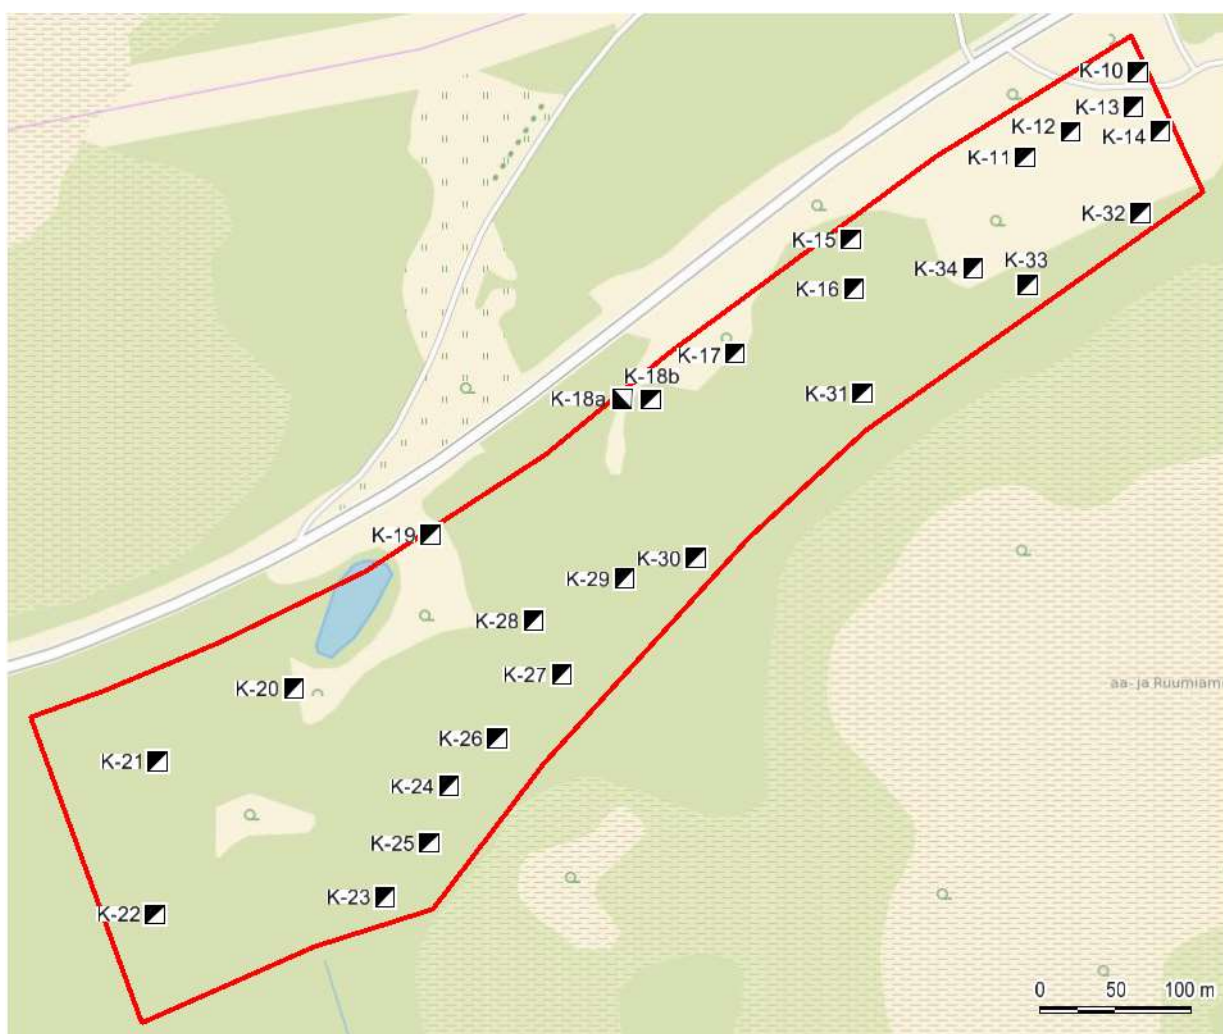

Joonis 2. Jaakna V uuringuruumi kaevandite asukohad. Plaani koostamisel on kasutatud Maa- ja Ruumiameti kaardirakendust.

Lisa 1. Likvideeritud uuringupunktid

Puuraugud PA-1 ... PA- 4.



Kaevandid K-1 - K-34



