



Valgustatuse mõõtmise protokoll nr.327V/24A 10.12.2024.a.

Alus(plaaniline,tellimus,või muu) tellimus / MTÜ Convictus Eesti

Mõõtmise Liivalaia 13 – 806, Tallinn, Eesti

Mõõteriistad(nimetus,tüüp):

Luksmeeter TES 1335, nr.0190304895

Kalibreerimine teostatud : nr.ATLO-23/0161 09.05.2023 AS Metrosert

Dokumendid, mille alusel teostati mõõtmised:

Labori tööjuhend F-2,Töökohtade valgustuse mõõtmine , laiendmääramatus +/-12,8%

Mõõtmise kuupäev: 10.12.2024 (10.30-10.55) /aknad on ruloodega suletud/

Mõõtmiste juures viibis: Konstantin Iru

Tehniline dokumentatsioon (s.h.ruumide plaanid ja skeemid) on hankitud kliendi poolt

Jrk nr.	Mõõtmise koht	Valgusti info; üld või kombinir.	Kunstlik valgustus lx			Nõutud tase lx *
			E kesk.	E max.	E min.	
1	Kabimnet /H-0,5m/	Lüm,üld	634	720	515	500
			+/-82 lx			


P-232v

* Valgus ja valgustus EVS –EN 12464-1:2021 /Tabel 34/

Käesolevaga labor teavitab klienti asjaolust, et EAK oma hindamiste raames puutub kokku käesolevas protokollis

Mõõtmistulemused kehtivad ainult nimetatud objekti kohta ja mõõtmiste teostamise ajal. Mõõtmisprotokollis jagamine on labori loata keelatud. •

Mõõtmise kohad

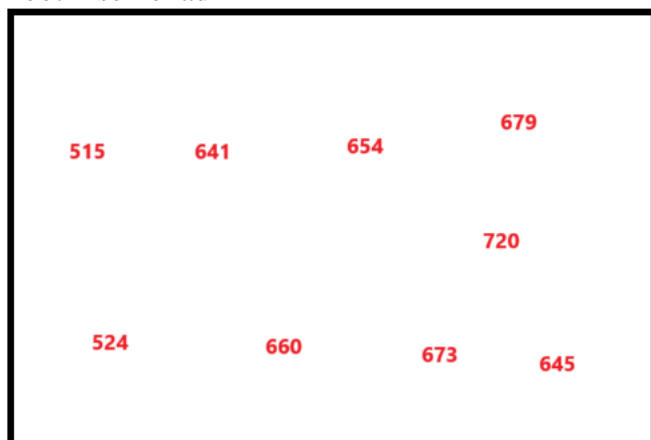

Mõõtis spetsialist A.Zagamula
Juhataja L.Zagamula
