

From: Kalev Raadla <kalev@maajavesi.ee>
Sent: 10 March 2023 12:55:04
To: Toomas Kivisto
Cc:
Subject: Tootsi tuulepargi kuivendusprojekt

Tere!

Saadan võrreldes 2016 aasta projektiga käesoleva projekti muudatuste sisu.

Käesoleva projekti kuivendusvõrgu plaaniline lahendus vastab 2016. aastal koostatud projektile järgmiste muudatustega:

- Saapasoo peakraavil (611493002000/001) töid ei ole ette nähtud teha kuna 2016.a projektis ette nähtud kahe truubi rekonstrueerimine on juba teostatud teise projekti koosseisus (RMK Vändra metskonna Külatee, Viluvere-Tootsi tee ja Saapasoo teerekonstrueerimise projekt, OÜ Hetver, töö nr 14-15, 2015. a);
- EH1 kraavi 200 ja vana raudteetammi vahelisel alal vana projekti koosseisus olevad kraavid on projekti mahtudest välja võetud vastavalt Keskkonnaameti soovitustele (kraavid 100,101,102);
- EH2 planeeritava päikesepargi ala (*Vändra metskond 106, katastritunnus 92901:001:0264, metsakvartal HA333*) on projektalast välja jäetud, selle ala kuivendus lahendatakse päikesepargi projektiga;
- Vastavalt PTA ettekirjutusele muudeti ka eesvoolude nimekirjas olevaid kraave - Jäeti ainult need kraavid, mis on praegu registris (K-1 ja Marjassaare kr).
- 2016 a projektis olid eesvoolud ka Are jõgi, kraavid 200, K-2, K-3- need pandi reguleeriva võrgu nimekirja.


Muutusi ka rekonstrueeritavad pindalad kuna välja sai võetud päikesepargi ala ja kr 200 ja vana raudteetammi vaheline ala (vt allolev plaan).

Tervitades

Kalev Raadla

5176211

Muudatuste asendiplaan

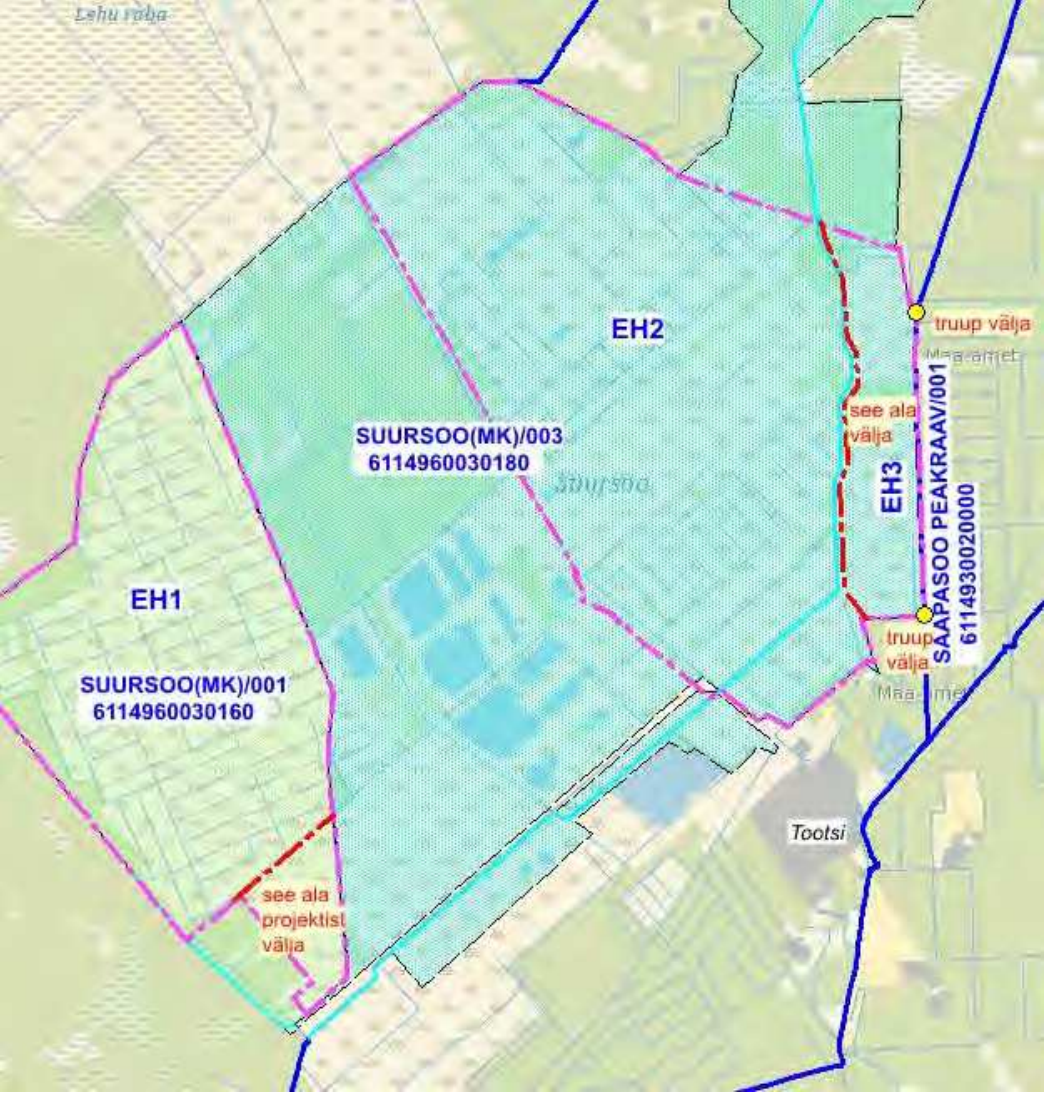

Tabel 4 Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste üldandmed

Ehitise lühitähis	Maaparandus- süsteemi kood	Maaparandusehitise						
		kood	nimetus	rek pindala (ha)	rek tee (km)	uuendatav tee (km)	ehitav eesvool (km)	rek eesvool (km)
EH1	6114960030160	001	Suursoo (MK)	635,1				1,61
EH2	6114960030180	003	Suursoo (MK)	967,6				7,80
Kokku:				1602,7				9,41
