

1. Ehitusettevõtja FIRETEK OÜ Kontaktid: Tallinn, Pae 21. tel: (+372)6024550 fax: (+372)6485421 gsm: (+372)55535000 e-post: firetek@firetek.ee Registrikood: 10642260	Hüdrauliline survekatsetuse akt 1	2. Kuupäev " 31 " mai 2023 a.
3. Ehitise nimetus ja asukoht Objekt: Kolde pst 104, 10316 Tallinn, Harjumaa		

4. TORUSTIKU KATSETAMISE ÜLEVAATUSE TEOSTAJAD:

TELLIJA ESINDAJA: Tatjana Kulkova (Kolde 104 KÜ esinaine)

TÖÖVÕTJA ESINDAJA: Aleksandr Kvasnjuk (OÜ Firetek)

5. ÜLEVAATUSE TEOSTAJATE POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:

1) Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd: Kuivtõusutoru, trepikoda.

2) Tööd on teostatud (projekteerimisettevõtja nimetus, jooniste nr ja kuupäevad):
Firetek OÜ joonis FRT669, 14 korrust.

3) Töö tegemisel on kasutatud :
Survetõste seade, Kärcher.

4) Katsetamise alustamise kuupäev ja kellaeg: " 31 " mai 2023 a. kell. 16:00
Katsetamise lõpetamise kuupäev ja kellaeg: " 31 " mai 2023 a. kell. 19:00
Katsetamise tingimused

Katsetava toruosa nimetus	Toru mark	Survekatsetuse meetoodika kirjeldus	Katsetamise tulemused
Kuivtõusutoru torustik ja sulgurid	Terastoru DN50-DN80	Hüdrauliline katsetus survega 16 Bar, 3 tunni jooksul	Lekkeid ei ole avastatud. Survelangust ei ole avastatud.

5) Muud märkused:


6) Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele.


7) Järeldus
Hüdrauliline survekatsetus on teostatud vastavalt nõuetele, lekkeid torustikus, liitmikutest ja süsteemi elementides ei avastatud.
Kuivtõusu torustik ja ühendused katsetava piirides vastavad nõuetele.

6. ALLKIRJAD:

TELLIJA ESINDAJA: Tatjana Kulkova, Kolde 104 korterühistu

TÖÖVÕTJA ESINDAJA: Aleksandr Kvasnjuk, OÜ Firetek



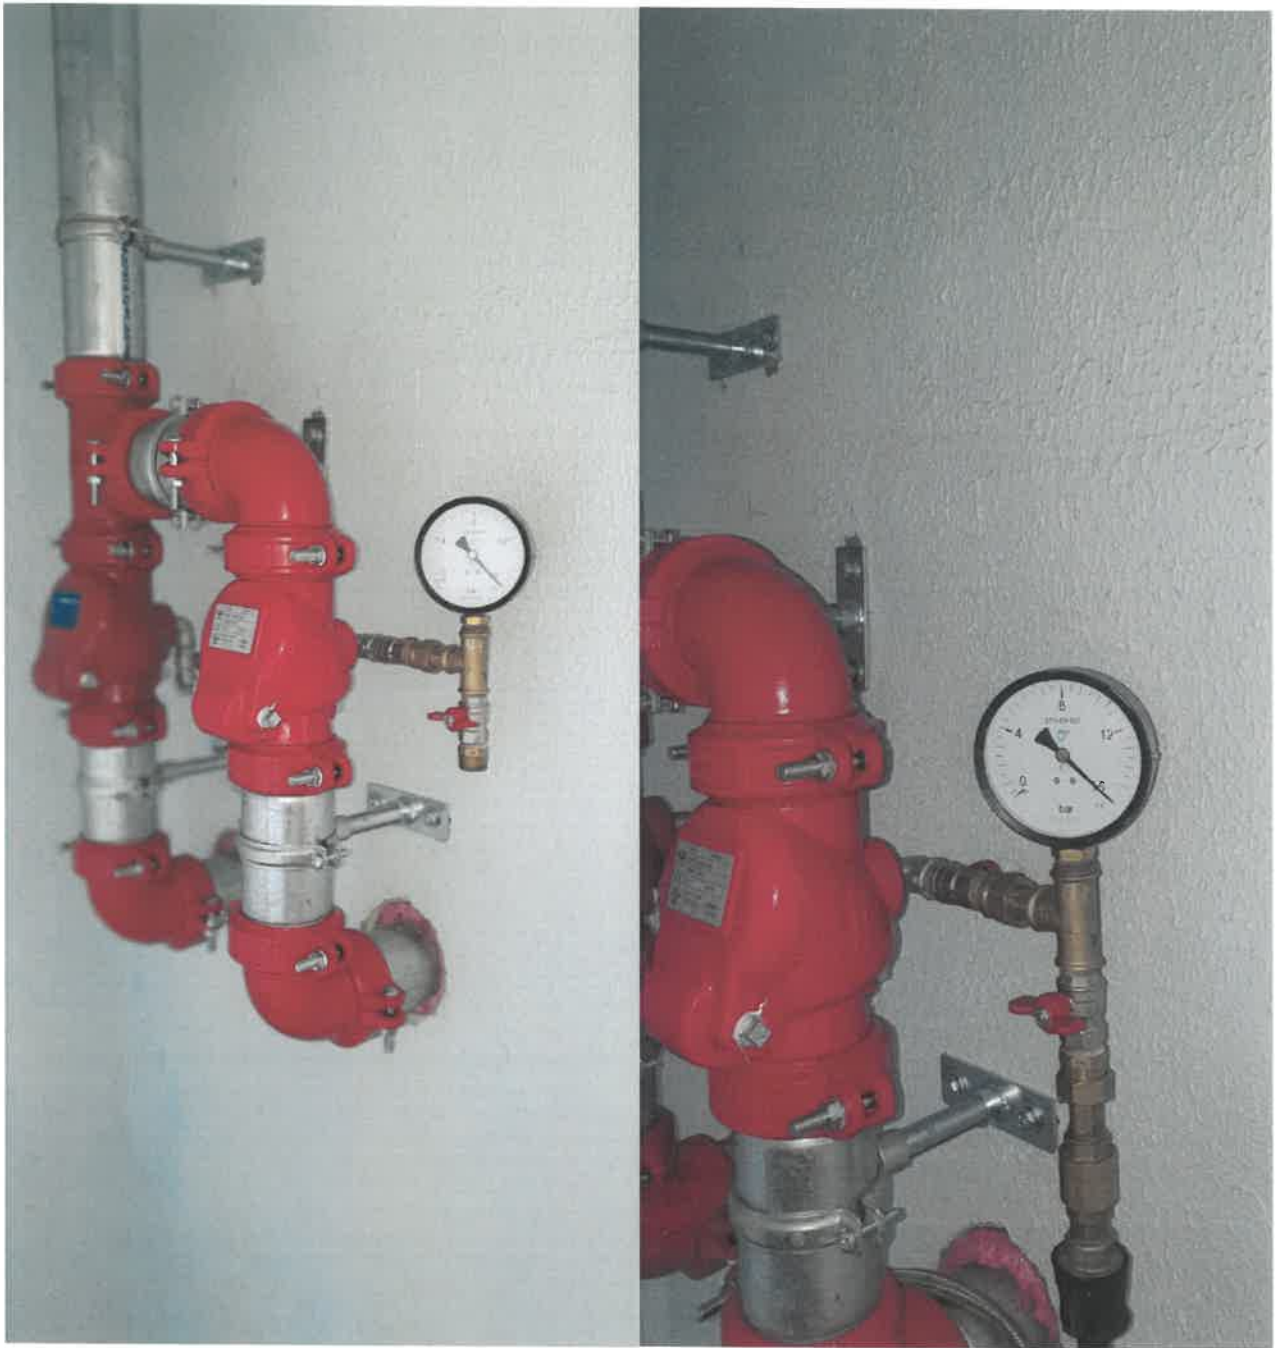

[Handwritten signature]
