


KOOSKÖLÄSTATUD
Transpordiamet, Teehoiuteenistus
[...] - liikluskorraldaja
... (kuupäev)

TINGIMUSED:

- Liikluse korraldamisel objektil juhinduda kehtivatest õigusaktidest, sh määrusest majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
- Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valgusteegeidava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgruppi liiklusmärke.
- Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
- Teel ja teemal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks rõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkuriite kombinatsioon ja tee töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märgurijetust.
- Söiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida söidukeid ja mehhhanisme ega ladustada materjalie.
- Tagada tööde teostamise alati teekatte puhtus.
- Langetamis-, virmastamis- ja laadimistööd tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada tee liiklejaid.
- Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehitestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik. Kui laadimist ei toimu, siis vabastada söidurada ja eemaldada piirangud.
- Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmcc@transpordiamet.ee või Transpordiameti Tark Tee liikluspiirangute iseteenindusteskkonnas, millele päaseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
- Metsamaterjali äraveol lähtuda teele kehtestatud piirangutes.**

Kooskölästatud liikluskorralduse joonised ei asenda riigivara kasutamise lepingut ning peab olema tööde teostamise ajal objekti.

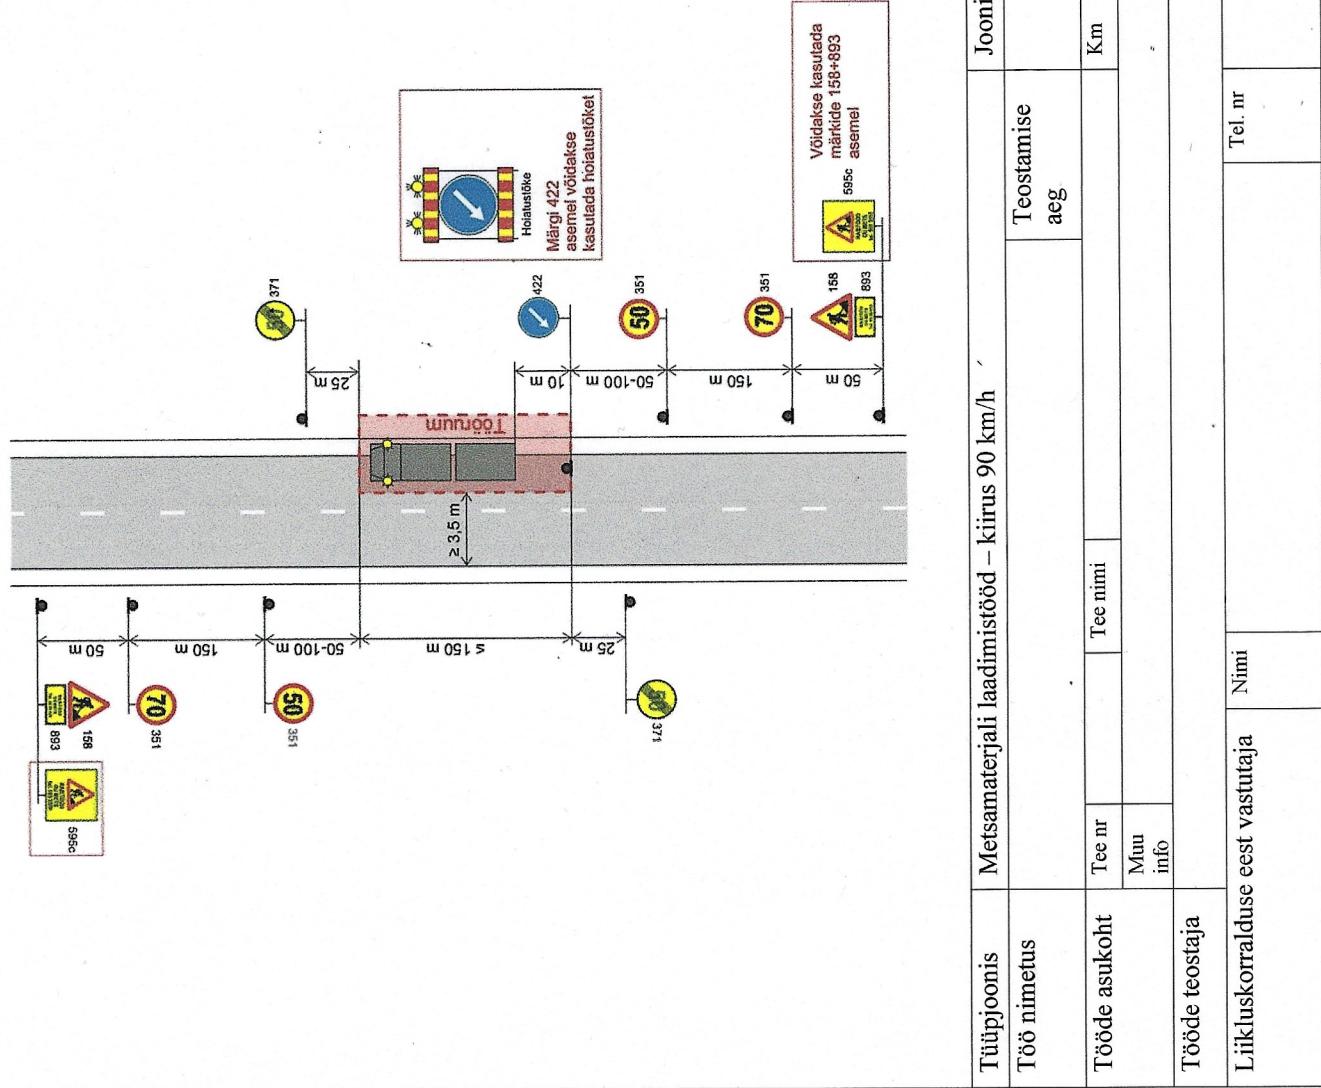

Tüüpjoonis	Metsamaterjali laadimistööd – kiirus 90 km/h	Joonis 6-1
Töö nimetus		Teostamise aeg
Tööde asukoht	Tee nr Muu info	Tee nimi Km
Tööde teostaja		
Liikluskorralduse eest vastutaja	Nimi	Tell. nr
