



Tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused

Töö number: 509-24

leht: 1 (5)

Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiittelehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest

Objekti nimetus: ProVida kontor

Objekti aadress: Riia 128, Tartu

Projekt: Sotsiaalministri määrus nr 42

Süsteemi(de) tähistus(ed): SV-2

Kasutatud metoodika:

Kasutatud standard, metoodika: EVS-EN ISO 16032:2004, Acoustics- Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings- Engineering method.

Kasutatud mõõtevahendid:

Müratasememõõtur: Rion NL-52 seeria nr. 01143529. Kalibreeritud kuni 19.09.2024

Töö koostas: Raigo Mees

29.07.2024

Tellijä: Asulavent OÜ

Raido Asula

MAJATEHNIK OÜ KATSELABOR
Kabinet 201, Aardla 23, Tartu
Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com



Seletuskiri

Töö number: 509-24

leht: 2 (5)

Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitelehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest

Alused:

Müra mõõtmised on teostatud vastavalt standard EVS-EN ISO 16032:2004, "Acoustics- Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings- Engineering method." nõuetele. Mürataset mõõdeti 1,2 meetri kõrguselt. Vastavalt Standardile EVS-EN ISO 16032:2004 ei saa arvutada tegeliku ventilatsioonisüsteemi poolt tekitatud mürataset, kui mõõdetud mürataseme ja fooni mürataseme vahe on 1dB. Kui üldmüratase nõudepiiri ei ületa, siis on foonmüratase mõõtmine mittevajalik.

Objekt :

1. Müratasemete mõõtmised on teostatud 29.07.2024 Kella 12:00 ja 13:00 vahel
2. Mõõtmiste ajal töötasid ventilatsioonisüsteemid Majatehnik OÜ poolt varem välja mõõdetud režiimidel, mis on esitatud mõõdistuspassis:507-24.
3. Mõõtmised teostati tellija poolt ettenäidatud ruumides ja mõõdetud on müratasemete hetke olukord.
4. Mõõtetööde ajal olid ruumid möbleerimata.

MAJATEHNIK OÜ KATSELABOR
Kabinet 201, Aardla 23, Tartu
Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com



Mõõdistamiste tulemused

Töö number: 509-24

leht 3 (5)

Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest

Ruumi nr	Mõõtekoht	Mõõtmine	Kogumüra ekvivalent tase dB (A)	Kogumüra ekvivalent tase dB (A) keskmine	Taustmüra ekvivalent tase dB (A)	Taustmüra ekvivalent tase dB (A) keskmine	Parand (dB)	Arvutuslik müra tase L (DbA)	Lubatud müra tase dB
1	1.1	ventilatsioon	25,7	25,6	-	-	-	25,6	35
	1.2	ventilatsioon	25,5		-	-	-		
2	2.1	ventilatsioon	27,8	27,7	-	-	-	27,7	35
	2.2	ventilatsioon	27,6		-	-	-		
3	3.1	ventilatsioon	29,1	29,0	-	-	-	29,0	35
	3.2	ventilatsioon	28,9		-	-	-		
4	4.1	ventilatsioon	28,4	28,4	-	-	-	28,4	35
	4.2	ventilatsioon	28,4		-	-	-		
5	5.1	ventilatsioon	28,1	28,1	-	-	-	28,1	35
	5.2	ventilatsioon	28,0		-	-	-		
6	6.1	ventilatsioon	30,1	30,1	-	-	-	30,1	35
	6.2	ventilatsioon	30,1		-	-	-		
7	7.1	ventilatsioon	29,1	29,0	-	-	-	29,0	35
	7.2	ventilatsioon	28,9		-	-	-		
8	8.1	ventilatsioon	28,0	27,9	-	-	-	27,9	35
	8.2	ventilatsioon	27,8		-	-	-		
9	9.1	ventilatsioon	29,6	29,6	-	-	-	29,6	35
	9.2	ventilatsioon	29,5		-	-	-		
10	10.1	ventilatsioon	28,9	28,9	-	-	-	28,9	35
	10.2	ventilatsioon	28,8		-	-	-		
11	11.1	ventilatsioon	28,8	28,7	-	-	-	28,7	35
	11.2	ventilatsioon	28,6		-	-	-		
12	12.1	ventilatsioon	31,7	31,8	-	-	-	31,8	35
	12.2	ventilatsioon	31,8		-	-	-		
13	13.1	ventilatsioon	29,6	29,6	-	-	-	29,6	35
	13.2	ventilatsioon	29,5		-	-	-		
14	14.1	ventilatsioon	29,4	29,3	-	-	-	29,3	35
	14.2	ventilatsioon	29,2		-	-	-		
15	15.1	ventilatsioon	32,8	32,8	-	-	-	32,8	35
	15.2	ventilatsioon	32,7		-	-	-		
16	16.1	ventilatsioon	27,6	27,5	-	-	-	27,5	35
	16.2	ventilatsioon	27,3		-	-	-		
17	17.1	ventilatsioon	31,1	31,2	-	-	-	31,2	35
	17.2	ventilatsioon	31,2		-	-	-		
18	18.1	ventilatsioon	31,5	31,3	-	-	-	31,3	35
	18.2	ventilatsioon	31,1		-	-	-		
19	19.1	ventilatsioon	31,7	31,4	-	-	-	31,4	35
	19.2	ventilatsioon	31,1		-	-	-		
20A	20A.1	ventilatsioon	35,1	35,1	-	-	-	35,1	40
20B	20B.1	ventilatsioon	35,5	35,8	-	-	-	35,8	40
	20B.2	ventilatsioon	36,1		-	-	-		

MAJATEHNIK OÜ KATSELABOR

Kabinet 201, Aardla 23, Tartu

Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

Mõõdistamiste tulemused

Töö number: 509-24

leht 4 (5)


Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest

[illegible]

MAJATEHNIK OÜ KATSELABOR

Kabinet 201, Aardla 23, Tartu

Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

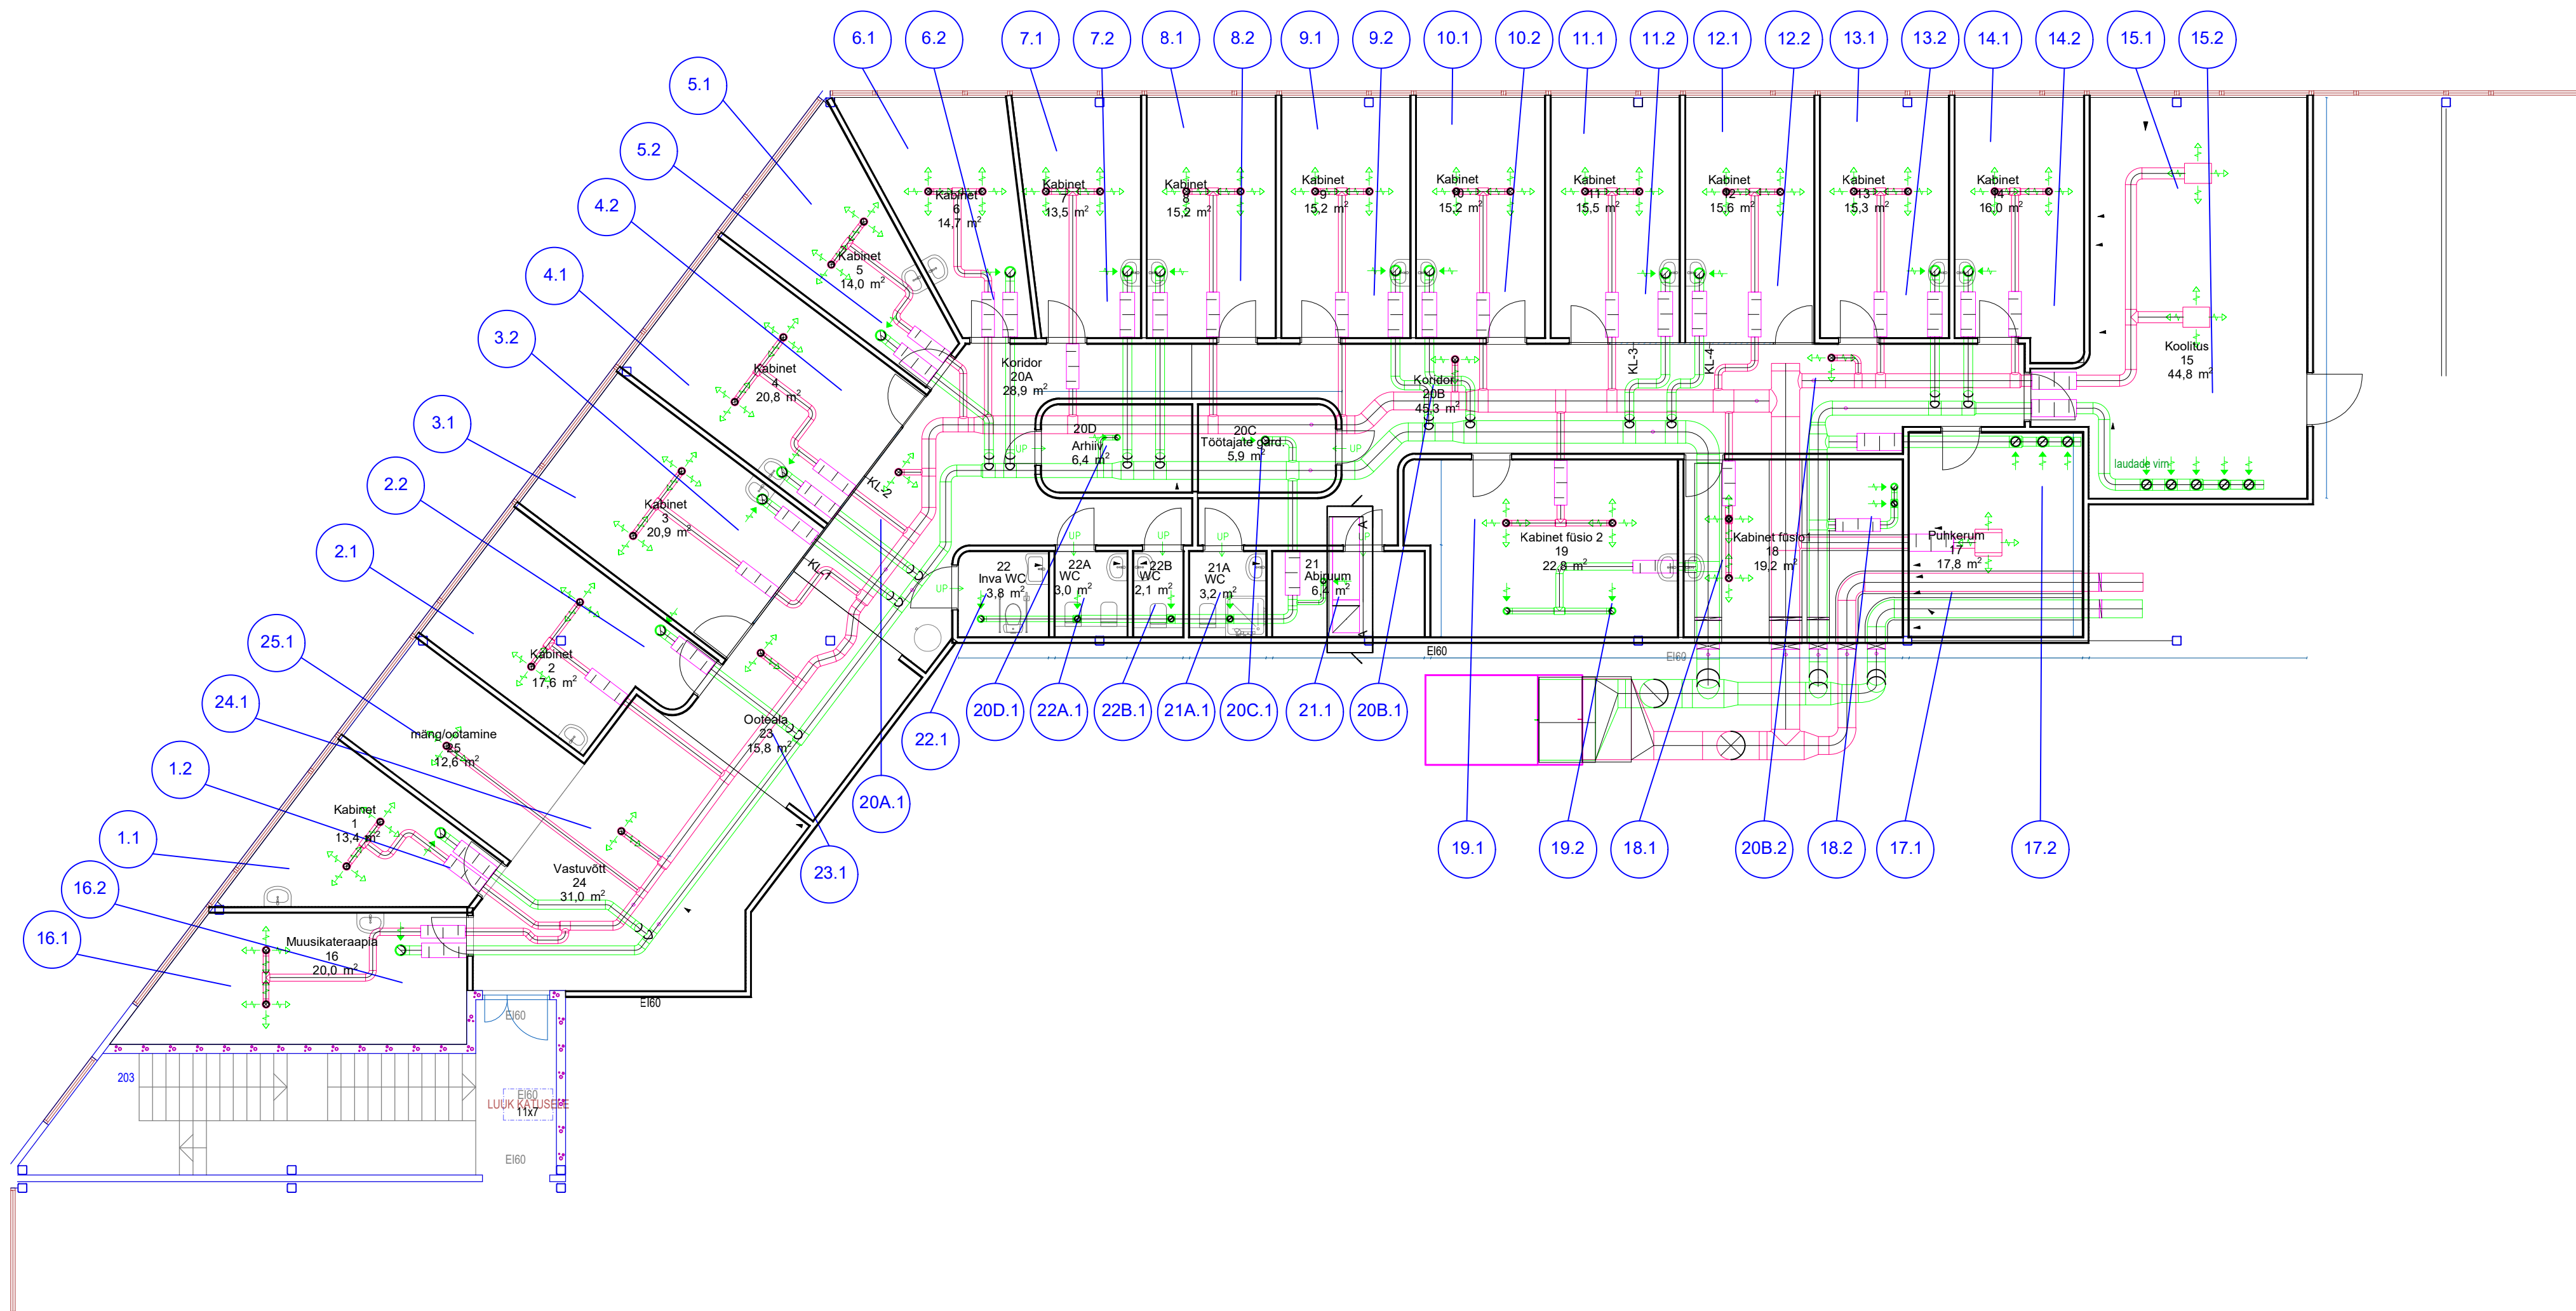

MAJATEHNIK MAJATEHNIK OÜ MÕÖTELABOR Aardla 23, Tartu majatehnik@gmail.com			ProVida kontor		Töö nr.			
			Riia mnt 128, Tartu		509-24			
			2. korruse osaline ventilatsiooni plaan ja mõõtepunktid				Leht	Lehti
							5	5
Teostas	Raigo Mees	29.07.2024						
