


Märkused 17.06.2024

- Palume projekti koostamisel juhinduda Transpordiameti juhendist: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).
- Palume esitada IKÕ plaan riigitee maaüksusele rajatava side maakaabelliini kohta. IKÕ plaan koostada vastavalt Transpordiameti juhendist: Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel lisa 6 toodule.
- Palume parandada joonise loetavust, hetkel kattub asendiplaanil sidega seotud info. Palume kajastada tingmärkides ning asendiplaanil katastriüksuse piiride kontuurid kooskõlas (sh värvus).
- Palume viia asendiplaanil kajastatud ning tingmärkides olevad andmed omavahel kooskõlla.
- Projekti asendiplaanil peavad olema ära näidatud tehnovõrgu kaugused iseloomulikes kohtades teekatte servast ja/või tee teljest ning teemaa piirist, avatud kaeve korral ehituskaeviku piirjooned (sh tingmärkides) ning nende kaugused teekatte servast, teemaa ja riigitee kaitsevööndi piirid.
- Asendiplaani joonistel tuua vähemalt riigitee kaitsevööndi ulatuses välja tehnovõrgu paigaldustehnoloogia (lahtine või kinnine meetod), sügavus ning kaitsetoru nõuded iga trassi lõigu kohta.
- Palume kajastada nn noolega kastis riigitee maaüksusele rajatava side maakaabelliini kohta sügavuse ning kaitsetoru tugevuse andmed vastavuses Transpordiameti juhendist: „Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel“ tabel 1 tooduga. Lisaks palume kajastada info, mitu side maakaabelliini riigitee maaüksusele rajatakse.

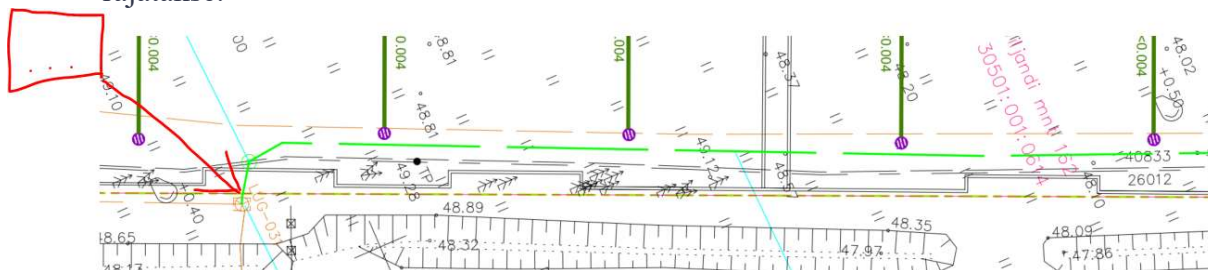

- Asendiplaanil kajastada terviklik katete taastamise osa, hetkel riigitee maaüksusel pole katete taastamist kajastatud.

- Palume selgitada, kas esitatakse kaks erinevat projekti, kuna asendiplaanil ning seletuskirjal on erinevad töö nr ning koostaja ettevõtted. Palume esitada ühesed kooskõlas andmed. Lisaks ei ole asendiplaani märkused terves ulatuses loetavad, palume korrigeerida.

☒ likvideeritav puu

MÄRKUSED:

1. Projekti koostamisel oli aluks GEOALUS OÜ poolt nov.2022.a koostatud töö nr 22-G130
2. "Niine ja Tammeotsa tuule-geodeetiline aluslaan tehnoövrakudega". Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST9
3. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostööks olemalevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asuko
4. Kommunikatsioonitrosside kaitsesõnõid teostada kaevetööd käitsi. Mehhanismid kasutamine lubatud kokkuleppel trc
5. Projekteeritud maotransside paigaldamissõuguv peab olema min 0,7m maapinnast haljasalal, riigiteel ja sõduteel – r
6. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning Telia Eesti AS juhtimi
7. ja teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamiste esitatud nõuetest.
8. Vajadusel väljakaevatud trossid (kaablid, veetorud jne) kaitsita toruga või karbikuga, toetada, riputada vajamise ja v
9. Peale ehitustööd taastada rikutud haljasmaa ja teekatted.
10. Kasvatate puude ja põõsaste kasvatsoonis (võra projektisõon maapinnal) teha kaevetööd käitsi.
11. Kasvatate puude tugijõuri kaevetööde kõigus mitte vigastada ego läbi lõigata.

Tellija: Luige Ärikeskus OÜ		Joonis: Asendiplaan	Joonis Nr AS_4-01	Mõõtkava 1:500/-	Leht 1/1
Staadium	Tööprojekt	Töö nimetus: Sidekanalisatsiooni projekteerimine	Muudatus		Kuupäev
Koostas	J. Raud				
Kontrollis					
		Address: Viljandi mnt 162, Kesa tn 1, Kesa tn, Luige alevik, Kiili vald, Harju maakond	 Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee Elektritööde reg.Nr.: EL10360030-0001		
Töö Nr	22_1284-5				
Kuupäev	04.12.2023	22_1284-5_TP_AS-4-01_ASEND_231204_JR			

Töö nr. 2203357

Töö nimetus: Viljandi mnt 162, Kesa tänava sidekanalisatsioon

Stadium: Tööprojekt

Tellija: E-Service AS

Projekti koostaja: Kristjan Toro



SELETUSKIRI

1 Üldandmed

- Palume kajastada asendiplaanil tingmärkides, millega on tegemist.

