

Põrkepiirete eemaldamise kava

Allpool on kirjeldatud Paldiski-Tootsi trassil, seoses ülegabariidiliste vedudega perioodil 04.03-15.07.2024, trassikoridori ettevalmistamistöid mis puudutavad töid põrkepiiretega.

Põrkepiirded eemaldatakse vastavat pädevust omava ettevõtte poolt ja algne olukord taastatakse vedude lõppemisjärgselt. Algne olukord taastatakse hiljemalt 15.07.2024. Eelnevalt kirjeldatud perioodil eemaldatud piirded transporditakse ja hoiustatakse turvaliselt töövõtja territooriumil.

Piirete eemaldamisel paigaldatakse piirde otstesse mahaviigud.

Piirete asukohad:

T4 18.79-18-86km

<https://www.google.com/maps/place/59%C2%B018'34.3%22N+24%C2%B034'11.5%22E/@59.3094568,24.5698986,19.5z/data=!4m10!1m5!3m4!2zNTnCsDE4JzM0LjQiTiAyNMKwMzQnMTEuNiJF!8m2!3d59.309543!4d24.569895!3m3!8m2!3d59.30952!4d24.569857?entry=ttu> Kanama tagasipöördekoht.

Eemaldada tuleb pildil kirjeldatud piire. Maht kokku koos olemasolevate piirete ülekatetega 52m.




Ajutise lahendusena eelpool kirjeldatud perioodil kasutame vedudevälisel ajal Kanama tagasipöördekohas plastikust veega/liivaga täidetavaid teetõkke elemente. Elementide kõrgus on 800mm ja ühe elemendi kaal täidetuna kuni 80kg.



T3580 Luige ühendustee 0.125-0.165km

<https://www.google.com/maps/place/59%C2%B019'09.4%22N+24%C2%B045'42.4%22E/@59.3194042,24.7614353,18.5z/data=!4m4!3m3!8m2!3d59.319265!4d24.761777?entry=ttu> Luige mahasõit. Maht 12m

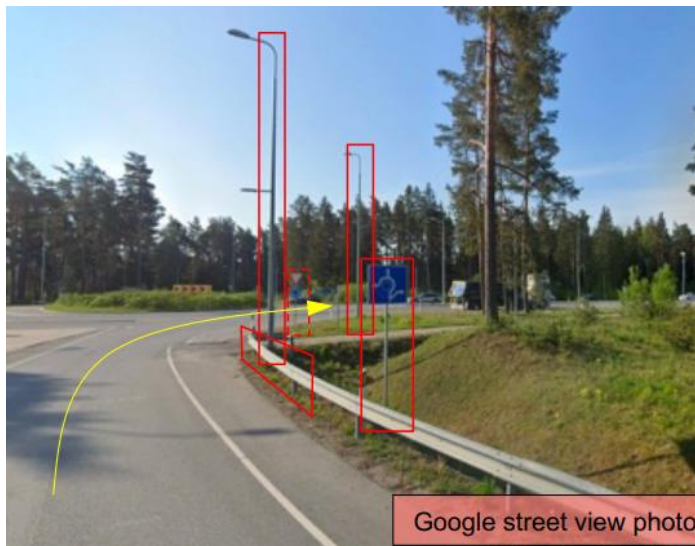

Google street view photo
