


From: Laur Kõiv
Sent: Friday, February 7, 2025 1:10 PM
To: 'Kert Kartau' <kert@viimsikeevitus.ee>
Subject: RE: Vägeva tee 2

Tere

Oleme EHRis esitatud materjalid üle vaadanud ning palume korrigeerida/täpsustada.

Palume täpsustada, kas pikiprofiilil kajastatud tabelis on toru rajamise sügavuse andmed õiged (2,00m) V1-V4.

Nt V10 ja V9 asukohas on arvestatud projekteeritava maapinnaga.

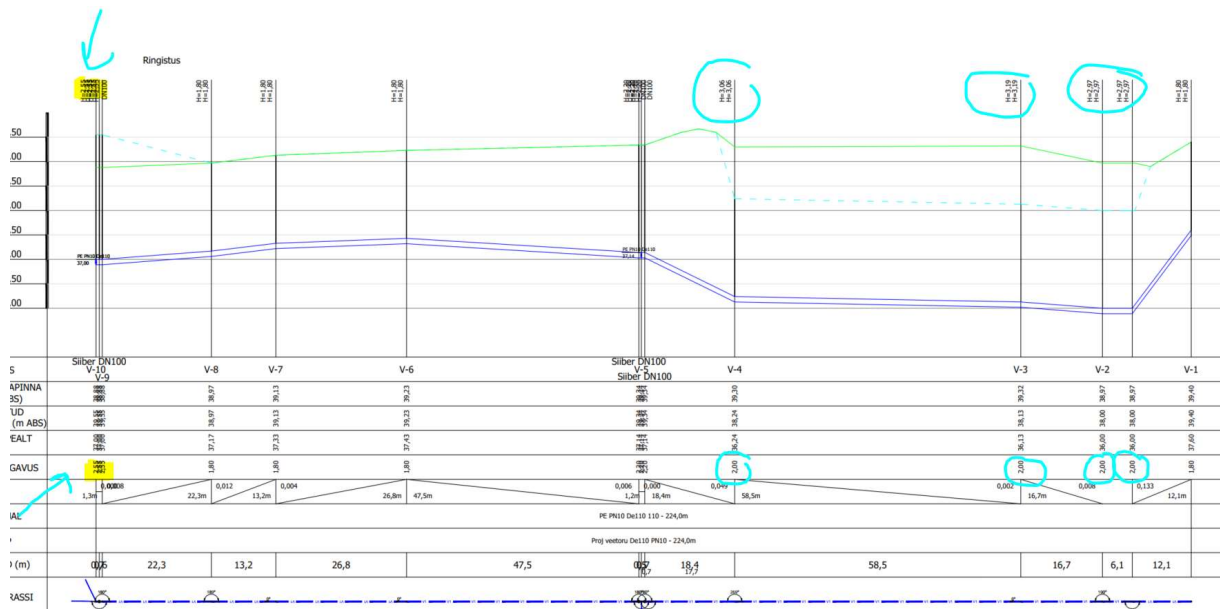

Lisaks palume pikiprofiilis kajastada veetoru juures nn hülsside asukohad/kontuurid ning asendiplaani palume kajastada hülsside tugevuse/rõngasjäikuse andmed.

Palume asendiplaani tingmärkides kajastada ka Reaalprojekt OÜ töö nr P19077 kontuurid ning vastav kirje.

Palume seletuskirjas kajastada, et ristumisel projekteeritavate teedega „Riigitee nr 96 Tallinn - Peetri alevik – Tallinn Tallinna väike ringtee“, Reaalprojekt OÜ töö nr P19077, tuleb veetorustik rajada minimaalselt 2,2m sügavusele ning kogu ulatuses kaitsehülssi (16kN/m²).

Lisaks palume kajastada, et veetorustik tuleb rajada Tallinna väike ringtee projektis kajastatud kraavide asukohas, projekteeritud kraavi põhjast min 2,0m sügavusele.

Parimate soovidega



Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn / [Transpordiamet](#)
