

1. Ajutise liikluskorralduse projekt on kooskõlastatud eeldusel, et projekteriteeria on projekti koostamisel arvestanud kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, teenindavate sõidukite näitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklusesagedusega.
2. Kooskõlastus kehtib ainult riigimaanteedel osas, liikluskorraldusvahendi linna- ja vallateedel kooskõlastada vastava kohaliku omavalitsusega.
3. Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhendides EVS 613 nõuetest. Liikluse korraldamisel objektil juhendada määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
4. Paigaldatavad ajutised liikluskärgid valmistada 2. klassi valgustusega kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusrühma liikluskärgi.
5. Püüandud ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on ohtuht võistluse läbimiseks vajalik.
6. Liikluse korraldamisel, sealjuures liikluse reguleerimisel arvestada liiklusesaduse nõuetega.
7. Liikluse ümbersuunamine kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Tee sulgemist teavitada päästeteenistust ja politseid
8. Vähemalt 48 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangute ja tööde tegemist Transpordiameti Tark Tee liikluspiirangute teavitamiskeskonnas, millele pääseb lii Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

250-30

h=100

Objekt: Riigitee 15170 Parasi-Põikva-Rassi
tee km 3,966 asuva Änniste silla
rekonstrueerimine

Tellija: Transpordiamet
Valge 4, Tallinn, tel: 620 1200

Töö tegija: GRK Eesti AS
Riia 142, Tartu, tel: 5354 0454

Töö tegija projektijuht:
Kristjan Mänd tel: 5354 0454

Liikluskorralduse eest vastutav isik:
Kristjan Mänd tel: 5354 0454

Omanikujärelvalvet teostav isik:
Insten Projekt OÜ
Valeri Volkov, tel: 5660 0433

Tööpiirkonna pikkus: 200 m

h=25

Märkused:	Lisa märkused:
1. Muud olemasolevad liiklusemärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusajaga liikluskorraldusega, tuleb kindlalt katta. 2. Vajadusel korrigeerida liikluskorraldust tööetapi olukorra kohaselt. 3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusemärgid. 4. Ajutised ehitusajaga liiklusemärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad. 5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusemärkide puustiolek ja loetavus. 6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.	1. Aasta keskmine ööpäevane liiklus 152 Sõiduaudod ja pakiautod (%) 90 Veoaudod ja autobussid (%) 3 Autorongid (%) 7 2. Antud asulavälisel lõigul kehtib statsionaarne kiirusepiirang 90 km/h

Lisa märkused:

- Aasta keskmine ööpäevane liiklus 152
Sõiduaudot ja pakiaudot (%) 90
Veoaudot ja autobussid (%) 3
Autorongid (%) 7
- Antud asulavälisel lõigul kehtib statsionaarne kiirusepiirang 90 km/h

LEPPEMÄRGID


	Töötsoon		Paigaldatav ajutine liikluskmärk
	Märgid 686a/686b 10m sammuga		Olemasolev liikluskmärk

Lõunaliiklus
 Sinu liikluskorraldaja
 Tähe põik 8, Kambja vald, Tartu maakond
 Telefon: +372 5248 400
 E-post: info@lounaliiklus.ee

Koostas:	Indrek Vähi	
----------	-------------	--

ellija: GRK Eesti AS

Projekti nimetus: Änniste silla rekonstrueerimine	Kuupäev 12.07.2026
Objekti asukoht: Tee nr 15170 Parasi-Põikva-Rassi km 3,966	Töö nr: 200/26
Joonis:	Joonis nr : 1 - (4)
Üldtähistus	Mõõtkava

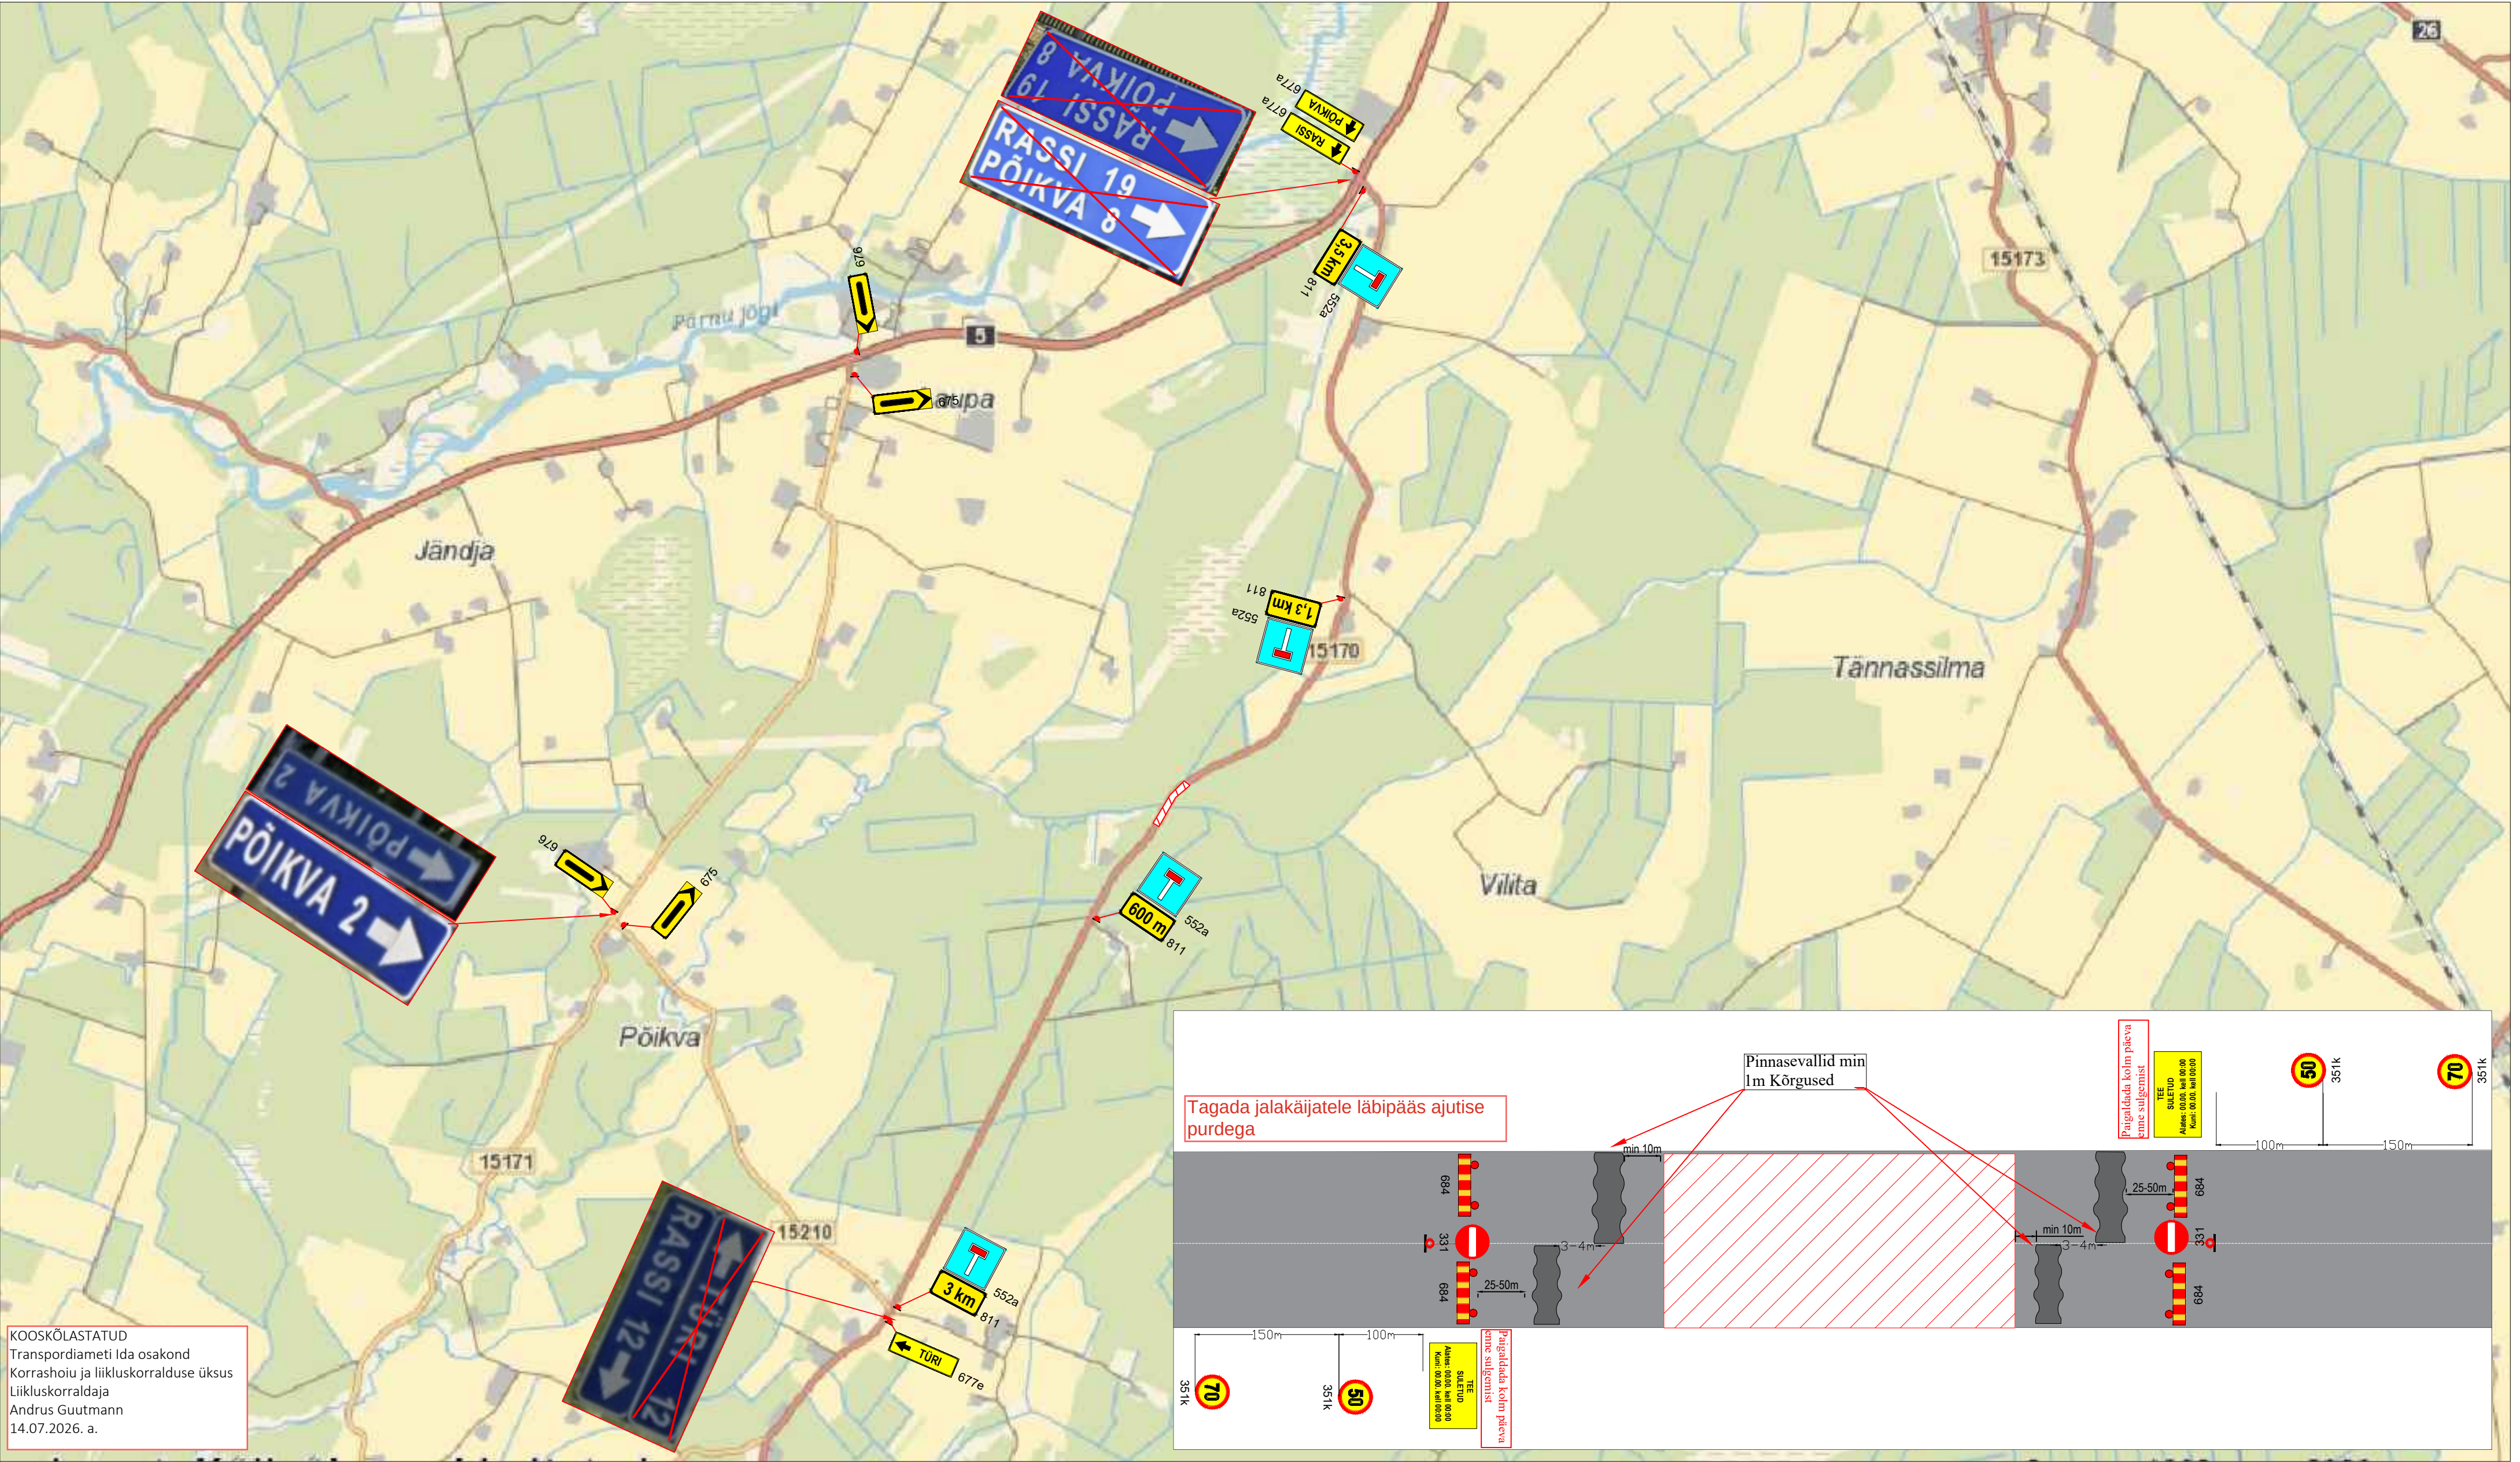

KOOSKÖLASTATUD
Transpordiameti Ida osakond
Korraldajad ja liikluskorralduse üksus
Liikluskorraldaja
Andrus Gutmann
14.07.2026. a.

Märkused:

1. Muud olemasolevad liikluskärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liikluskärgiga, tuleb kinni katta.
2. Vajadusel korrigeerida liikluskärgi tööetapi olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liikluskärgi.
4. Ajutised ehitusaegsed liikluskärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liikluskärgide püstitolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.

Lisa märkused:


1. Aasta keskmine ööpäevane liiklus 152
Sõiduaudod ja pakiaudod (%) 90
Veoaudod ja autobussid (%) 3
Autorongid (%) 7
2. Antud asulavälisel lõigul kehtib statsionaarne kiirusepiirang 90 km/h

LEPPEMÄRGID			Projekti nimetus:		Kuupäev	
			Änniste silla rekonstrueerimine		12.07.2026	
			Objekti asukoht:		Töö nr:	
			Tee nr 15170 Parasi-Põikva-Rassi km 3,966		Joonis nr :	
			Joonis: Tee sulgemine		2 - (4)	
					Mõõtka	

Lõunaliiklus Sinu liikluskorraldaja			Tähe põik 8, Kambja vald, Tartu maakond Telefon: +372 5248 400 E-post: info@lounaliiklus.ee		
Koostas:		Indrek Vähi			
Tellija: GRK Eesti AS					

Töötsoon		Paigaldatav ajutine liiklusmärk	
Märgid		Olemasolev liiklusmärk	
686a/686b			
10m sammuga			

Töötsoonis tagada nähtavus mõlemas suunas

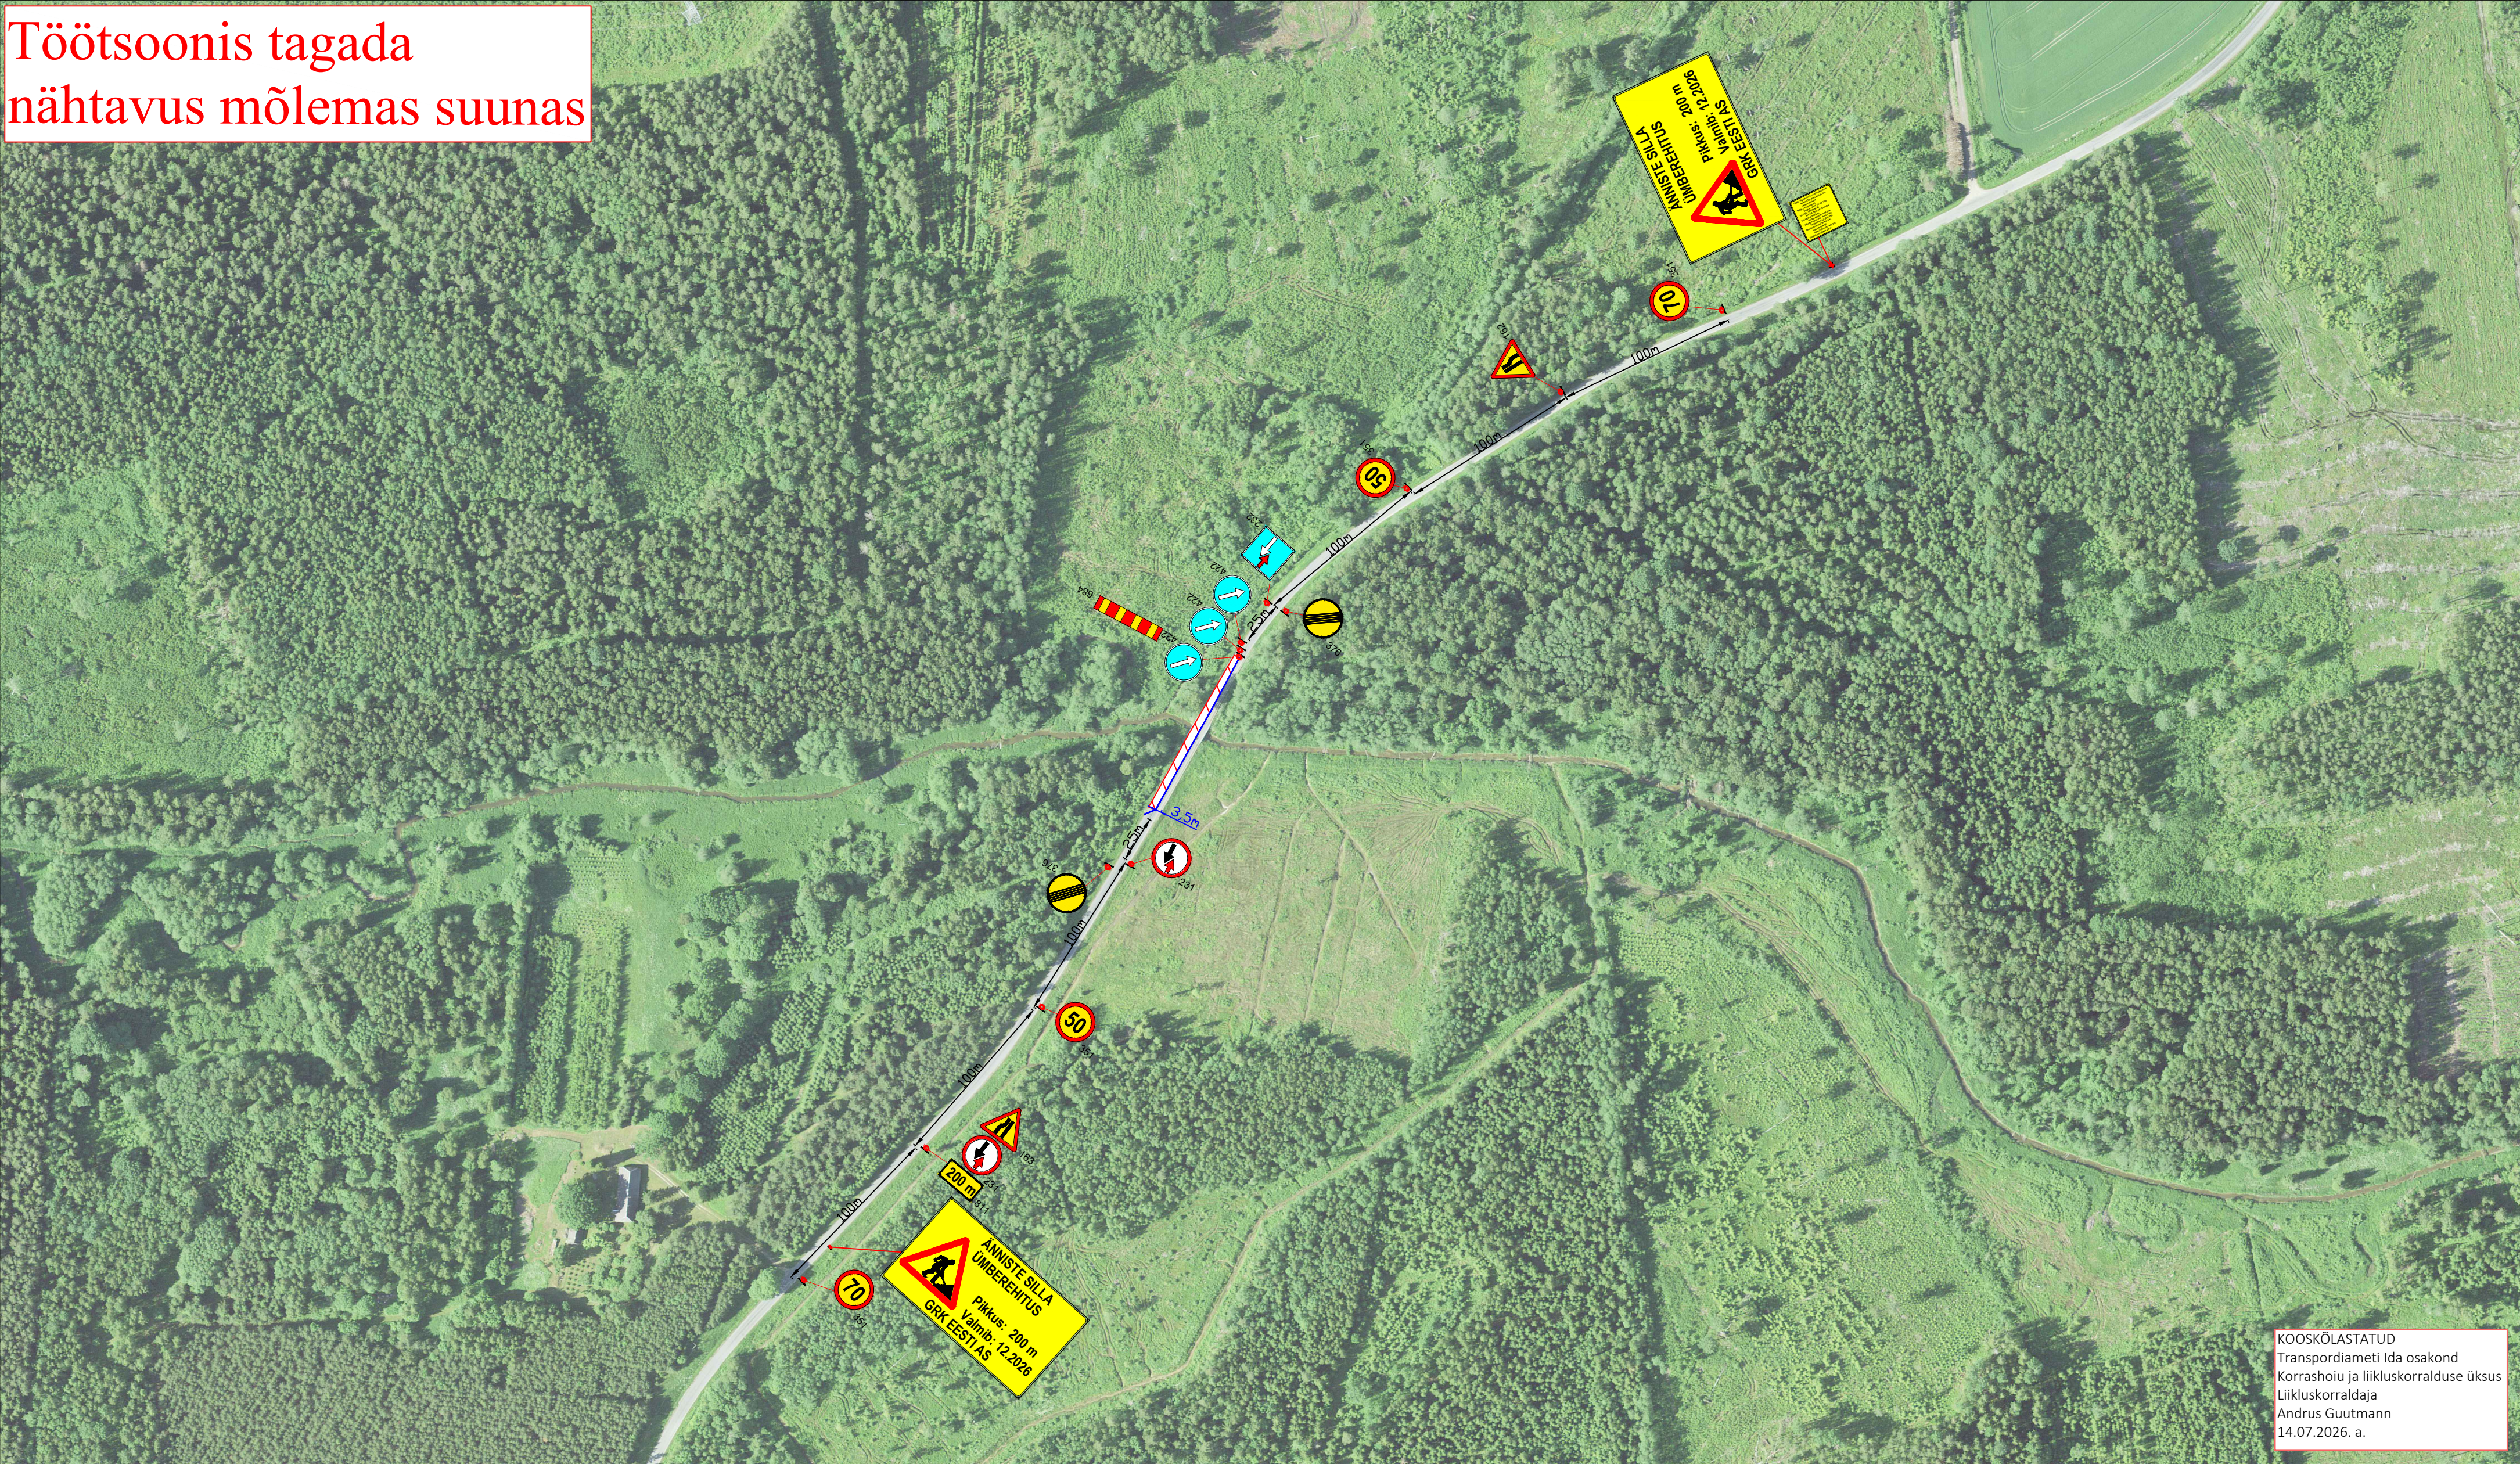

Märkused:

1. Muud olemasolevad liikluskärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitussegga liikluskärgiga, tuleb kinni katta.
2. Vajadusel korrigeerida liikluskärgi töötajal olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liikluskärgi.
4. Ajutised ehitussegad liikluskärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liikluskärgide puistole ja loetavuse.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.

Lisa märkused:

1. Aasta keskmine ööpäevane liiklus 152
Sõiduautod ja pakiautod (%) 90
Veoautod ja autobussid (%) 3
Autorongid (%) 7
2. Antud asulavalisel lõigul kehtib stationsaame kiirusepiirang 90 km/h

LEPPEMÄRGID



Töötsoon



Märgid
686a/686b
10m sammuga 3



Paigaldatav aiutine liiklusmärk



Olemasolev liiklusmärk



Tähe põik 8, Kambja vald, Tartu maakond
Telefon: +372 5248 400
E-post: info@lounaliiklus.ee

Koostas:	Indrel
----------	--------

Tellija: GRK Eesti AS

Projekti nimetus:

Änniste silla rekonstrueerimine

Objekti asukoht:

Tee nr 15170 Parasi-Põikva-Rassi km
3,966

Poole tee sulgemine


Kuupäev
12.07.2026

Töö nr: 200/26

Joonis nr :
3 - (4)

Mõõtkava

Töotsoonis tagada
nähtavus mõlemas suunas

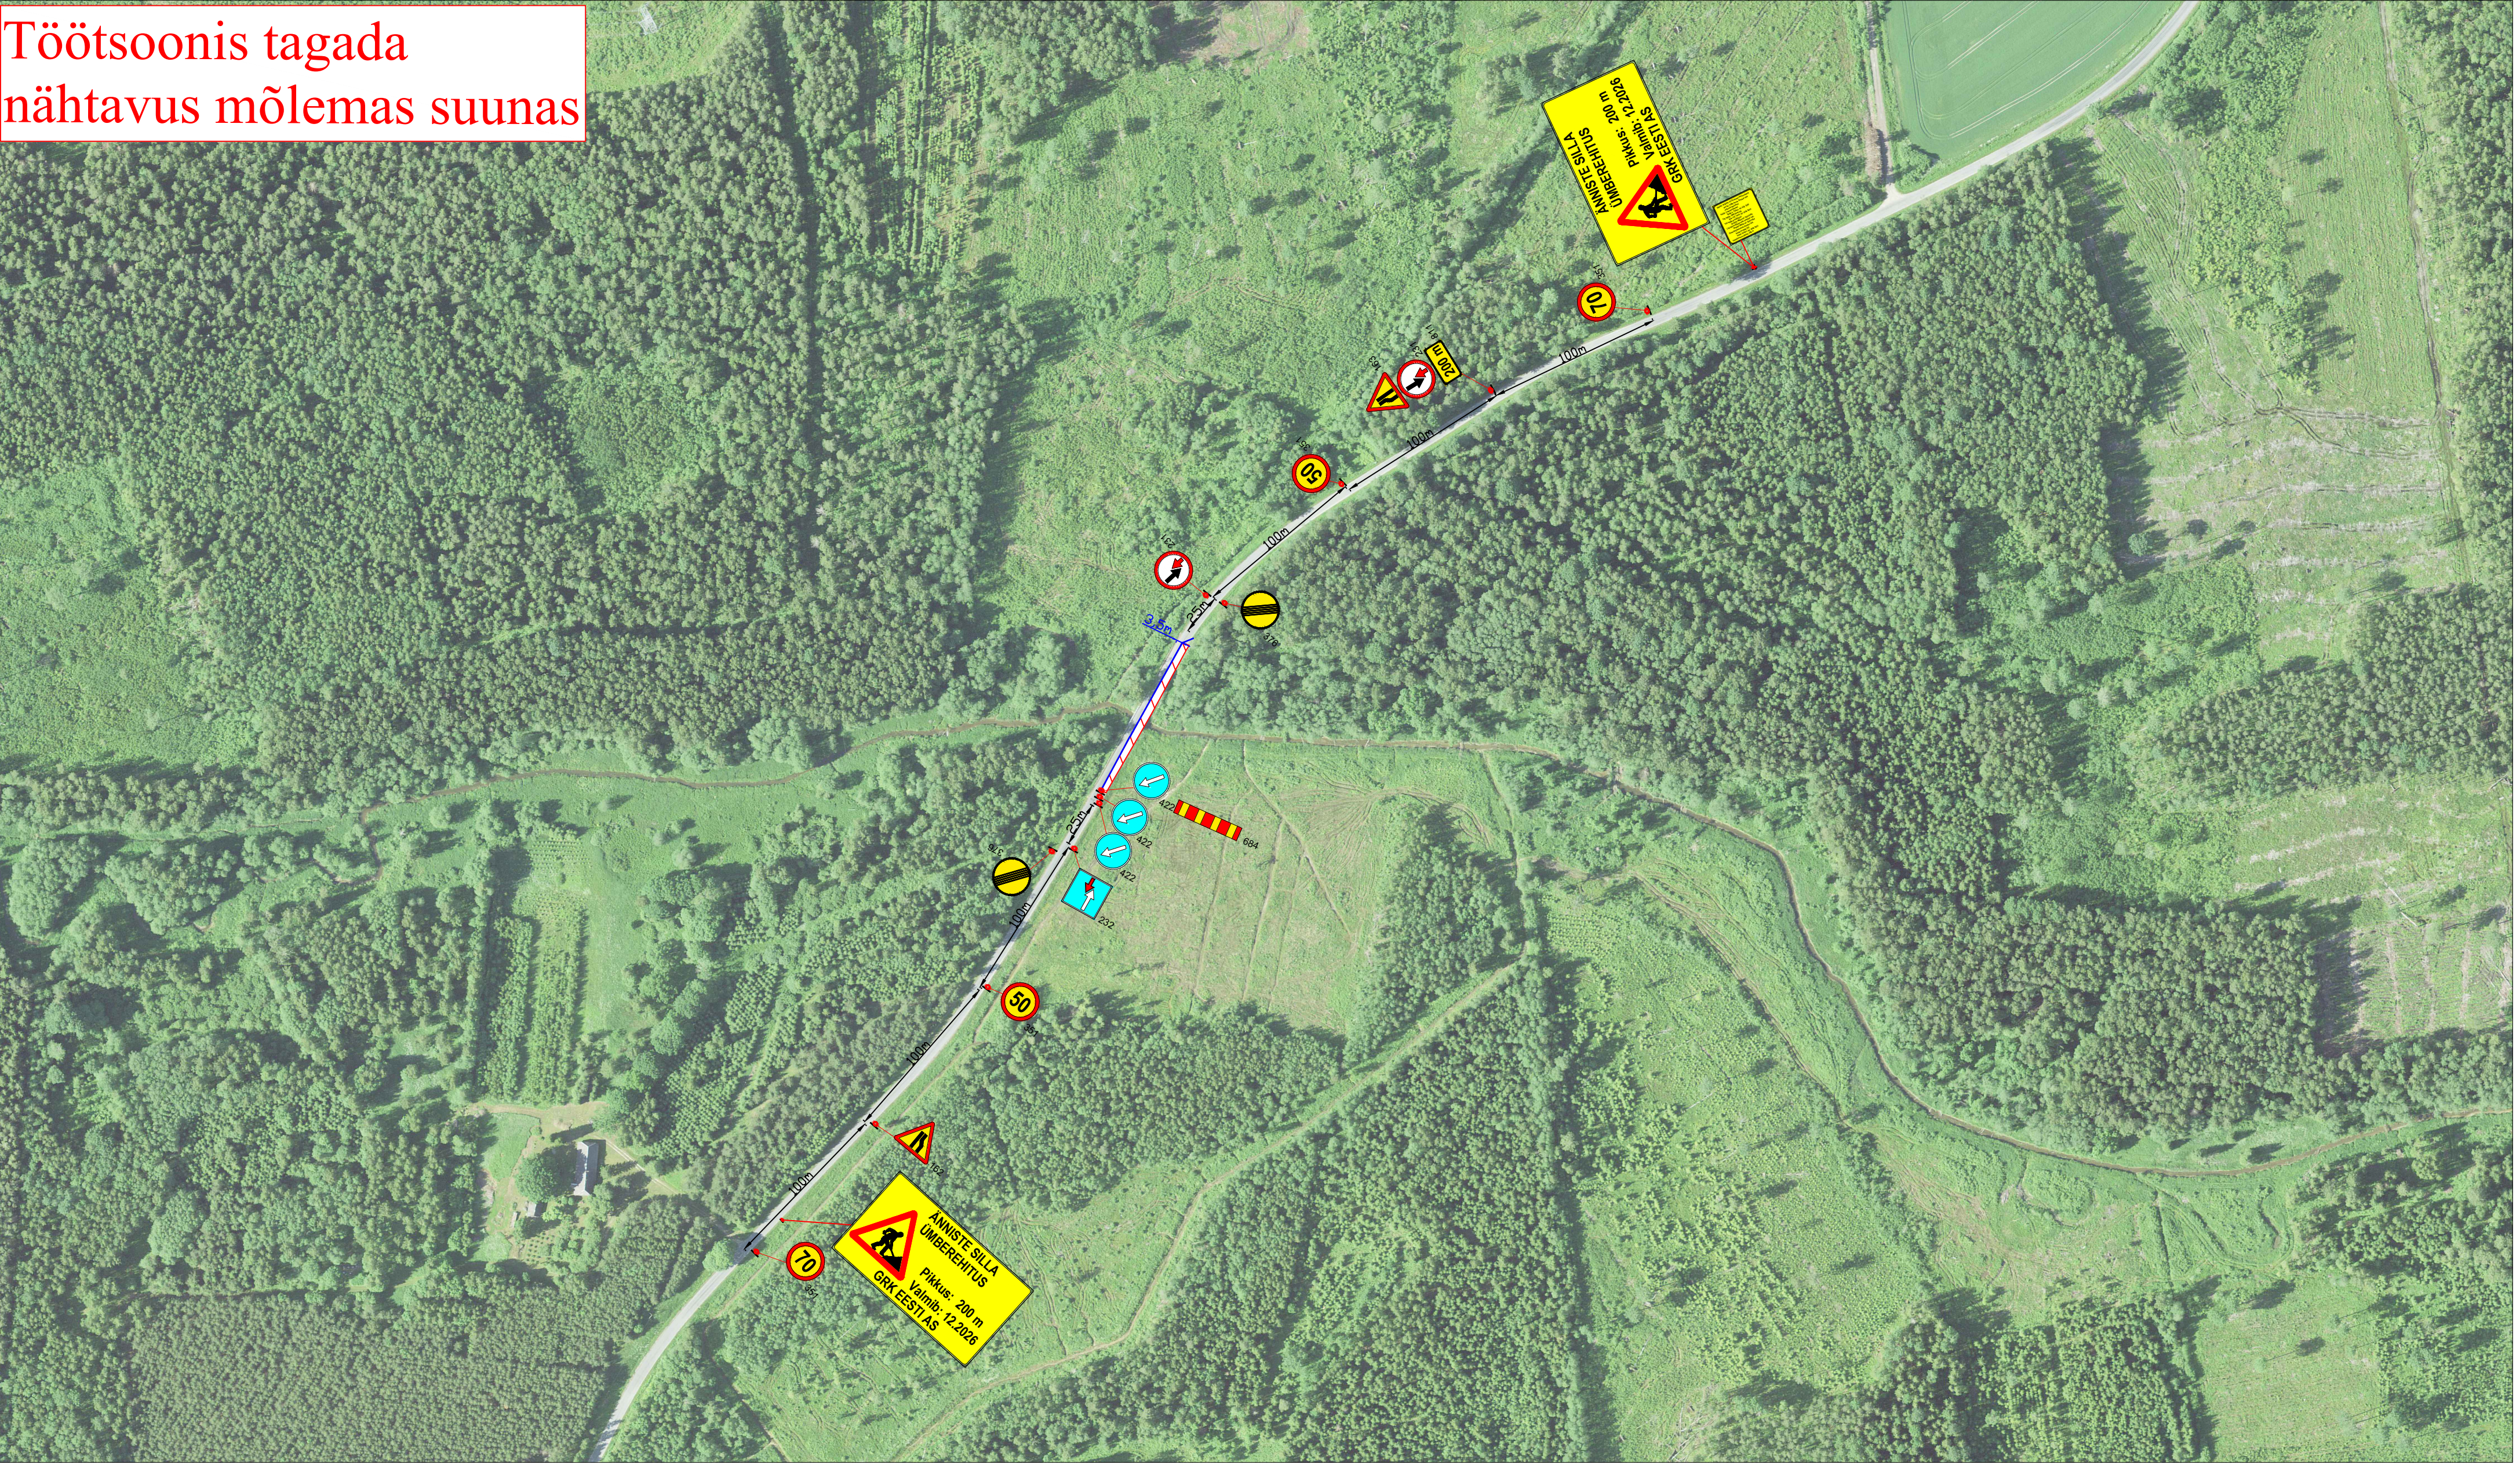

Märkused:

- Muud olemasolevad liiklusemärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liikluseemiga, tuleb kinni katta.
- Vajadusel korrigeerida liikluseem tööetapil olukorra kohaseks.
- Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusemärgid.
- Ajutised ehitusaegsed liiklusemärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
- Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusemärkide püstitolek ja loetavus.
- Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.

Lisa märkused:

- Aasta keskmine ööpäevane liiklus 152
Sõiduaudod ja pakiautod (%) 90
Veoautod ja autobussid (%) 3
Autorongid (%) 7
- Antud asulavälisel lõigul kehtib statsionaarne kiirusepiirang 90 km/h

LEPPEMÄRGID

Töotsoon

Märgid
686a/686b
10m sammuga

Paigaldatav ajutine liiklusemärk

Olemasolev liiklusemärk



Tähe põik 8, Kambja vald, Tartu maakond
Telefon: +372 5248 400
E-post: info@lounaliiklus.ee

Koostas: Indrek Vähi

Tellijä: GRK Eesti AS

Projekti nimetus: Änniste silla rekonstrueerimine	Kuupäev 12.07.2026
Objekti asukoht: Tee nr 15170 Parasi-Põikva-Rassi km 3,966	Töö nr: 200/26
Joonis: Poole tee sulgemine	Joonis nr : 4 - (4)
	Mõõtka
