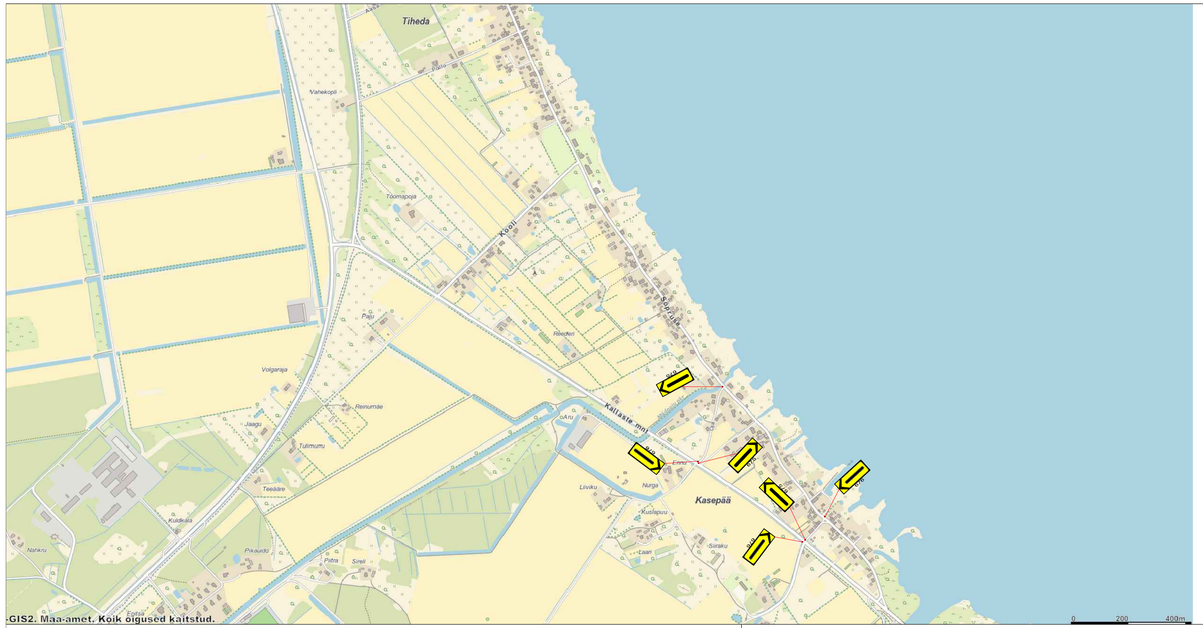

GIS2. Maa-amet. Kõik õigused kaitstud.

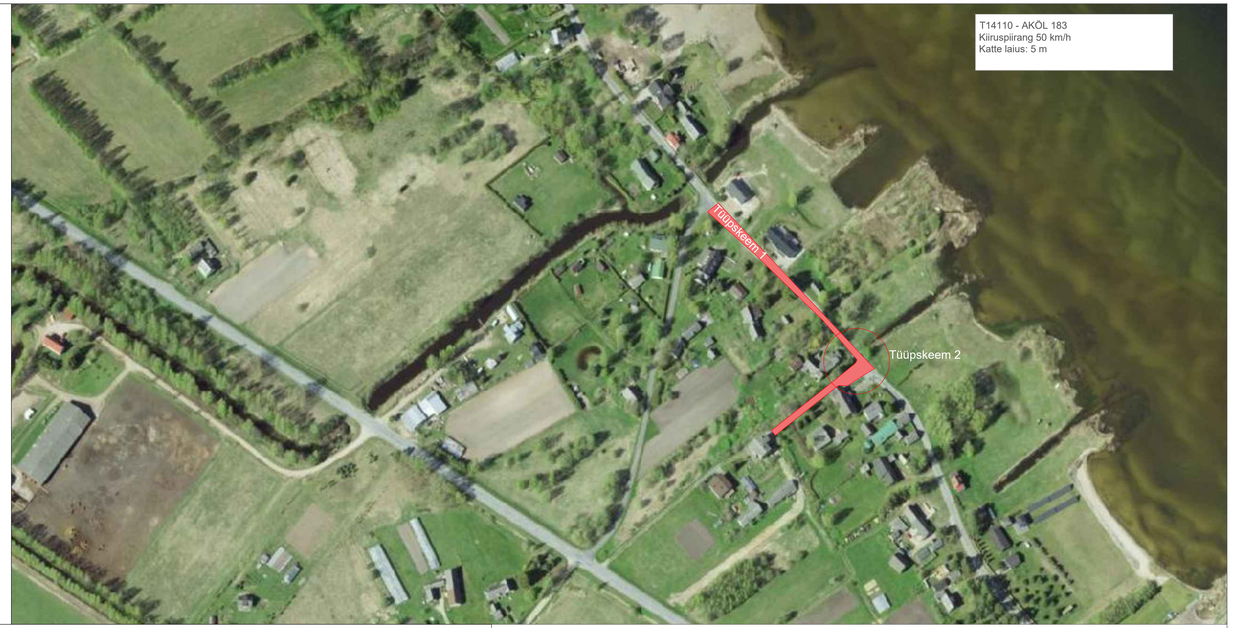

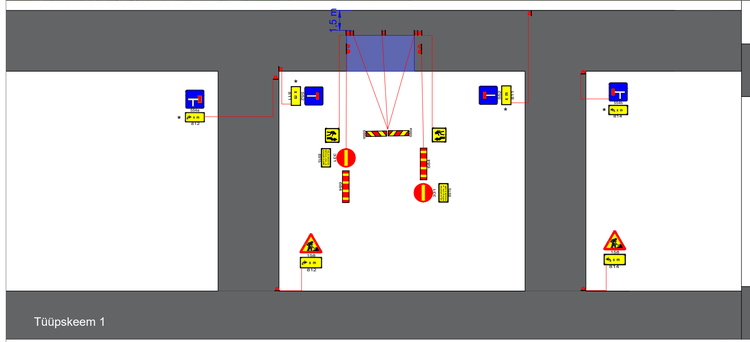

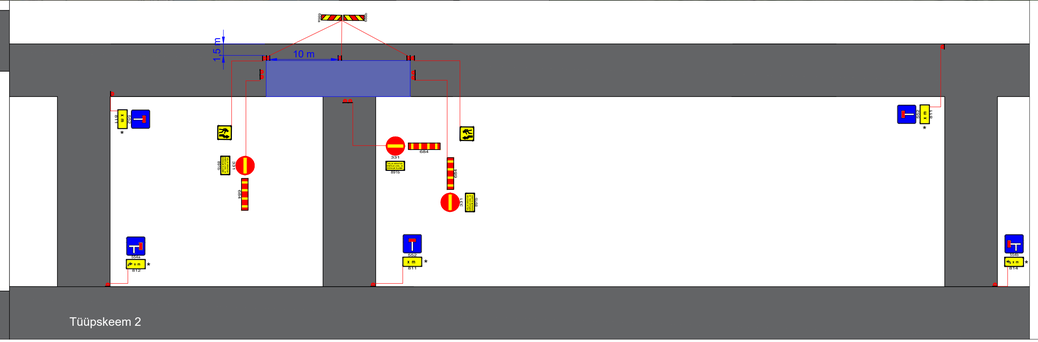

Tingmärgid:

- Töötsoon
- Projekteeritud ajutine liiklusmärk
- Olemasolev statsionaarne liiklusmärk

Märkused:

1. Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutiste liiklusmärkidele".
2. Kaevetööde piirata kanvik ajutise piirdeaiaga.

Info: 1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis kohaliku omavalitsuse liikluskorralduse osakonnaga.

Skeem kehtib koos üldskeemiga nr. 20073 joonis 1

Töö on liikuva iseloomuga objekti ulatuses

- Lisateatetahvleid kasutada juhul kui sulgemise kaugus eelnevast ristmkust on üle 100m. Lisateatetahvlitele kantav vahemaa vastavalt olukorrale.

Ehitaja tagab kergliiklejatele läbipääsukoridori töötsooni kõrvalt vähemalt 1,5m laiuselt, vajadusel kasutab pinnasekaitsematte.

Ehitaja tagab igal hetkel kinnistu omanikel kinnistutele ligipääsu.

Ehitaja tagab igal hetkel erinevate kinnistute külastajatele ligipääsu, nt pood, rahvamaja, raamatukogu jmt.

Parkimist reguleerivad märgid 383+579 ja 393 paigaldada töötsooni töödele eelneval päeval alates kell 17:00.

RPE liikluskorraldus OÜ
Reg.kood 14733009
Kaasiku 2, Kõlvaste 70901, Harjumaa
Tel +372 646 3636
info@rpe.ee

Joonis	Ajutine liikluskorraldus
Projekt	Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine
Asukoht	Sõpruse tn, Kasepää küla, Mustvee vald, T14110 0,79 - 0,92 km / T6570058 0,07-0,098 km
Tellija	Vensen AS

Kontrollis	V.Lokko 193417					
Koostas	M.Unie					
Kuupäev	03.07.2024	Märkused:	Mõõtkava	Aluskaart	Töö nr:	Joonise nr:
				Maa-amet	20073	5
