
TINGIMUSED:

1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 1. (või 2.) suurusgrupi liiklusmärke.
3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
4. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon.
5. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
6. Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
7. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik.
8. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute

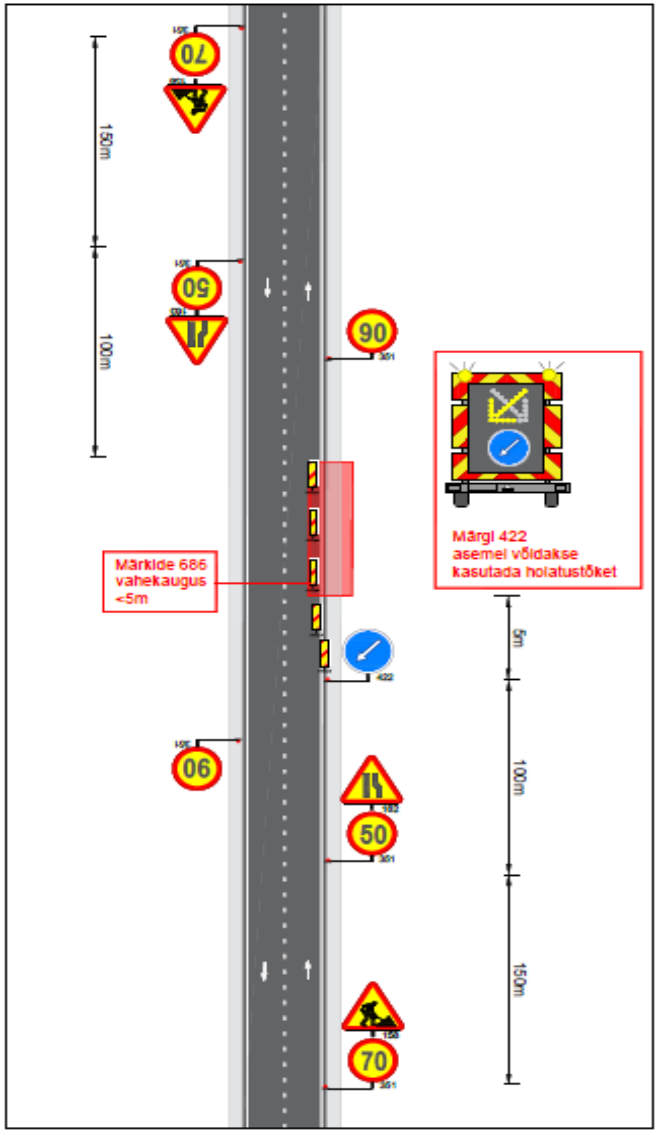

TA tüüpjoonis	**Tööd teepeenral – sõidurada ei suleta, kiirus 90 km/h**	Joonis 2
Töö nimetus	Mõniste-Kuutsi keskpingeliini ümberehitus, Rõuge vald, Võrumaa IP7749	

Tööde asukoht

Maakond	Võru maakond		
Tee nr:	**Tee nimi:**	**Algus km:**	**Lõpp km:**
67	Võru-Mõniste-Valga tee	41,88	41,90
25196	Mehka-Saru tee	0,02	2,57
25199	Mõniste-Tiitsa-Karisöödi tee	3,54	7,69
25198	Mehka-Vastse-Roosa tee	0,01	1,04
25246	Saru-Kuutsi tee	0,01	1,15
25217	Tursa tee	0,01	1,16
25197	Kuutsi-Peebu tee	0,01	0,21

Teostamise aeg: 23.11.2026-26.02.2027

iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu. 9. Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba 10. Töövälisel ajal vabastada sõidurada ja eemaldada piirangud	Tööde teostaja	Kagu Elekter OÜ	
	Liikluskorralduse eest vastutaja		Urmo Kivi
