KOOSKÕLASTATUD
Transpordiamet, Lääne osakond
Alard Tallo - liikluskorraldaja
10. juuli 2026. a.

TINGIMUSED:

1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valguspeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
4. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
5. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
6. Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
7. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
8. Metsamaterjali kaugus kruusatee servast ≥ 2,5 m.
9. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.
Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil.

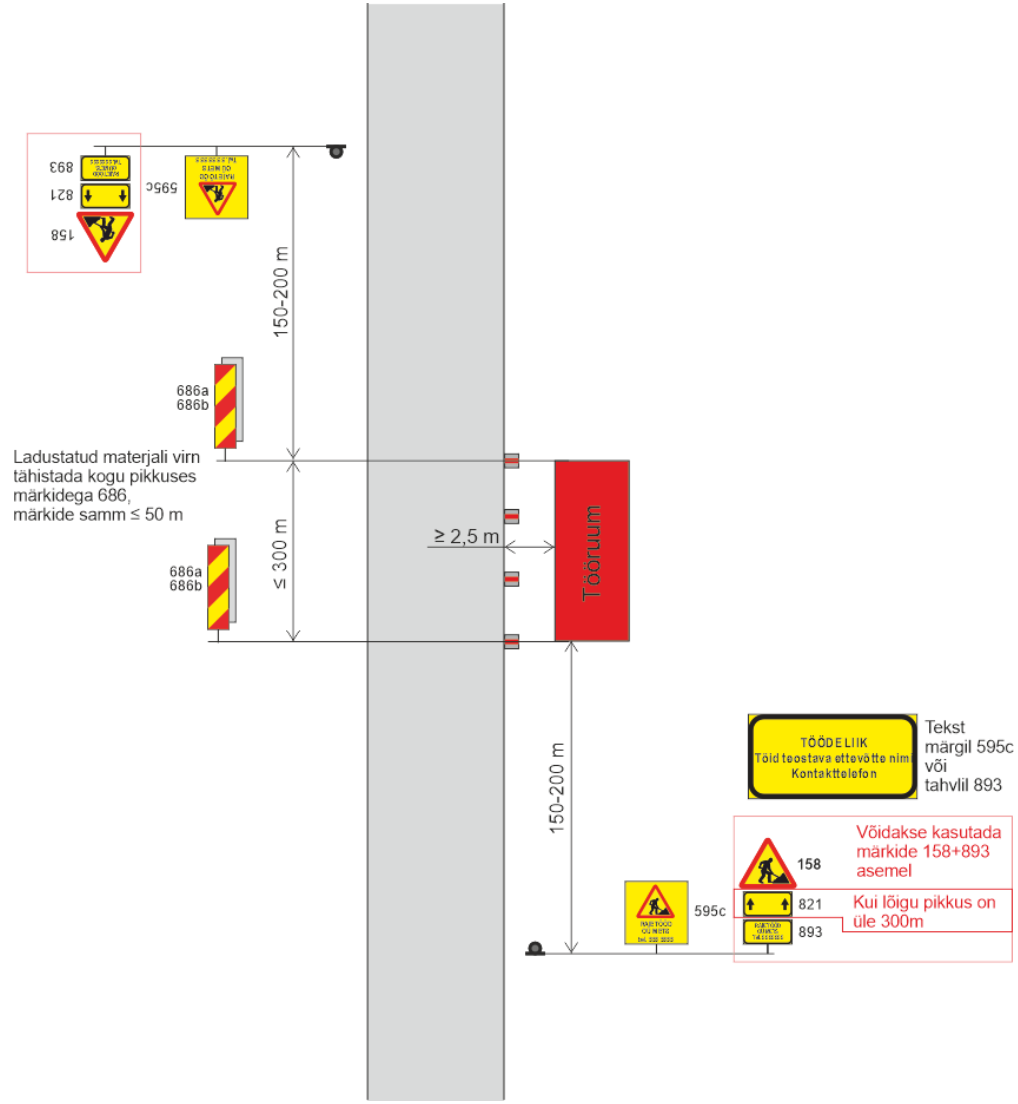

Tüüpjoonis	Metsa ladustamine kruusatee – kiirus 70-90 km/h				Joonis 5-2	
Töö nimetus	Metsamaterjali ladustamine			Teostamise aeg	14.07-07.10.2026	
Tööde asukoht	Tee nr	24221	Tee nimi	Kiviküla tee	Km	2,35-2,47 vasakul
	Muu info	Materjal kinnistult 57002:003:0095				
Tööde teostaja	AS Roger Puit					
Liikluskorralduse eest vastutaja		Nimi	Peeter Pungar		Tel. nr	59129190
