		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		Truubid	5 days	14.07.25 8:00	18.07.25 17:00		
2		Ol.oleva katte freesimine	3 days	21.07.25 8:00	23.07.25 17:00		
3		Ooteplatvormide/-alade ehitus	4 days	21.07.25 8:00	24.07.25 17:00		
4		Kasvupinnase eemaldamine peenardelt	3 days	22.07.25 8:00	24.07.25 17:00		
5		Defektsete kohtade remont (freesimine ja AC 32 base)	1 day	28.07.25 8:00	28.07.25 17:00	4	
6		AC 12 bin tasanduskiht	2 days	29.07.25 8:00	30.07.25 17:00	5	
7		Mahasõitude väljakaeve tasanduskiht fr. 4/32	2 days	31.07.25 8:00	1.08.25 17:00		
8		AC 16 surf ülekate (laiendused, bp, ms)	4 days	4.08.25 8:00	7.08.25 17:00	7	
9		Peenarde kindlustamine	5 days	11.08.25 8:00	15.08.25 17:00		
10		Teemärgistus	5 days	18.08.25 8:00	22.08.25 17:00	9	
11		Tähispostide asendamine/heakorratööd/haljastus	5 days	25.08.25 8:00	29.08.25 17:00	10	

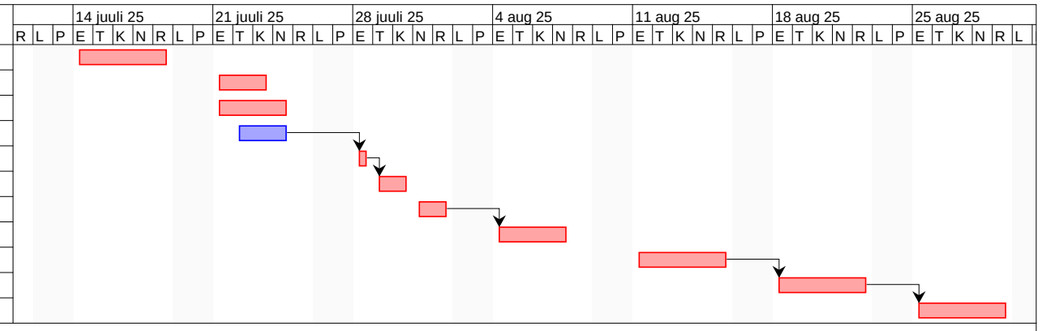

	1 sept 25							8 sept 25							15 sept 25							22 sept 25						
P	E	T	K	N	R	L	P	E	T	K	N	R	L	P	E	T	K	N	R	L	P	E	T	K	N	R	L	P
