Fail: S:\joonised projektid\Ajutine liikluskorraldus\DWG skeemid\2025\15693_TP_TL-1_T1_km10,6-90,94_T23_km8,06_geoloogilised_uuringud.dwg

T1 Tallinn - Narva

T1 Tallinn - Narva

T1 Tallinn - Narva



T23 Rakvere - Haljala

Tüüplahendus T1 eraldusriba

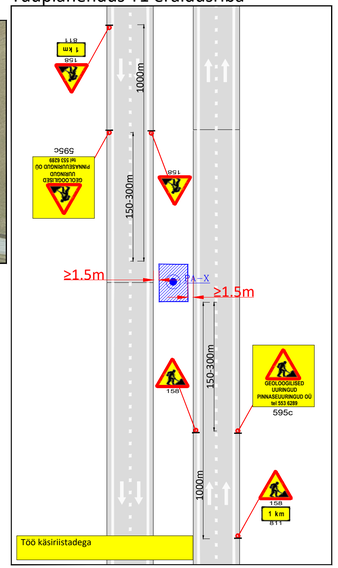

Tüüplahendus T1 teepeenar

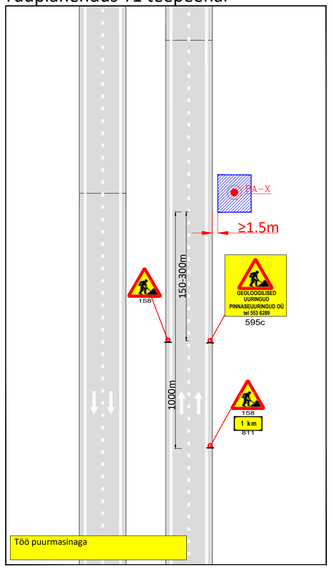

Tüüplahendus T23 teepeenar

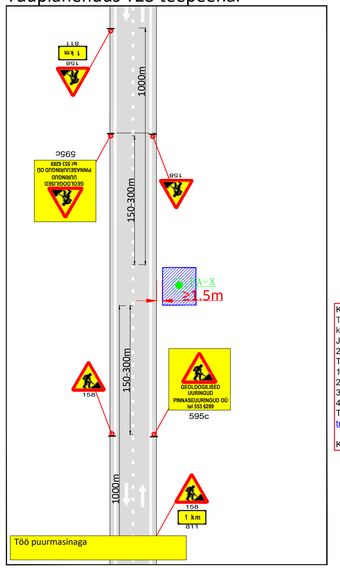

Tingmärgid:

Projekteeritud ajutine liiklusmärk

Projekteeritud puurauk/uuringu punkt

Tööotsoon

Tööd teenindavad masinad - parkimiskoht

Märkused:

1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Transpordiametis.
2. Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
3. Lähtuda juhendist "Riigiteede ajutine liikluskorraldus".
4. Töötsooni tähistamiseks kasutatakse tüüplahendusi.

KOOSKÕLASTATUD
Teehoiuteenistuse põhja osakonna
korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja
26.09.2025. a reg. nr. 174331
Tingimustel
1. Liikluse korraldamisel juhinduda juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus" MA 2018-009
2. Tööruumi piiritlemisel on lubatud kasutada märkide 686 asemel tähiskoonuseid
3. Tööd tegevad ja töömaad teenindavad masinad hoida joonisel määratud asukohtades
4. Vähemalt 24 tundi enne töö alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja töö kestvusest
Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi ameti e-teeninduse kaudu või e-post tmc@transpordiamet.ee

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel töötamise luba

SIGNAAL	AS Signaal TM Liimi 3, Tallinn 10621 Tel 656 3532 signaal@signaal.ee ELK000009, EEP002572		Joonis	Ajutise liikluskorralduse joonis	
			Projekt	Geoloogilised uuringud	
Projekteerija	T.Tepandi		Asukoht	T1 Tallinn - Narva km 10,6; 11,2; 12,2; 24,1; 25,2; 51,6; 68,5; 80,3; 90,04 T23 Rakvere - Haljala km 8,06	
Projekteerija	K.Sikljarova	Tel 5326 8672			
Assistent	M.Põiklik		Tellija	Pinnaseuuringud OÜ; tel +372 5536289	
Kuupäev	Mõõtkava		Töö nr	Staadium	Joonise nr [nr-leht(lehti)]
25.09.2025			15693	Tööprojekt	TL-1-1(1)
