
KOOSKÕLASTATUD
Transpordiamet, Teehoiuteenistus
Lääne osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Marika Koppel – Hiiumaa liikluskorraldaja
28. oktoober 2026. a.

TINGIMUSED:

1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valguspeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
4. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
5. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
6. Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
7. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
8. Metsamaterjali kaugus sõidutee servast ≥ 4,0 m.
9. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.
Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil.

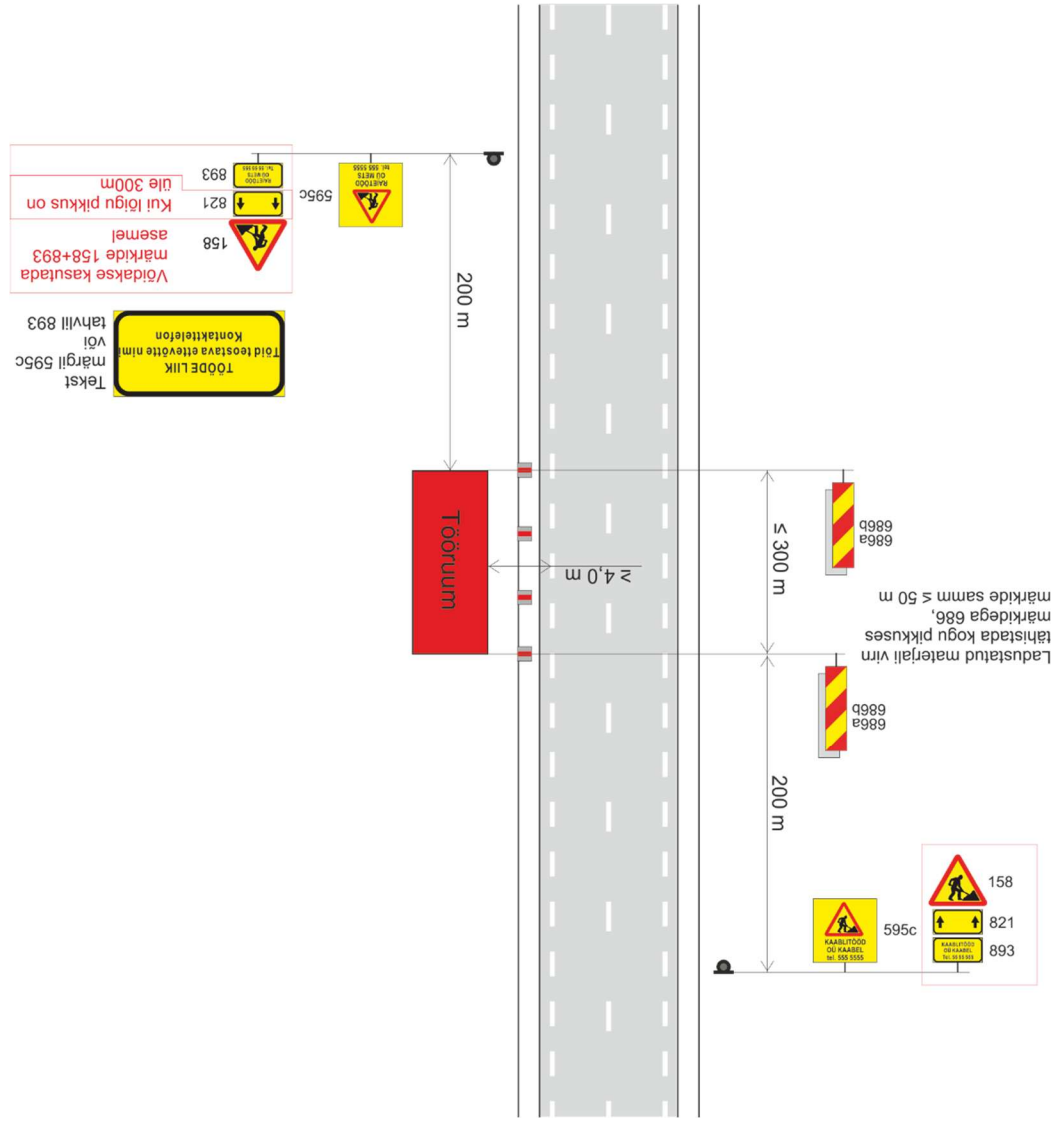

Tüüpjoonis	Metsa ladustamine kattega tee äärde – kiirus 70-90 km/h				Joonis 5-1	
Töö nimetus	Metsamaterjali (ümarpuit, hakkepuit) ladustamine			Teostamise aeg	03.11.2026-31.01.2027	
Tööde asukoht	Tee nr	80	Tee nimi	Heltermaa-Kärdla-Luidja tee	Km	33,95-34,15 vp
	Muu info	Etsi KÜ 39201:004:0179				
Tööde teostaja	OÜ VILKEST					
Liikluskorralduse eest vastutaja	Nimi	Andre Strantsov			Tel. nr	+372 5058739
