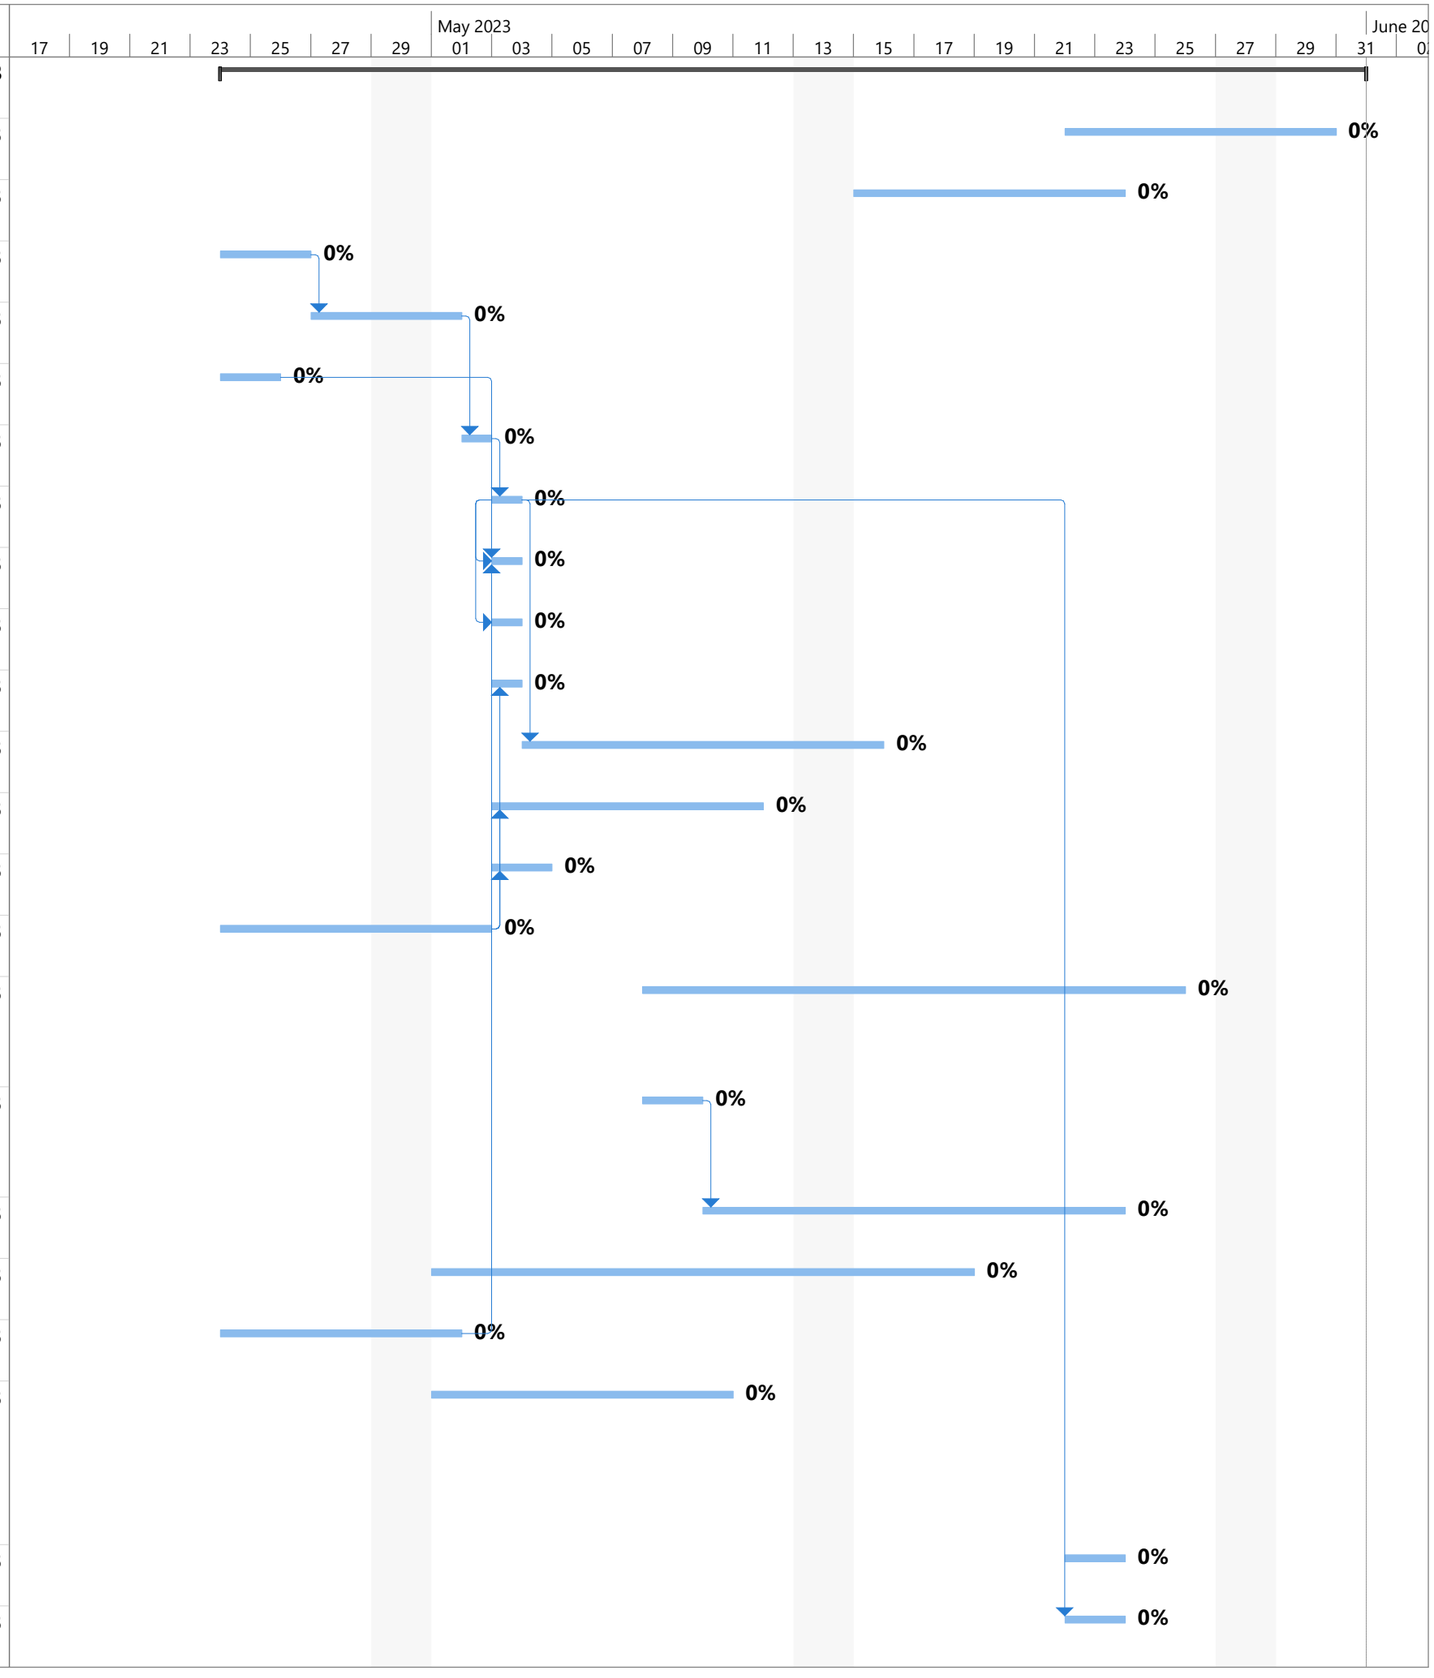ID		Tööde nimetus	Ühik	Maht	Kestus	Algus	Lõpp
1		**Sagadi mõisa parkla**		**0**	**28 d**	**24.04.23**	**31.05.23**
2		Muru taastamine koos aluspinnaga		1508	7 d	22.05.23	30.05.23
3		Magesõstraheki rajamine komplektis		71	7 d	15.05.23	23.05.23
4		Teede ja platside liivalused		2329	3 d	24.04.23	26.04.23
5		Teede ja platside killustikalused		2329	3 d	27.04.23	01.05.23
6		Asfaldist jalgtee liiv ja killustikalused		83	2 d	24.04.23	25.04.23
7		Teede ja platside 1*asfaltbetoonkatend		2246	1 d	02.05.23	02.05.23
8		Teede ja platside 2*asfaltbetoonkatend		2246	1 d	03.05.23	03.05.23
9		Teede ja platside 1* jalgtee asfaltkatend		83	1 d	03.05.23	03.05.23
10		Teede ja platside taastav asfaltkatend		82	1 d	03.05.23	03.05.23
11		Liikluskünnise ehitus		60	1 d	03.05.23	03.05.23
12		Parkla keskel munakivi saared koos ääreki		42	8 d	04.05.23	15.05.23
13		Graniitkividest tee koos sängitusliivaga		212	7 d	03.05.23	11.05.23
14		Metallääris paigaldusega komplektis		165	2 d	03.05.23	04.05.23
15		Graniitäärekivi paigaldusega komplektis		125	7 d	24.04.23	02.05.23
16		Kraavi põhjade erosioonitõkke matt, kivid+ truubi ümbrus		177,5	14 d	08.05.23	25.05.23
17		Ol.oleva kraavi korrastamine puhastus ja tasandamine		55	2 d	08.05.23	09.05.23
18		Ol.oleva kraavi tugiseina taastamine		55	10 d	10.05.23	23.05.23
19		Lasipuu paigaldusega komplektis		178	14 d	01.05.23	18.05.23
20		Betoontrepi rajamine komplektis		10	6 d	24.04.23	01.05.23
21		Kaldtee teraskonstruktsioon ja terarestastmed koos kahepoolse piirdega rajamine komplektis		40	8 d	01.05.23	10.05.23
22		Liiklusmärgd		1	2 d	22.05.23	23.05.23
23		Teekattemärgised		1	2 d	22.05.23	23.05.23
