KOOSKÕLASTATUD
Transpordiamet, Lääne osakond
Alard Tallo - liikluskorraldaja
6. aprill 2026. a.

TINGIMUSED:

1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
4. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
5. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme.
6. Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
7. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
8. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik. Kui laadimist ei toimu, siis vabastada sõidurada ja eemaldada piirangud.
9. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
10. **Metsamaterjali äraveol lähtuda teele kehtestatud piirangutest.**

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.
Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil.

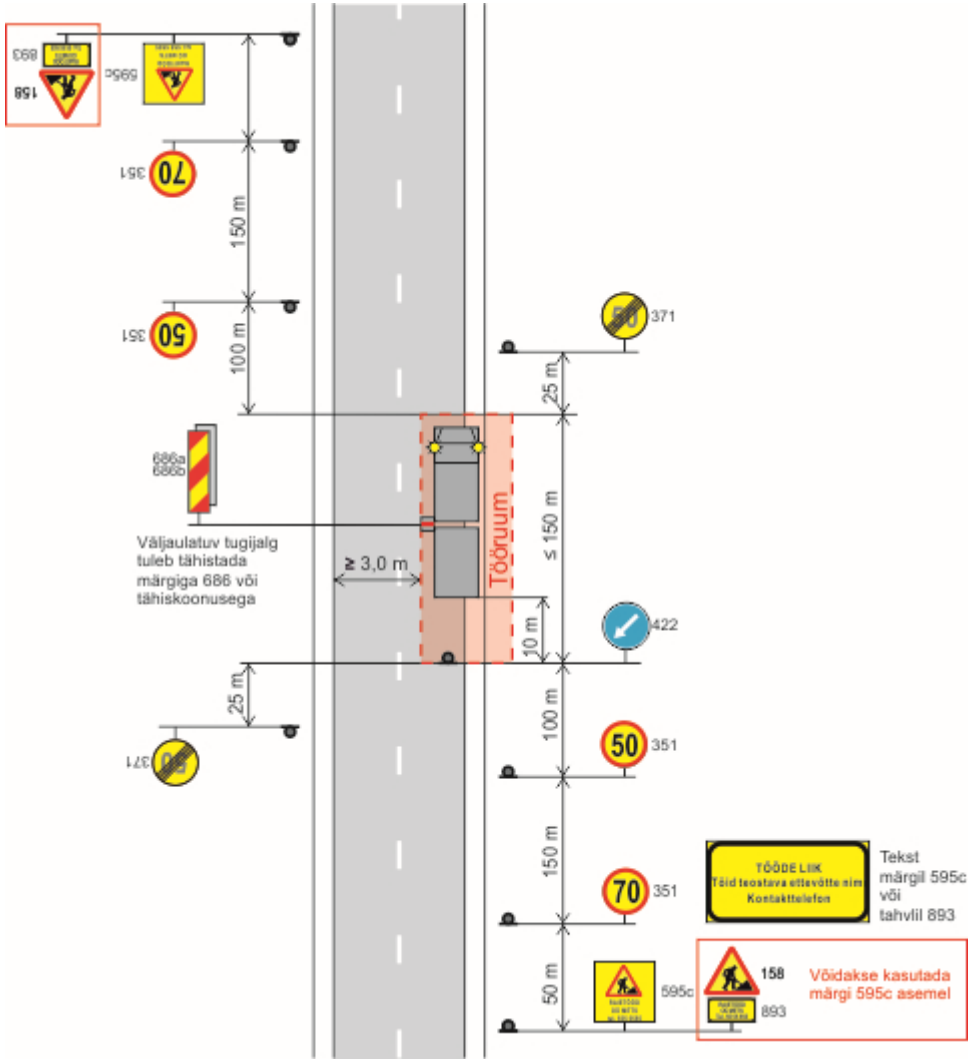

Tüüpjoonis	Metsa laadimistööd – kiirus 90 km/h					Joonis 6-1
Töö nimetus	Metsamaterjali laadimine				Teostamise aeg	09.04.2026-30.10.2026
Tööde asukoht	Tee nr	24125	Tee nimi	Epra – Kildu tee	Km	4,27-4,39 vasak pool
	Muu info	Materjal kinnistult Lestimetsa 87001:001:0672				
Tööde teostaja	As Roger Puit					
Liikluskorralduse eest vastutaja	Nimi	Olger Vorobjov			Tel. nr	56568267
