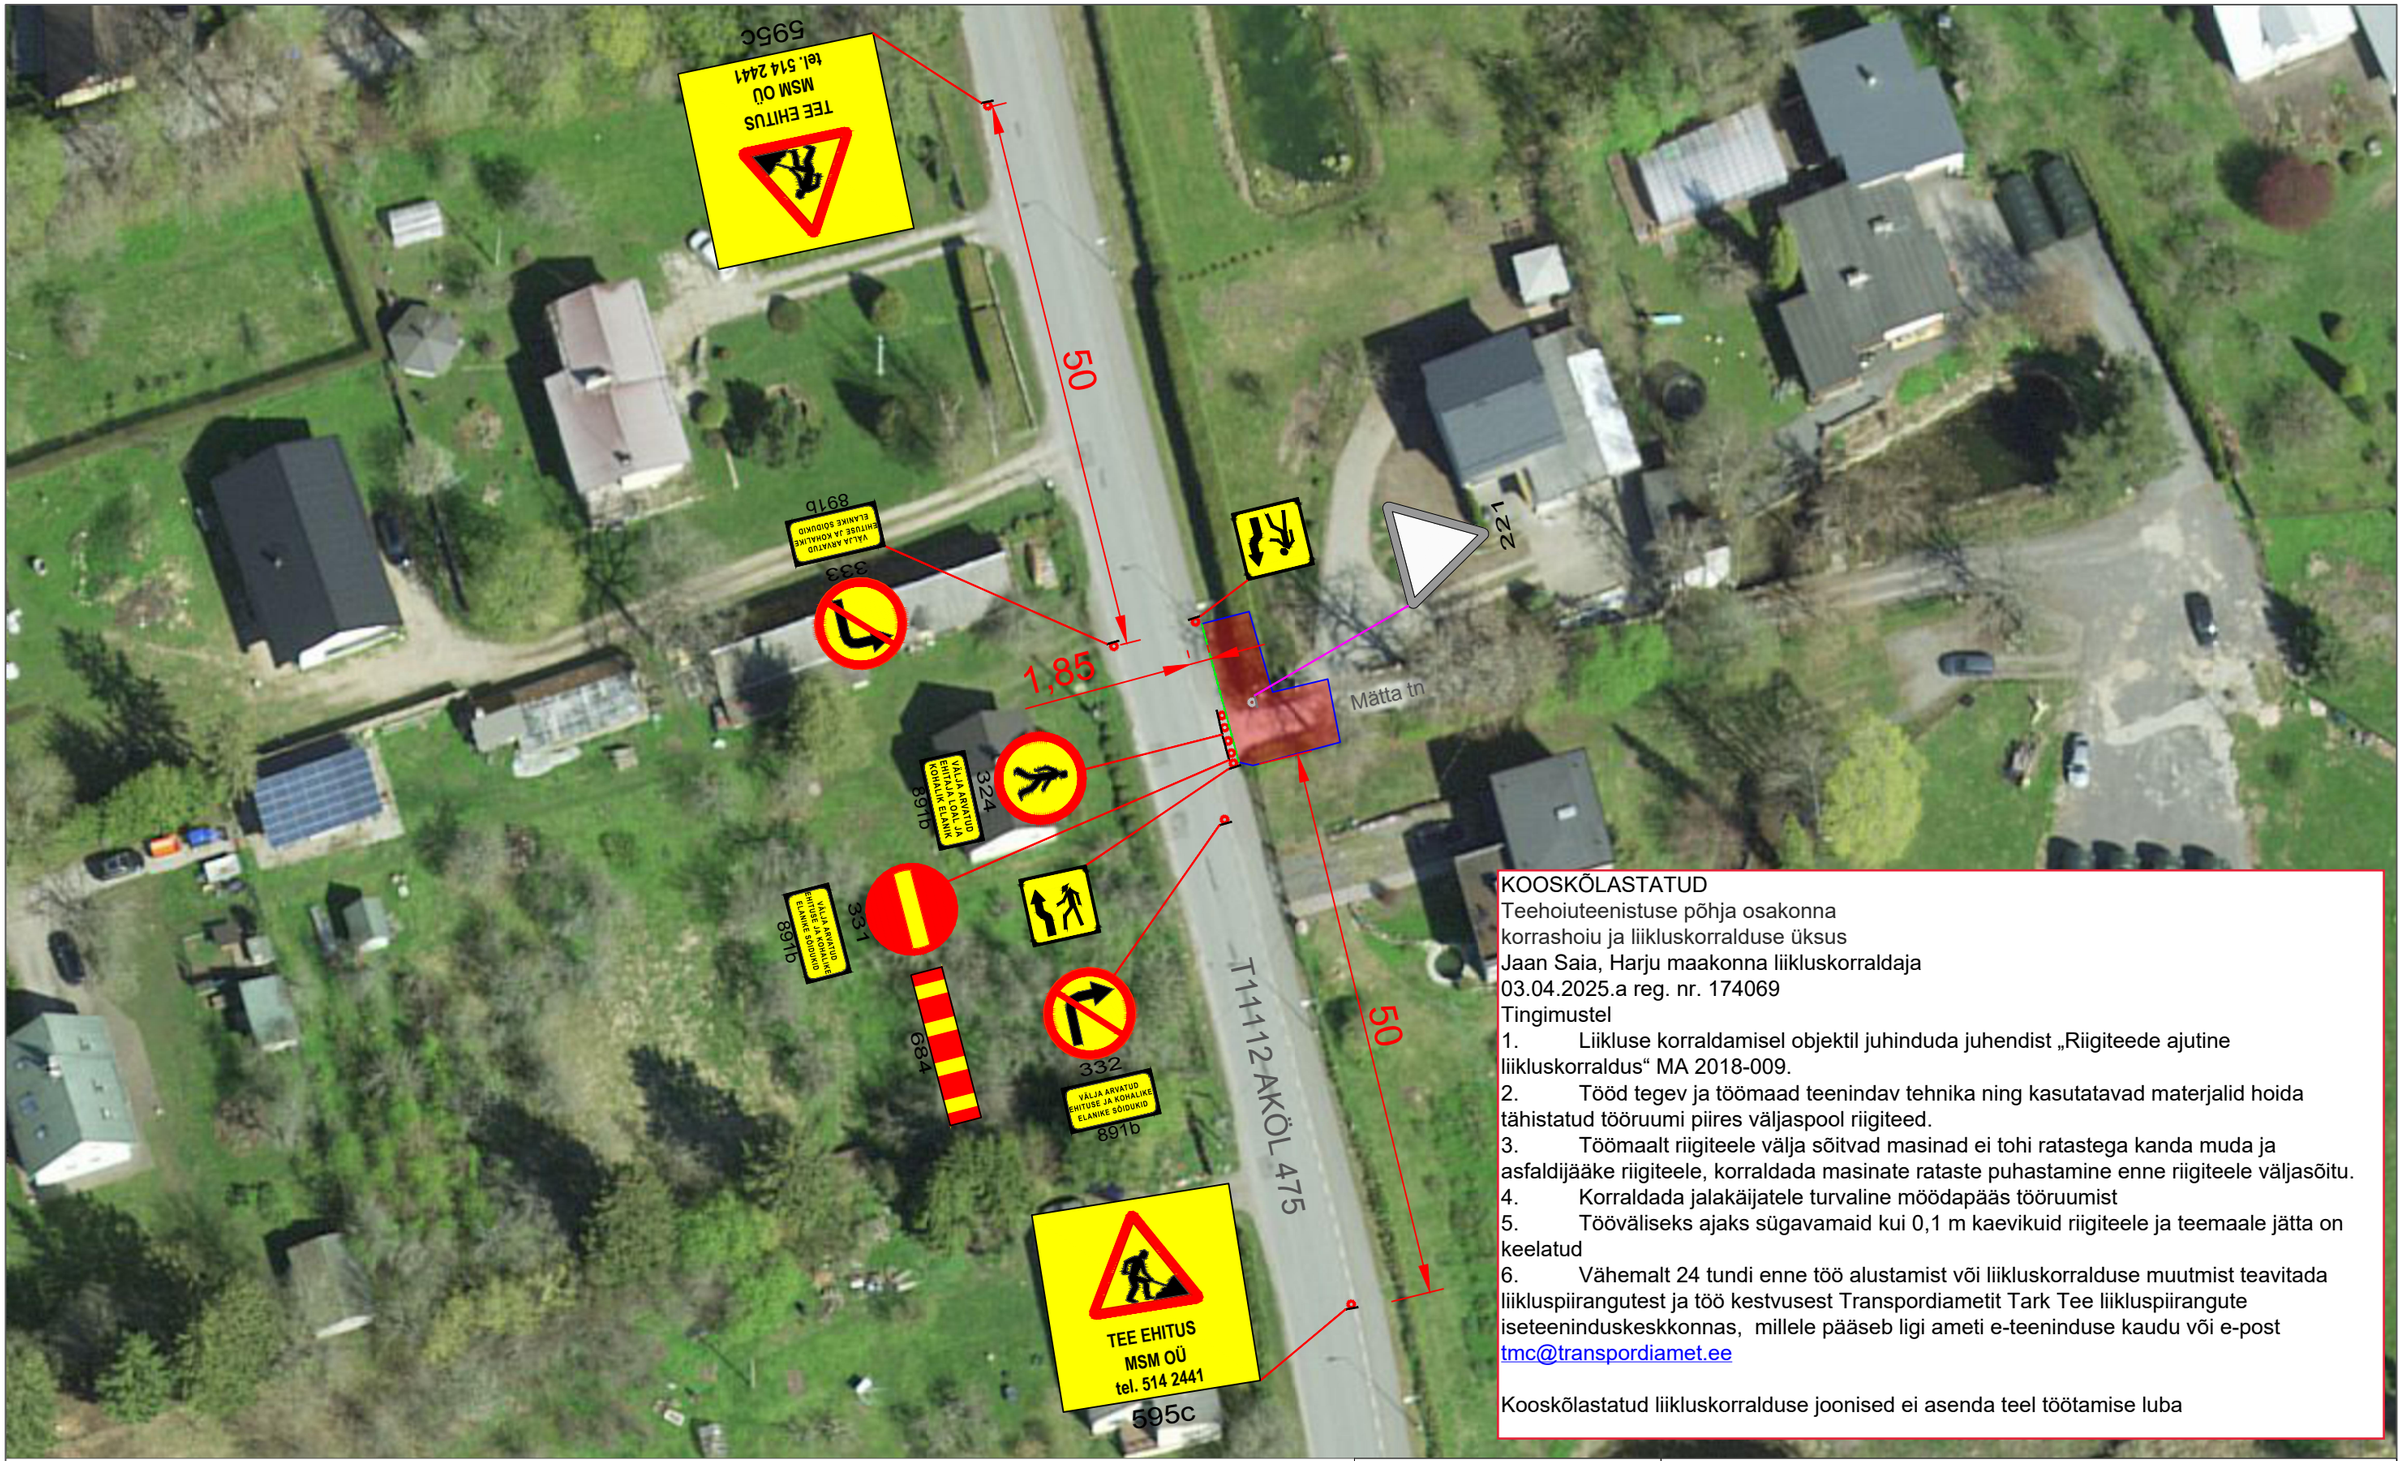

KOOSKÕLASTATUD
Teehoiuteenistuse põhja osakonna
korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja
03.04.2025.a reg. nr. 174069
Tingimustel

1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Tööd tegev ja töömaad teenindav tehnika ning kasutatavad materjalid hoida tähistatud tööruumi piires väljaspool riigiteed.
3. Töömaalt riigiteele välja sõitvad masinad ei tohi ratastega kanda muda ja asfaldijääke riigiteele, korraldada masinate rataste puhastamine enne riigiteele väljasõitu.
4. Korraldada jalakäijatele turvaline möödapääs tööruumist
5. Töövälieks ajaks sügavamaid kui 0,1 m kaevikuid riigiteele ja teemaale jätta on keelatud
6. Vähemalt 24 tundi enne töö alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja töö kestvusest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi ameti e-teeninduse kaudu või e-post tmc@transpordiamet.ee

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel töötamise luba

Tingmärgid:

- 331 Projekteeritud ajutine liiklusmärk
- 331 Statsionaarne liiklusmärk
- Projekteeritud ajutine piirdeaed
- Töötsoon

Märkused:

Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".

1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis kohaliku omavalitsuse liikluskorralduse osakonnaga.
2. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke.
3. Tee asfalteerimise tellija on kinnistu omanik.
4. Läbipääs on õhtuti olemas.

h=75 mm

RPE liikluskorraldus OÜ
Reg.kood: 14723009
Ranna tee 13, Tabasalu 76901, Harjumaa
Tel. +372 646 1616
info@rpe.ee

Kontrollis	V.Lokko 193417
Koostas	J.Tulinova
Kuupäev	27.03.2025

Joonis	Ajutine liikluskorraldus
Projekt	Mätta tänava asfalteerimine
Asukoht	Mätta tn, Lagedi alevik, Rae vald, Harjumaa
Tellija	MSM OÜ

Märkused:	Aluskaart	Töö nr:	Joonise nr:
	Maa-amet	20262	1
