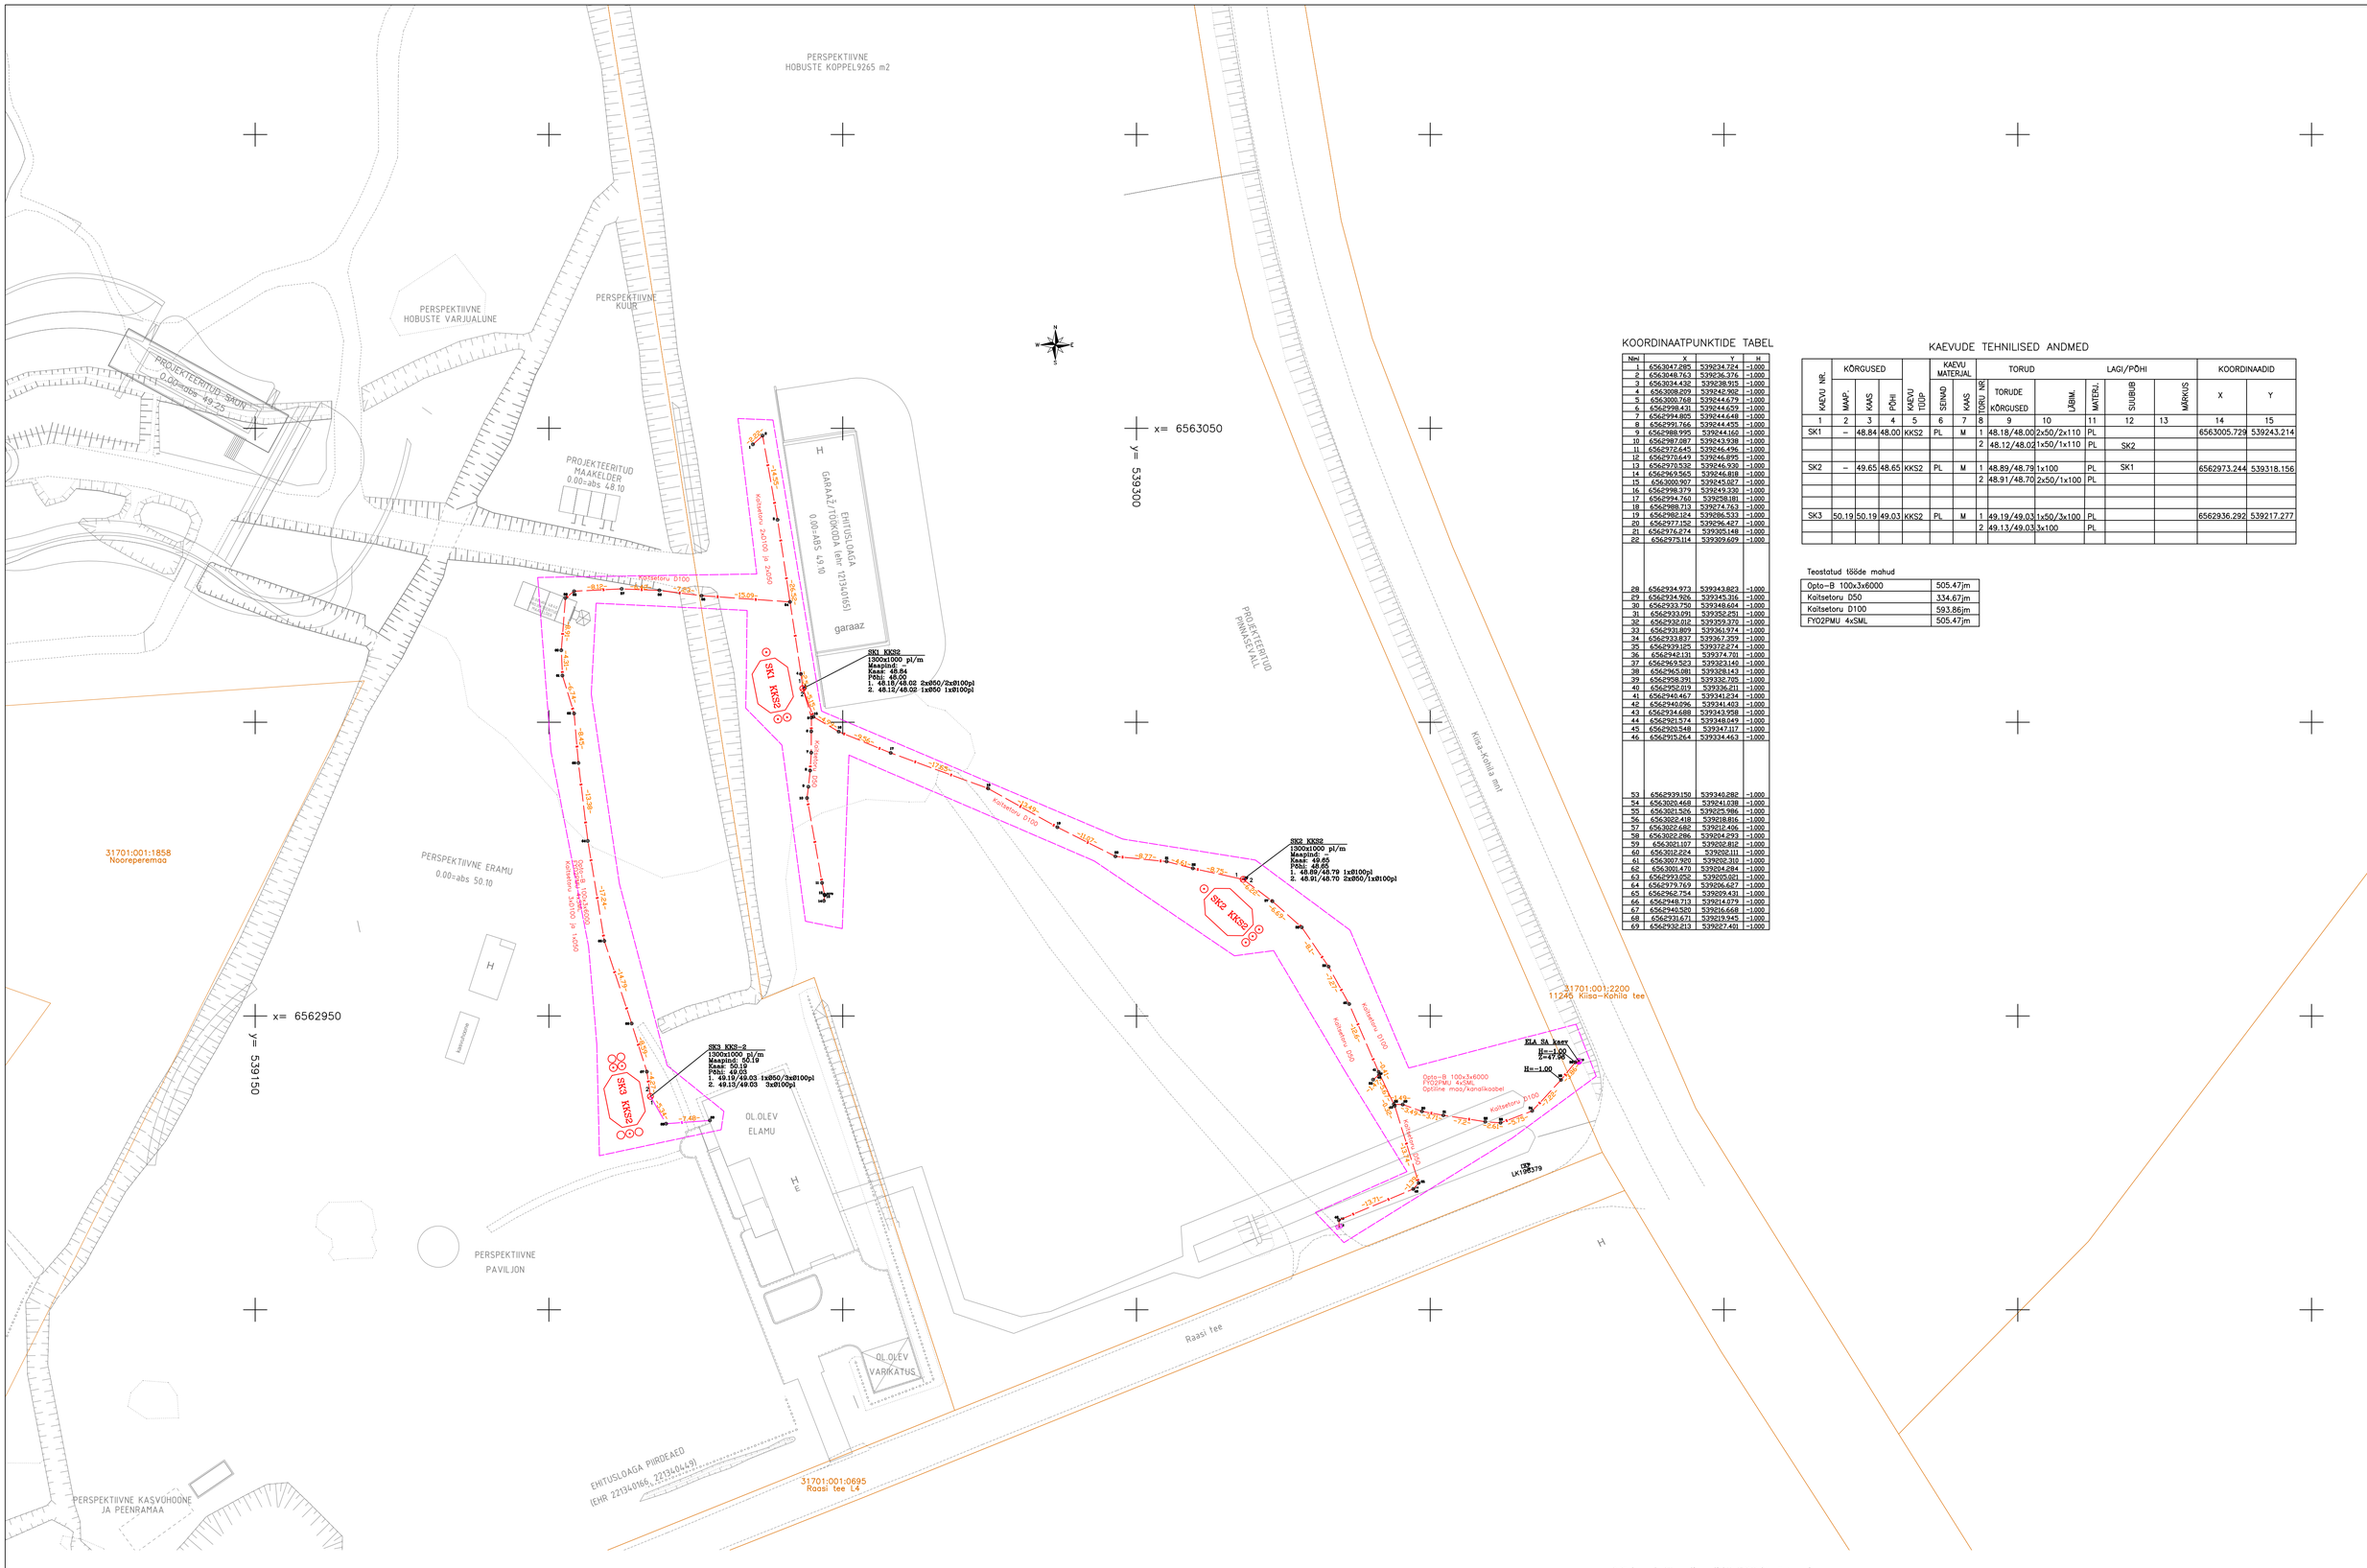

KOORDINAATPUNKTIDE TABEL

Nimi	X	Y	H
1	6563047.285	539234.724	-1.000
2	6563048.763	539236.376	-1.000
3	6563034.432	539238.915	-1.000
4	6563008.209	539242.992	-1.000
5	6563000.768	539244.679	-1.000
6	6562998.431	539244.659	-1.000
7	6562994.805	539244.648	-1.000
8	6562991.766	539244.455	-1.000
9	6562988.995	539244.160	-1.000
10	6562987.087	539243.938	-1.000
11	6562972.645	539246.496	-1.000
12	6562970.649	539246.895	-1.000
13	6562970.532	539246.938	-1.000
14	6562969.565	539246.818	-1.000
15	6563000.907	539245.027	-1.000
16	6562998.379	539249.330	-1.000
17	6562994.760	539258.181	-1.000
18	6562988.713	539274.763	-1.000
19	6562982.124	539286.533	-1.000
20	6562977.152	539296.427	-1.000
21	6562976.274	539305.148	-1.000
22	6562973.114	539309.609	-1.000
28	6562934.973	539343.823	-1.000
29	6562934.926	539345.316	-1.000
30	6562933.750	539348.604	-1.000
31	6562933.091	539350.251	-1.000
32	6562932.012	539353.370	-1.000
33	6562931.809	539361.974	-1.000
34	6562933.837	539367.359	-1.000
35	6562939.125	539372.274	-1.000
36	6562942.131	539374.701	-1.000
37	6562969.523	539323.149	-1.000
38	6562965.081	539308.143	-1.000
39	6562958.391	539332.705	-1.000
40	6562952.019	539336.211	-1.000
41	6562945.467	539341.234	-1.000
42	6562940.096	539341.403	-1.000
43	6562934.688	539343.958	-1.000
44	6562921.574	539348.049	-1.000
45	6562920.548	539347.117	-1.000
46	6562915.264	539334.463	-1.000
53	6562939.150	539340.282	-1.000
54	6563020.468	539241.038	-1.000
55	6563021.526	539225.986	-1.000
56	6563022.418	539218.816	-1.000
57	6563022.682	539212.406	-1.000
58	6563022.286	539204.293	-1.000
59	6563021.107	539202.812	-1.000
60	6563012.224	539202.111	-1.000
61	6563007.301	539202.310	-1.000
62	6563001.470	539204.284	-1.000
63	6562993.052	539205.521	-1.000
64	6562979.769	539206.627	-1.000
65	6562962.734	539209.431	-1.000
66	6562948.713	539214.079	-1.000
67	6562940.520	539216.668	-1.000
68	6562931.671	539219.945	-1.000
69	6562932.213	539227.401	-1.000

KAEVUDE TEHNILISED ANDMED

KAEVU NR.	KÕRGUSED			KAEVU TÜÜP	KAEVU MATERJAL		TORUD		LAGI/PÕHI				KOORDINAADID	
	MAAP.	KAAS	PÕHI		SEINAD	KAAS	TORU NR	TORUDE KÕRGUSED	LÄBIM.	MATERJ.	SUUBUR	MÄRKUS	X	Y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SK1	–	48.84	48.00	KKS2	PL	M	1	48.18/48.00	2x50/2x110	PL			6563005.729	539243.214
							2	48.12/48.02	1x50/1x110	PL	SK2			
SK2	–	49.65	48.65	KKS2	PL	M	1	48.89/48.79	1x100	PL	SK1		6562973.244	539318.156
							2	48.91/48.70	2x50/1x100	PL				
SK3	50.19	50.19	49.03	KKS2	PL	M	1	49.19/49.03	1x50/3x100	PL			6562936.292	539217.277
							2	49.13/49.03	3x100	PL				

Teostatud tööde mahud

Opto-B 100x3x6000	505.47jm
Kaitsetoru D50	334.67jm
Kaitsetoru D100	593.86jm
FYO2PMU 4xSML	505.47jm

Märkused: Koordinaadid L-EST 97 süsteemis.
Kõrgused EH2000 süsteemis.

FIRMA	RAXOEST OÜ ♦ GEODEETILISED TÖÖD ♦ info@raxoest.ee GSM + 372 53 477 138 www.raxoest.ee GSM + 372 51 51 269 LITSENTSID: ED-G000080	TELLIJA	Endcel OÜ
		TÖÖ	TEOSTUSMÕÕDISTUS
		OBJEKT	Raasi ja Raasiaia kinnistu elamukompleks Aespa alevik, Kohila vald, Rapla maakond
	Lõuendmaterjal tarkvara Autodesk Civil 3D 2013		
MÕÕT.	K.RANNAMETS Ehr-geodeet 8	JOON.	P.VÄLISTE
KONTR.	A.RAHN Ehr-geodeet 7	JOONISE NIMI	**Sidekaabelduse teostusjoonis**
KUUP	26.05.2022	KUUP	09.06.2022
KUUP	09.06.2022	MÕÕTKAVA	1:500
JOONISE NR.	1/1	TÖÖ NR.	EH-95-21
		REV.	0
