TRANSPORDIAMET

OÜ Esprii
mikk@esprii.ee
Kaisla 3
13516, Tallinn, Harju maakond

Teie 25.09.2026

Meie 23.10.2026 nr 7.1-2/26/3732-7


Raasiku aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitustööde järgselt riigiteede taastamisest

Raasiku aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kasutusloa taotluste nr 2511371/26855 ja nr 2511371/24466 kooskõlastamise ja korrastatud teemaa vastuvõtu käigus tuvastas Transpordiamet, et riigitee nr 11310 Aruvalla-Jägala tee km 22,73–22,85, km 22,78, km 22,90, km 23,04 ja km 23,15 ning riigitee nr 11316 Raasiku jaama tee km 1,47–1,64 (vt joonis 1) pole ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitustööde järgselt taastatud vastavalt tehnovõrgu omaniku OÜ Raven ja Transpordiameti vahel sõlmitud lepingute nr 7.1-1255464-1 ja nr 7.1-1/24/20647-1 aluseks olevatele ja Transpordiameti poolt kooskõlastatud katete taastamise projektidele.

Riigitee nr 11310 Aruvalla-Jägala tee oli ettenähtud taastada vastavalt põhiprojektile *„Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku alevik Raasiku reoveekogumisala kirdeosa ÜVK projekteerimis-ehitustööde katete taastamise projekt“* (OÜ Esprii, töö nr 25001).

Riigitee nr 11316 Raasiku jaama tee oli ettenähtud taastada vastavalt põhiprojektile *„Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku alevik Raasiku aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööde, OSA II katete taastamise projekt“* (OÜ Esprii, töö nr 24016).

Tulenevalt eeltoodust jättis Transpordiamet kasutusloa taotlused kooskõlastamata ja ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitustööde järgselt korrastatud teemaa vastu võtmata ning palus teostada riigiteede taastamise vastavalt lepingu aluseks olevatele projektidele.

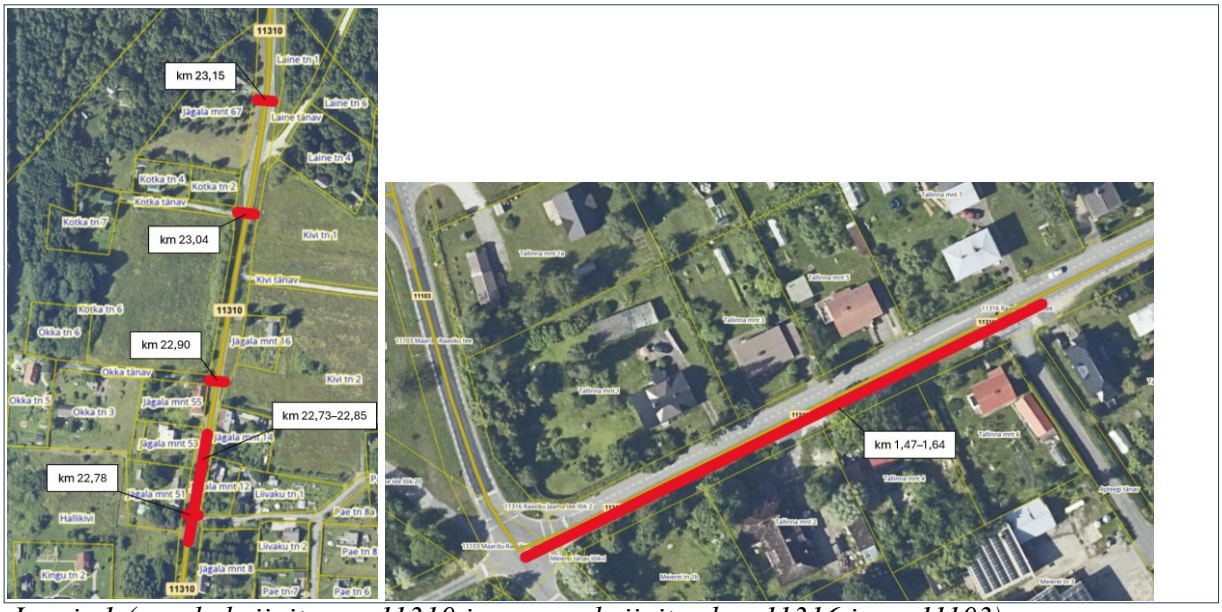

Joonis 1 (vasakul riigitee nr 11310 ja paremal riigiteed nr 11316 ja nr 11103)

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitustööde järgselt teostatud taastamise ümberehitamiseks esitasite 25.09.2026 e-kirjaga Transpordiametile seisukoha andmiseks vastavad asendiplaanid ja ristlõike joonised.

Edastatud riigiteede katete taastamistööde mahud pole piisavad, mistõttu palume täiendada jooniseid järgmiselt:

Töö nr 25001 – **riigitee nr 11310 Aruvalla-Jägala tee** tuleb lahti kaevata ja uuesti taastada:


- km 22,73–22,85 (riigiteega külgneva kaeviku taastamine);
- km 22,78 (riigiteega ristuva kaeviku taastamine);
- km 22,90 (riigiteega ristuva kaeviku taastamine);
- km 23,04 (riigiteega ristuva kaeviku taastamine);
- km 23,15 (riigiteega ristuva kaeviku taastamine).

Töö nr 24016 – **riigitee nr 11316 Raasiku jaama tee** tuleb lahti kaevata ja uuesti taastada

- km 1,47–1,64 (riigiteega külgneva kaeviku taastamine)


Riigitee nr 11310 pindamine teostada vastavalt lepingu järgse projekti seletuskirja punktis 4.9 toodud pindamisjuhisele. Pindamine teostada kogu sõidutee laiuses ja riigiteega ristivuugist min 2 m ülekattega.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitustööde järgse katete taastamise ümberehitamise töömahtude piir tee lahti kaevamisel võib olla <u>esialgselt projekteeritud torustikest</u> maksimaalselt 1 m kõrgemal (vt joonis 2). Sellest ülespoole jääva taastamise töömahtude piir peab järgima <u>lepingute järgset projektlahendust</u>. Antud põhimõte kehtib ka riigiteega ristuva kaeviku taastamisel.

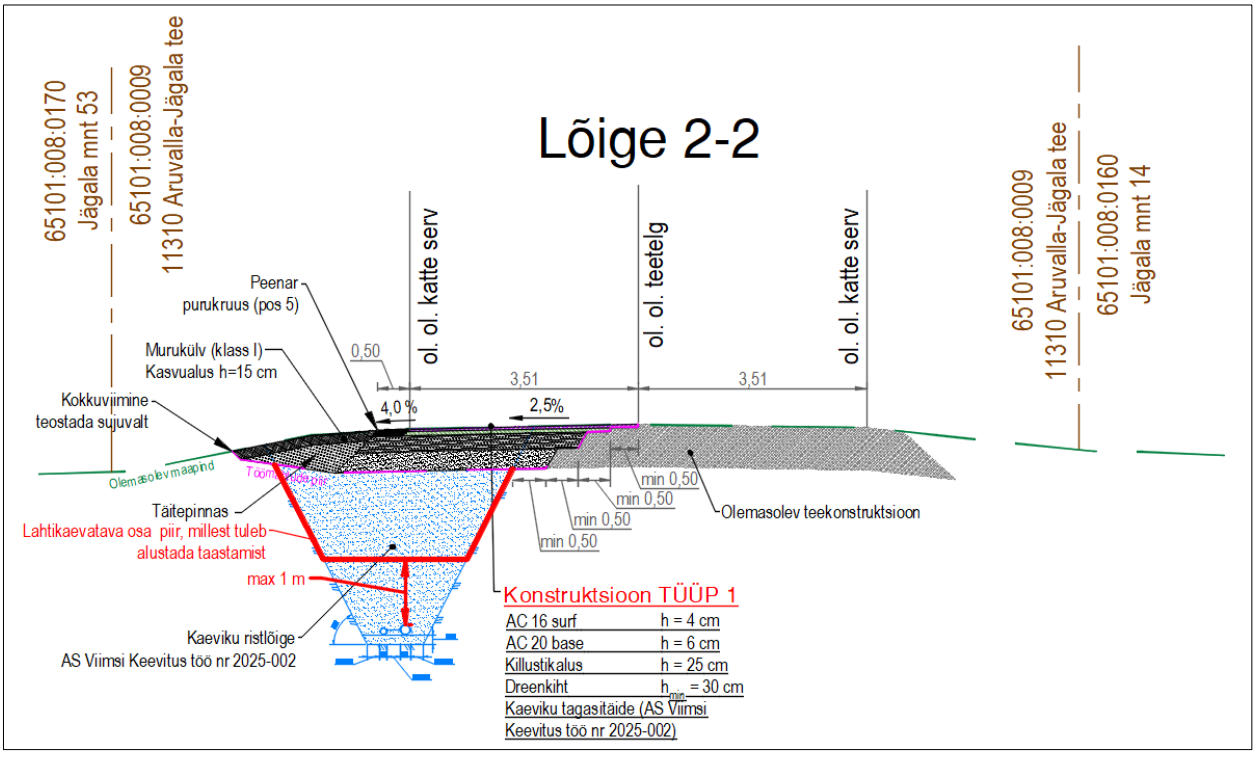

Joonis 2

Transpordiametile pole hetkel teada, kuidas on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitustööde järgselt taastatud riigiteede nr 11316 ja nr 11103 ristmik ning riigitee nr 11316 km 1,47 Tallinna mnt 7 (65101:007:2610) poolne puurimiskaevik (vt joonis 3), mistõttu palume esitada fotod antud asukohtades ehitustööde teostamisest ja katete taastamisest.

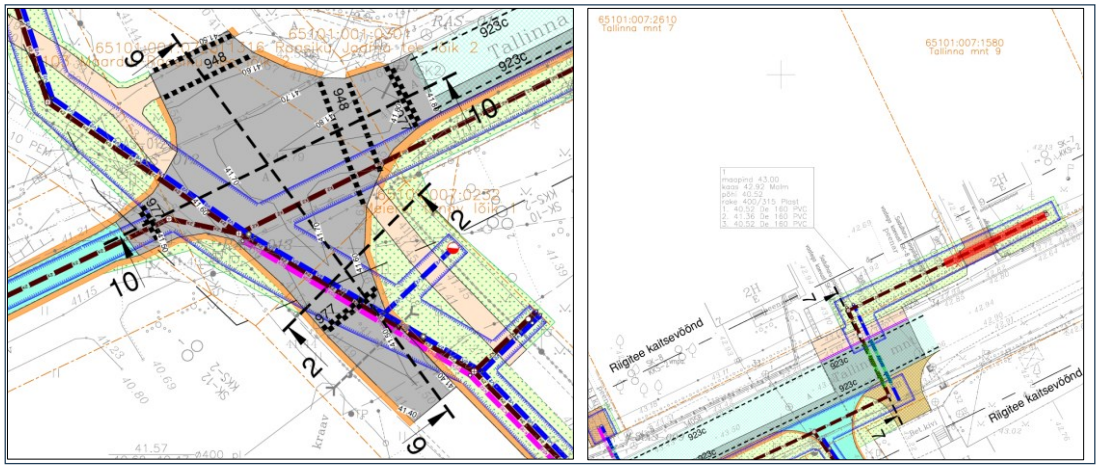

Joonis 3

Juhul, kui antud asukohtades pole riigiteed samuti taastatud Transpordiameti poolt kooskõlastatud projekti kohaselt, siis palume teostada ka antud asukohtades riigitee taastamine vastavalt eelpool märgitud tingimustel.

Käesolev otsus jõustub teatavakstegemisest ja selle peale on võimalik esitada vaie Transpordiametile haldusmenetluse seaduses või kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: OÜ Esprii, töö nr 25001, joonis TL-4-01_M04
OÜ Esprii, töö nr 24016, joonis TL-4-01_M02

Lisaadressaadid: Raven OÜ
AS Viimsi Keevitus

Annika Matson
54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee

Arvo Veltri
5164006, Arvo.Veltri@transpordiamet.ee
