


Töö number: 2022_0067
Tellija Regionaal- ja põllumajandusministeerium
Konsultant Skepast&Puhkim OÜ
Laki põik 2, 12915 Tallinn
Telefon: +372 664 5808; e-post: info@skpk.ee
Registrikood: 11255795;

Kuupäev 16.08.2023

Haljala-Kukruse 2+2 maantee riigi eriplaneering ja selle elluviimisega kaasnevate mõjude hindamine

Asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja mõjude hindamise, sh KSH programm

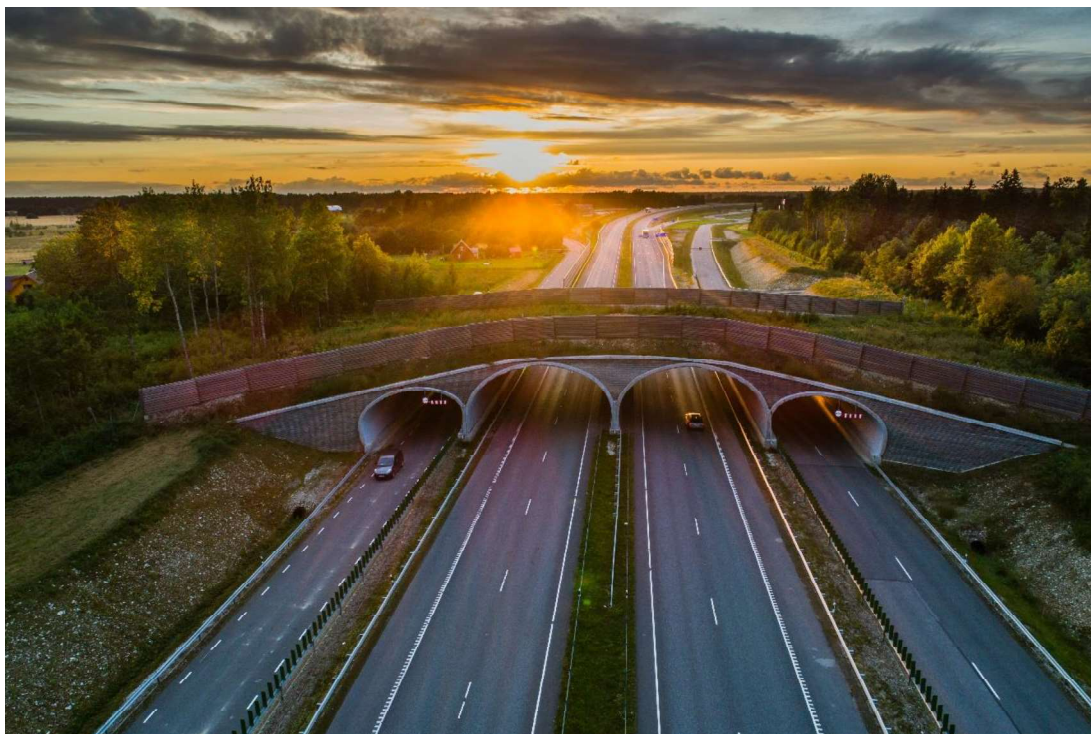

6. Planeeringu koostamise korraldamine

6.1. Ajakava

REP asukoha eelvaliku LS ja mõjude hindamise, sh KSH programmi ajakava on koostatud lähtuvalt planeerimisseaduses toodud menetlustähtaegadest, uuringute ja alusanalüüside koostamiseks vajaminevast ajast ning uuringute omavahelistest seostest, eskiislahenduste koostamiseks vajalikust sisendist ja selle laekumise ajast ning Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kui planeeringu koostamise korraldaja töökorraldusest.

REP teise etapi ehk detailse lahenduse koostamise ajakava on indikatiivsena kirjeldatud, kuid detailne ajakava koostatakse REP asukoha eelvaliku etapi aruande osana.

Ajakavas võib töö käigus tulla muudatusi, lähtuvalt edasise menetluse käigust, sh koostöö ja kaasamise tulemuslikkusest, hangete läbiviimise kiirusest, uuringute tulemustest jmt. Ajakava on seetõttu indikatiivne ning edasise planeeringu koostamise käigus tuleb olla valmis muudatuste sisseviimiseks, kui see kvaliteetsema lõpptulemuse jaoks vajalikuks osutub.

ETAPP	TEGEVUS	LÄBIVIIMISE AEG	VASTUTAJA
LS ja mõjude hindamise programmi koostamine	LS ja mõjude hindamise programmi avalik väljapanek	veebruär-märts 2023	Rahandusministeerium
	LS ja mõjude hindamise programmi avalikud arutelud	Märts-aprill 2023	Rahandusministeerium
	LS ja mõjude hindamise programmi täiendamine avalikustamise tulemusel	aprill-mai 2023	Rahandusministeerium, konsultant
	LS ja mõjude hindamise programmi avalikustamine Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kodulehel	august 2023	Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Asukoha eelvalik, sh eskiisprojekti koostamine	Asukoha eelvaliku koostamise ja mõjude hindamise esimese etapi läbiviimise hanke ettevalmistamine ja läbiviimine	August - detsember 2023	Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
	Olemasoleva koridori sobivusanalüüs, esialgsete trassialternatiivide visandamine, kaardirakenduse loomine ja kinnistuomanike personaalne teavitamine	Jaanuar 2024 – juuni 2024	Konsultant, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
	Trassialternatiivide võrdlusmetoodika detailne koostamine lähtuvalt LS ja mõjude hindamise programmis sätestatust	Mai – juuni 2024	Konsultant, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
	Uuringute ja alusanalüüside läbiviimine	Jaanuar 2024–vebruar 2025	Uuringute läbiviijad, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

ETAPP	TEGEVUS	LÄBIVIIMISE AEG	VASTUTAJA
	Trassialternatiivide võrdluse ja mõjude hindamise esimese etapi aruande koostamine	september 2024 – veebruar 2025 ⁷⁶	Konsultant, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
	Trassialternatiivide võrdluse ja mõjude hindamise avalik väljapanek ja arutelud	märts 2025 – mai 2025	Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
	Asukohavaliku ja mõjude hindamise esimese etapi aruande täiendamine avalikustamise tulemustest lähtuvalt ning eskiisprojekti täpsustamine (vajadusel täiendav koostöö kohalike elanikega)	mai 2025 – oktoober 2025	Konsultant
	Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja REP esimese etapi mõjude hindamise aruande kooskõlastamine	oktoober 2025 – november 2025	Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
	Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja REP esimese etapi mõjude hindamise aruande avalik väljapanek ja arutelud	detsember 2025 – märts 2026	Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
	Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja REP esimese etapi mõjude hindamise aruande vastuvõtmine	II kvartal 2026	Vabariigi Valitsus
Detailse lahenduse, sh eelprojekti koostamine	Detailse lahenduse koostamise ja mõjude hindamise läbiviimise hanke ettevalmistamine ja läbiviimine	III kvartal 2026	Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
	Detailse lahenduse koostamine	2026 – 2028	konsultant, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
	Riigi eriplaneeringu kehtestamine	2028	Vabariigi Valitsus

6.2. Kaasamine ja koostöö

Järgnevalt on toodud REP asukoha eelvalikuga seotud asutused ning puudutatud ja huvitatud isikud, keda koostatava REP alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi Haljala-Kukruse 2+2 ristlõikega maantee rajamise ning selle mõjude vastu.

Osapoolte nimekiri täpsustub planeeringu koostamise käigus, sh täiendavate käsitlemist vajavate teemade tekkimisel. Kaasatavate nimekirja laienemine ning kaasamise viiside valik peab olema protsessi käigus paindlik ning sõltuma küsimustest, mis tekivad kaasatavatel või küsimustest, mis vajavad protsessi käigus ka koostajate poolt vastuseid, sh kohalike oludega arvestamine ning kohalike vajadustega arvestamine.

⁷⁶ Trassialternatiivide võrdluse läbiviimine sõltub uuringu tulemuste saabumisest.
