

From: "Janek Tarto | RMK" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 1/30/2026 12:10:36 PM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: FW: Tööd

Lisa DHS lepingu juurde.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



From: Janek Tarto | RMK <janek.tarto@rmk.ee>

Sent: Friday, January 30, 2026 2:10 PM

To: Raiekoda OÜ <moorioru@gmail.com>

Cc: Karel Kaja <karel.kaja@rmk.ee>

Subject: FW: Tööd

Lugupeetud Ivo Piirits

Juhime tähelepanu, et poolte vahel sõlmitud lepingu nr 3-2.5.3/1814/2025/310 ning selle Lisa 1/1, tööajagraafiku kohaselt on Töövõtja kohustatud teostama töid mahus 10 ha jaanuaris ja 10 ha veebruaris.

Meie poolt algselt koostatud tööajagraafiku tegime 08.01.2026 seisuga Teie soovidest ja võimekusest lähtuvalt ümber.


Tööliik	jaan	veebr	märts	apr	mai	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dets	KOKKU
MUH						5		10	20	20	10		65
VA	10	10	15	10		10	15				5	10	85
KOKKU	10	10	15	10		15	15	10	20	20	15	10	150

Tänase seisuga so. 30.01.26 on Töövõtja poolt teostatud töid 2,95 ha, mis tähendab tööajagraafiku olulist maha jäämust.

Töövõtja	Lepingu nr	Planeeritud MUH (ha)	Vastuvõetud MUH (ha)	Täitmise % plaanist MUH	Planeeritud NOH (ha)	Vastuvõetud NOH (ha)	Täitmise % plaanist NOH	Kokku planeeritud (ha)	Kokku täidetud (ha)	Kol täitmi: 9
Raiekoda OÜ	3-2.5.3/2025/310 VA	65	0	0	85	2,95	3,47	150	2,95	

Tänase seisuga on Teile üle antud koos veebruari mahuga, 17,8 ha võsasetaid.

Töövõtja viide võimalikele ilmastikutingimustele või tööde edasilükkamisele ei vabasta Töövõtjat lepinguliste kohustuste täitmisest ega anna õigust tööde peatamiseks või edasilükkamiseks.

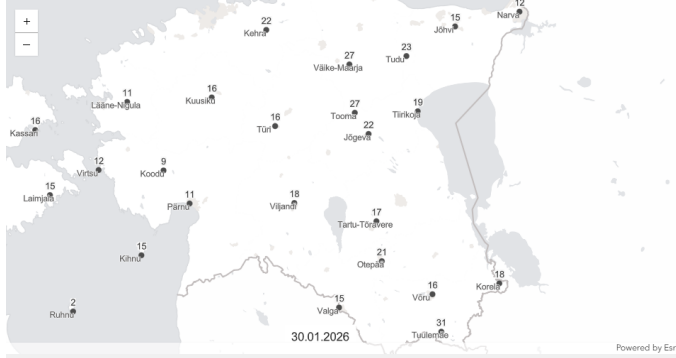

Juhul kui lähima Keskkonnaagentuuri mõõtepunkti andmetel on lumekatte paksus üle 30cm, arvestab Tellija tööajagraafikust maha jäämist vaid tingimusel, et Töövõtja on asjaoludest Tellijat kirjalikult teavitanud.

Tuletame meelde, et vastavalt lepingule nr 3-2.5.3/1814/2025/310 on Töövõtja kohustatud täitma töid kokkulepitud tähtaegadel ning Tellijal on tööajagraafiku rikkumise korral õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsvahendeid.

- leppetrahi rakendamine,
- lepingu erakorraline ülesütlemine.

13.3 Juhul, kui Töövõtja ei lõpeta tööd töö üleandmisel ettenähtud tähtajaks on Tellijal õigus nõuda leppetrahi metsauenduse hooldamise tööde korral 120 €/ha ja teiste tööde korral 200 €/ha iga tegemata hektari ulatuses. Samuti on Tellijal õigus vähendada tegemata töö mahu võrra Lepingu mahtu või Leping ennetähtaegselt üles öelda. Lepingu ennetähtaegsel ülesütlemise korral või lepingu mahu vähendamise korral on Tellijal õigus anda töö teisele tegijale ja Töövõtjal ei ole õigust nõuda Tellijalt tasu seni tehtud tööde osas.

Loodame, et leiate võimaluse olukorra lahendamiseks ning senine koostöö saab jätkuda vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



From: Karel Kaja <karel.kaja@rmk.ee>
Sent: Friday, January 30, 2026 10:26 AM
To: Janek Tarto | RMK <janek.tarto@rmk.ee>
Subject: Fw: Tööd

From: Ivo Piirits <mooriou@gmail.com>
Sent: Thursday, January 29, 2026 8:31:35 PM
To: Karel Kaja <karel.kaja@rmk.ee>
Subject: Tööd

Tere

Vaatasin et oled mulle ohtralt lisanud veel tööd. Ei hakka praegu kiirustama, veebruaris lubatakse lund, võib juhtuda et metsa ma ei lähegi. Aga tähtajad liiguvad, seega oleks vast mõttekam mõned objektid maha võtta.

Tervitustega Ivo
