



Riigihange nr 277757

Kaitseliidu vabatahtlike infoportaali ja väljaõppe infosüsteemi arendustööde hankimine

## PAKKUMUS

20.04.2024

Käesolevas dokumendis on toodud Kaitseliidu väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke nr 277757 „Kaitseliidu vabatahtlike infoportaali ja väljaõppe infosüsteemi arendustööde hankimine“ raames ning Kaitseliidu (edaspidi Hankija) ning Finestmedia AS (edaspidi Pakkuja) vaheliste läbirääkimiste tulemusena kokku lepitud tööde teostamise lepingu eelnõu, projektiplaan ja peamised riskid.

Vastavalt riigihanke alusdokumendis toodud punktile 3 on pidanud Hankija ja Pakkuja pakkumuse esitamise eelselt hankemenetluse jooksul läbirääkimisi hankelepingu esemeks olevate tööde sisu ja mahu osas, hankelepingu tingimuste osas, sh tööde teostamise maksumuse osas.

Projekti tegevusi viiakse ellu agiilse arendusmetoodikaga Scrum 2-nädalaste sprintidega. Projektiplaanis tegevuste alguskuupäev on sõltuvuses hankelepingu sõlmimise ajahetkest (pakkumuses on tinglikult arvestatud lepingu sõlmimiseks 29.04.2024) ning sellest lähtuvalt on projekti lõpp 18.09.2024 (arvestusega Pakkuja puhkusteks 2 nädalat ja 2 nädalat puhvriks).


	Vastutav osapool	Tarne / lõpp kuupäev	Töömaht	Maksumus*
Sprint 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11	Finestmedia	03.05.2024	1727h	112 255.00€
Sprint 6.12	Finestmedia	20.05.2024	222h	14 430.00€
Sprint 6.13	Finestmedia	03.06.2024	239h	15 535.00€
Sprint 6.14	Finestmedia	28.06.2024	315h	20 475.00€
Turva- ja jõudlustestimine	Kaitseliit	26.07.2024		
Sprint 6.15	Finestmedia	09.08.2024	236h	15 340.00€
Sprint 6.16	Finestmedia	04.09.2024	222h	14 430.00€
Vastuvõtutestimine ja reliisimine (sh puhver)	Kaitseliit	18.09.2024		
<b>Kokku</b>			<b>2961h</b>	<b>192 465.00€</b>

\* Kõikidele summadele lisandub käibemaks selle kehtivas määras.

Pakkumuse osaks on käesolevas dokumendis:

- Lisa 1. Hankija poolt hangitavate tegevuste detailne jaotus projekti etappidesse koos tööde mahtudega (Projektiplaan)
- Lisa 2. Projekti peamised riskid ning nende leevendusmeetmed
- Lisa 3. Hankelepingu eelnõu ja selle lisad

Lisa 1. Projektiplaani tegevuste jaotus

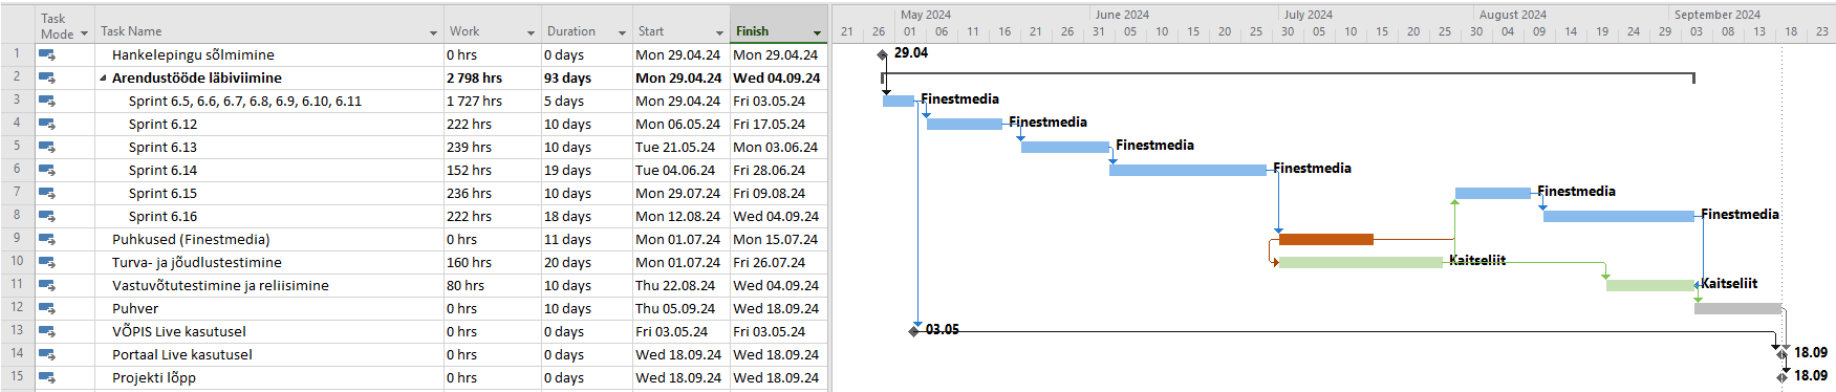

Sprint 6.5:

ID	Pealkiri	Prio	Kokku
5316	FM testkeskkonna püstitamine	1	6
5273	KLASyncro.cs: kui isikukoodi järgi ei leia isikut, siis tekib null reference error	1	6
5341	Kontrollid ja korda teha Internal migratsioon	1	6
	Liitumistaotluse andmed KLASse: aadress; Isikukoodi väljaandja. Modali täiendamine	1	38
5320	Lisada Permisson ja Permssiongroup tekitemine Migratsioonile	1	6
5279	Mallide custom fieldide editor pisut imelik UX	1	6
5241	Minu profiil > Isiklikud andmed > kontaktisikud API päringud - Isikukood ei ole kohustuslik	1	6
4833	Portaali avalik vaade: avalikud sündmuste nimekiri	1	6
5366	Tarne (Sprint7)	1	6
5274	Tehniline viga uudise avamisel: (PortalNews/GetPortalNewsDetail) v.1.4.07	1	6
5358	Vabatahtlik ei näe palgalisi kontaktide nimekirjas	1	6
5313	Vabatahtlik pealik: kuvada KLA andmete juurde abiteksti	1	6
5298	Võpis Live - sündmustel osalemise vaade ei tööta	1	6
5351	VÕPISe monitooring prometheuse abil - load test ettevalmistus	1	6

5280	WYSIWYG editori toolbar üle ääre väiksema ekraani laiuse puhul	1	6
5250	CI seadistamine TEST Keskkonnas	1	6

#### Sprint 6.6:

ID	Pealkiri	Prio	Kokku
5394	Tarne (Sprint6)	1	6
	API „end-pointide“ automaattestide korrastamine	1	19
5361	Eemaldada SFi ja rahastuse logod	1	6
4400	KLA andmed toimingute logis	1	6
4759	Klassifikaatorite gruppide nimed	1	6
	Koondsündmused	1	38
5319	Lisada Unique INDEX UserRolePermissionGroups	1	6
5328	Live baasi koopia edastamise protsess	1	6
5343	Luuu ühtne koodistiil	1	6
5287	Menetlusprotsessi täiendavate isikute lisamise modaali dropdown list kuvab otsingu tulemusi vales kohas	1	6
5344	Olemasolev kood formeerida stiili järgi	1	6
5389	Portaal autentimise hõlbustamine koormustestide jaoks	1	6
5376	Skript kasutajate loomiseks	1	6
	Sündmused: kinnitaja, ajalugu, muutmise teade; järjestamine	1	51
5255	Taotluse menetlemisel vale tekst	1	6
5377	Teise kasutaja rolli võtmine	1	6
	Tööplaan: rea seoste muutmine/lisamine; vaate seadistus (Pre-live)	1	13
5357	Vabatahtlik pealik ei näe palgalise kasutaja detailandmeid	1	6
5371	VÕPIS üksiksündmuse testimine/koolitus	1	6
5378	VÕPIS dumpi avamine	1	6

#### Sprint 6.7:

ID	Pealkiri	Prio	Kokku
5322	AD sünkroniseerimise refaktooring	2	120
3932	Analüüs: Sõiduauto dokumendi koopia	2	23
5292	Testraport: Liikmelisuse andmed - mallis andmete mäppimine (Sõidukompensatsioon)	2	12
3932	Analüüs: Sõiduauto dokumendi koopia	1	6
5269	E-koolituse vead (leitud prelive testimisel)	1	6
	Kandideerimise funktsionaalsuse integratsioon	1	13
5391	Kasutaja struktuuriü. ei vahetu osades moodulites	1	6
4745	Mittetsentraalseks märgitud väli liituja sündmuse detailvaates lukus ja eeltäidetud	1	6
	Nädalaplaan: lisada seos "Üldkoosseis" ja kokkuvõtavad andmed	1	13
5383	PORTAL-FM-TEST keskkonnas pole võimalik liitumistaotlust esitada	1	6
5307	Profiili pildi üles laadimine error - Parameter is not valid (prelive)	1	6
5321	Taustatööde eraldamine eraldi projekt	1	6
5292	Testraport: Liikmelisuse andmed - mallis andmete mäppimine (Sõidukompensatsioon)	1	6
4373	Testraport: VAABist liikme andmete kuvamine pealikule	1	6
5321	Taustatööde eraldamine eraldi projekt	1	29
5348	API „end-pointide“ automaattestide korrastamine: VÕPISse puuduolevad testid	1	4
5406	Tarne	1	6
5391	Kasutaja struktuuriü. ei vahetu osades moodulites	1	5
5326	Sündmuste tabeli jõudlus	1	15
5400	Testkeskkond annab tehnilist viga avalehel, sündmuste nimekirjas jne	1	1
2582	Koondsündmuse dubleerimine	1	7
2506	Sündmuse kinnitaja muutmine	1	2
	Projekti juhtimine, ajahinnangud, standupid	1	90

**Sprint 6.8:**

ID	Pealkiri	Prio	Kokku
4658	VÕPISes kuvab töötajat 2 korda	2	4
5323	Mass teavituste väljasaatmise optimeerimine	1	75
5399	Full ADsync + Süsteemi vaheline sünk	1	15
5379	Liitumistaotluse otsuse lisamisel "salvesta ja edasta"	1	6
5382	Liitumistaotluse juures keeldumisel ka käskkirja nr ja käskkirja fail	1	4
5395	Kasutajale ei indikeeri, et otsuse kommentaari väli kohustuslik	1	4
5397	Menetlusprotsessi vead	1	22
5393	Teavitage muutmist vajavatest andmetes-> töötaja ei saa faili avada	1	9
5140	Check Ip Access Token Failed	1	9
5143	Hack attempt exception	1	9
5404	Internal Uue migratsiooniga tekib viga	2	7
2727	Sündmuse nimekirja järjestamine	1	15
2728	Sündmuste nimekirjas koondsündmuse kuvamine	1	60
5396	Mõlemale menetlejale ei tule teavitust	1	1
5401	VÕPISe registreerimisvormil ik ja struktuuriüksuse väli tühi	1	5
2729	Sündmuse muutmisel ka teade struktuuriüksuse juhile/liikmetele	1	9

**Sprint 6.9:**

ID	Pealkiri	Prio	Kokku
5324	Mass teavituste ridade kirja kiire kasv	1	0
5327	Rollide ja õiguste kombinatsioonide testimine	2	175
5223	Liitumistaotlus on esitatud, siis ei tohi saada teha uut liitumistaotlust	1	8
4240	Avalehe kalender ja sündmused->kalender	1	15
5386	Portaalis uudise juurde lisatud fail annab tehnilist viga	1	9
5387	Peakasutajal ja eriorg (NKK, KT, NK) ei avane RSS uudised	1	15
4240	Avalehe kalender ja sündmused kalender sisu ühesugune	1	6

5327	Üldine: Rollide ja õiguste kombinatsioonide testimine + automaattestid	1	6
------	--	---	---

#### Sprint 6.10:

ID	Pealkiri	Prio	Kokku
5427	VÕPIS jõudluseks/stabiliseerimiseks ettenägematud tehnilised tööd (sidustööd)	1	30
5325	Auditlogi tabeli andmete arhiveerimine ja põhibaasist välja tõstmine	2	37
5349	API „end-pointide“ automaattestide korrastamine: Portaali puuduolevad testid	2	11
5350	API „end-pointide“ automaattestide korrastamine: CI test kontroll sisselülitamine	1	2
5368	Lõputu tsükkel frontend'is	1	15
5266	Koolitusele faili lisamine	1	30
4791	iPad (Responsive) - Ipadis menüüs moodulid puudu	1	9
4111	Vabatahtlik personalipealik	1	45
4965	Rolli detailvaate muudatuste ajaloost saab teha väljavõtte KL isikkoosseisust	1	0
5250	CI seadistamine TEST Keskkonnas	1	11
5384	Lehekülje freezimise probleemi, et vahepeal 30-60 sek lahekülg frozen ja ükski päring apisse läbi	1	8
5264	Kõik töötajad näevad kõiki liitumistaotlusi kuigi ei tohiks	1	6
5239	UI poolsed kasutaja õigused ei lähe kokku Backend kasutaja õigustega	1	6
5414	Tehniline konsultatsioon	1	22

#### Sprint 6.11:

ID	Pealkiri	Prio	Kokku
4133	Eriaalagruppide nägemisulatus	1	31
3929	Grupi haldav struktuuriüksus	2	22
4447	Testraport: Sihtüksusega liitumine	1	12
4448	Testraport: Erialagruppi liikme lisamine	1	12
4125	Portaali lisada portaali haldurile uus õigus "Sihtüksuse gruppide haldamine	1	11
4126	Sihtüksuse grup lisamine + liikmed	1	23

4127	Sihtüksuse grupi liikmele teavituse saatmine	1	3
4132	Erialagruppi liikme lisamine	1	67
5427	VÕPIS jõuduluseks/stabiliseerimiseks ettenägematud tehnilised tööd (sidustööd)	1	40
5106	"Minu profiil" > põhiandmed: erialagrupid	1	12
5414	Tehniline konsultatsioon	1	20

#### Sprint 6.12:

ID	Pealkiri	Prio	Kokku
5388	Noorteorg. näevad AK dokumente kuigi ei tohiks	2	7
5308	Foorumi teavituse sisus vale kuupäev	2	6
5310	Foorumi kommentaaride sulgemine ei õnnestu	2	6
4445	Testraport: Liikme foto kuvamine ja detailvaates sõnumi saatmine	2	12
5427	VÕPIS jõuduluseks/stabiliseerimiseks ettenägematud tehnilised tööd (sidustööd)	1	30
3456	Kalendrisündmusele detailotsinguga osaleja lisamine annab vea	2	56
4153	Kasutaja detailvaates foto kuvamine	2	14
4154	Kasutaja detailvaates sõnumi saatmine	2	6
4155	Liikmel/töötajal vabatahtliku liikme foto kuvamine	2	16
5291	Taotlusel/dokumendil kuvatavate taotlejate andmete kontroll	2	14
3591	Logikirjed kasutajate tegevuste kohta	2	12
3592	Peakasutaja logide vaatamine	2	12
3593	Sõnumi vaatamise logimine	2	12
4893	V7.1.3 nr 5 Peakasutaja tegevused toimingute logis [sise, web]	2	4
4924	pealikule ja portaali haldurile kuvatakse nimekirjas peakasutaja "sisestamisel" uudiseid	2	7
4984	Väliste isikute kustutamisel ei muutu "ei ole aktiivne" ja logides pole kustutamist	2	7
5414	Tehniline konsultatsioon	1	18

#### Sprint 6.13:



ID	Pealkiri	Prio	Kokku
	eDHS analüüs	1	62
5427	VÕPIS jõudluseks/stabiliseerimiseks ettenägematud tehnilised tööd (sidustööd)	1	20
4102	Sõidukompensatsiooni dokumendi lisamine	2	67
4258	Testlugu: Omniva liidestus - sõidukulude edastamine	2	12
5294	Sõidukompensatsioon ja andmete mäppimine	2	37
3834	Liikme välja astumise taotluse esitamine	2	30
4314	Portaalis asukoha valimine	2	11

#### Sprint 6.14:

ID	Pealkiri	Prio	Kokku
5426	KLA: VÕPIS/Portaali integreerimine KLA'ga (vastavalt KL sisendile)	1	57
5428	Portaal jõudluseks/stabiliseerimiseks ettenägematud tehnilised tööd (sidustööd)	1	20
4013	Ergutuste, tunnustuste esitamine	2	65
4256	Sõidukulude edastamine Omnivasse	2	112
4257	Sõidukulude dokumendi olekute pärimine Omnivast	2	49
4259	Testraport: Omniva liidestus - sõidukulude edastamine	2	12

#### Sprint 6.15:

ID	Pealkiri	Prio	Kokku
5426	KLA: VÕPIS/Portaali integreerimine KLA'ga (vastavalt KL sisendile)	1	57
5372	Portaal: juhendi täiendamine 3-4 etapi lisandunud funktsionaalsusega	2	62
5428	Portaal jõudluseks/stabiliseerimiseks ettenägematud tehnilised tööd (sidustööd)	1	77
3531	Kalendrisündumuse nägemisulatus - muudatus	2	0
5429	Turvatestimise vigade parandamine	1	40

**Sprint 6.16:**

ID	Pealkiri	Prio	Kokku
5428	Portaal jõudluseks/stabiliseerimiseks ettenägematud tehnilised tööd (sidustööd)	1	<b>60</b>
5429	Turvatestimise vigade parandamine	1	<b>142</b>
5414	Tehniline konsultatsioon	1	<b>20</b>

## Lisa 2. Projekti TOP3 peamist riski ja leevendusmeetmed

Riskijuhtimise protsess viiakse ellu koostöös Hankija, Pakkaja ja teiste projekti peamiste osapooltega. Seetõttu on alljärgnevalt toodud projekti iseloomu arvesse võttes esmane pakkuja kaardistus projekti riskidest ja nende leevendusmeetmetest. Riskide täiendav tuvastamine koos mõjude, tõenäosuste ja astmete määramisega viiakse läbi projekti alguses ning juhitakse kogu projekti jooksul koostöös Hankijaga.

ID	Riski kirjeldus	Vastutaja	Tõenäosus	Mõju	Leevendusmeetmed
RISK-01	Projektiplaanis toodud tähtjad võivad sattuda ohtu, kuid Tellija soovib projektiplaanis kokku lepitud tegevustes muutuseid.	Hankija	Keskmine	Keskmine	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projekti töödes teostatakse muutuseid erandkorras vaid Hankija ja Pakkaja läbirääkimiste tulemusena selliselt, et projekti üldised töömahud ei muutu (tööde asendamise tulemusena).</li> <li>2. Hilisemate vaidluste ja ebakõlade vältimiseks peavad sellised muudatused olema alati poolte poolt kirjalikult (e-mail) fikseeritud.</li> <li>3. Võimalikest määramatustest tulenevalt on projektiplaanis lõpptähtaja kaitsmiseks ette nähtud puhver.</li> </ol>
RISK-02	Pakkuja on arvestanud projektiplaanis juulis 2-nädalase Finestmedia „kollektiivpuhkuse“, kuid teadmata Kaitseliidu puhkuste või muude eemalviibimiste tõttu võib ohtu sattuda projekti tähtaeg.	Hankija, Pakkaja	Keskmine	Keskmine	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projektiplaanis teadaolevate Hankija ja Pakkaja puhkuste või muude eemalolekutega arvestamine (hiljemalt lepingu sõlmimise hetkeks).</li> <li>2. Hankija ja Pakkaja poolne valmisolek puhkuste või muude eemalolekute ümberplaneerimine projekti eesmärgi saavutamiseks vajalike meeskonnaliikmete ulatuses.</li> <li>3. Puhkuste või muude eemalolekute ajaks pädeva ja projekti sisust teadlike asendajate määramine.</li> <li>4. Võimalikest määramatustest tulenevalt on projektiplaanis lõpptähtaja kaitsmiseks ette nähtud puhver.</li> </ol>
RISK-03	Kolmandast osapooldest sõltuvus turvatestide läbiviimise alguse ja kestvuse osas võib ohtu sattuda projekti tähtaeg.	Hankija	Kõrge	Kõrge	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lepingu sõlmimise ajaks Hankija poolsed kokkulepped kolmanda osapoollega turvatestimise alguse ja tulemite (raportite) Pakkujale edastamise kuupäevade osas.</li> <li>2. Projektiplaanis on turvatestimiseks ette nähtud 4 nädalat. Tähtaegade viibimise osas eskaleerimine juhtkondade tasemele ning võimalike muudatuse kokkuleppimine.</li> <li>3. Võimalikest määramatustest tulenevalt on projektiplaanis lõpptähtaja kaitsmiseks ette nähtud puhver.</li> </ol>

### Lisa 3. Hankelepingu eelnõu

Käesolevas peatükis on hankemenetluse jooksul Hankija ja Pakkuja vaheliste läbirääkimiste tulemusena kokku lepitud hankelepingu eelnõu.

## HANKELEPING

Teenuse ostmine

Väljakuulutamisetä läbirääkimistega hankemenetlus

KAITSELIIDU VABATAHTLIKE INFOPORTAALI JA VÄLJAÕPPE INFOSÜSTEEMI ARENDUSTÖÖDE  
HANKIMINE

Riigihanke viitenumber: 277757

**Kaitseliit** (edaspidi Tellija), registrikood 74000725, asukoht Toompea tn 8, 10142 Tallinn, keda esindab Kaitseliidu ülem Kindralmajor Ilmar Tamm

ja

**AS Finestmedia** (edaspidi Taitja), registrikood 10714404, asukoht Tartu mnt 80D, 10112 Tallinn, keda esindab juhatuse liige Jan Urva,

edaspidi ka pool või pooled, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

### 1. Lepingu ese

1.1. Lepingu eesmärk on teostada täiendavad analüüsi-, arendus- ja testimise tööd vabatahtlike portaalile (edaspidi Portaal) ja väljaõppe infosüsteemile (edaspidi VÕPIS) vastavalt hankedokumentide osas olevale tehnilisele kirjeldusele.

1.2. Tellija tellib ja Taitja kohustub alates Lepingu sõlmimise kuupäevast vastavalt Projektiplaanile (Lisa 3) teostama hankedokumentides kirjeldatud Portaali ja VÕPIS infokeskkonna funktsionaalsuste ning tehnilise võimekuse saavutamiseks vajalikud analüüsi-, seadistus- ja arendustööd ning liidestused.

1.3. Tellija ostab ja Taitja osutab 36 (kolmekümne kuue) kuu jooksul alates Lisas 3 fikseeritud tööde valmimisest täiendavat arendusteenust ning hooldus- ja tugiteenust, mille tunnipõhine hind lepitakse Tellija ja Taitja vahel kokku Lisa 3 tööde lõppemise järgselt hoolduslepinguga.

1.4. Lepingu sõlmimise aluseks ja lahutamatuks lisadeks on lisaks eelloetletud lisadele Tellija "Kaitseliidu vabatahtlike infoportaali ja väljaõppe infosüsteemi arendustööde hankimise tööd" hanke (eRHR viitenumber 277757) Hankedokumendid (Lisa 2) ja Taitja 22.04.2024 esitatud pakkumus (eRHR pakkumus nr ..... ) (Lisa 1), arvestades käesolevas Lepingus kokkulepitud erisusi. Dokumentide vastuolu korral lähtutakse eelkõige Lepingust, seejärel hankedokumentidest ja Taitja pakkumusest.

## 2. Lepingu maksumus

2.1. Lepingujärgne maksimaalne maksumus on 192 465 eurot käibemaksuta. Koos käibemaksuga on maksumus 234 807,30 eurot (kakssada kolmkümmend neli tuhat kaheksasada seitse eurot ja 30 senti). Tööde teostamise tähtaja osas on kokku lepitud, et tööde teostamise lepingujärgne maksimaalne maht on 2 961 (kaks tuhat üheksasada kuuskümmend üks) tundi ning selle tundide arvuga suudab Täitja tähtaegselt täita kõik Hanke Tehnilises Kirjelduses (Hankedokumendid Lisa 1) loetletud tööd.

2.2. Tellija turvatestimist teostavalt partnerilt turvalisuse testide tellimisel ja OWASP ASVS 3.0 Level 3 standardist tulenevatest nõuetest puuduste tuvastamisel tuleb puudused kõrvaldada ilma tellijapoolse lisaressursita. Puuduse kõrvaldamist alustatakse kolme (3) tööpäeva jooksul alates puuduse Täitjale teada saamisest.

2.3. Lepingu maksumus on Tellija jaoks lõplik, sisaldades kõiki Täitja kulutusi, mis tekivad seoses Lepingu täitmisega.

## 3. Maksmine

3.1. Tellija tasub teostatud tööde eest Lepingu Lisa 3 (projektiplaan) alusel Täitjaga kokku lepitud tööde teostamise graafikus sätestatud etappide, tähtaegade ja summade kaupa.

3.2. Tellija ei tasu Täitjale ettemaksu.

3.3. Täitja esitab arve Tellija kontaktisikule pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise akti (edaspidi akt) mõlemapoolset allkirjastamist. Arve tuleb esitada e-posti teel PDF vormingus või Eesti Pangaliidu poolt välja töötatud e-arve XML vormingus e-posti aadressile arved.it@kaitseliit.ee.

3.4. Täitja poolt esitatav arve peab selgelt sisaldama makse teostamiseks vajalikke andmeid, Tellija kontaktisiku nime, ning vastama käibemaksuseaduse nõuetele. Käesolevas punktis esitatud tingimustele mittevastav arve ei kuulu tasumisele.

3.5. Tellija kohustub tööde eest tasuma 21 (kahekümne ühe) kalendripäeva jooksul allkirjastatud aktil toodud mahus.

3.6. Lõpparve maksmine eeldab Täitja kõigi Lepingu järgsete kohustuste täitmist ning Tellija poolt vastuvõtmist.

3.7. Tellijal on õigus Lepingu rikkumise korral arvestatud leppetrahvid ja kahju hüvitised maha arvata Lepingu alusel Täitjale tasumisele kuuluvatest summadest.

3.8. Tellija poolt makstud mistahes summa, mis ületab Täitjale Lepingus ettenähtu, maksab Täitja tellijale tagasi 20 (kahekümne) kalendripäeva jooksul pärast vastava teate saamist.

## 4. Tööde üleandmine ja vastuvõtmine

4.1. Tööd on jaotatud etappideks ja alametappideks, mis võetakse vastu ja antakse üle tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga (näidis lisa 4) etapipõhiselt vastavalt projektiplaanile Lisa 1.

4.2. Töö vaheetappide ja töö lõpliku vastuvõtmise tähtajad on kindlaks määratud Lepingu lisa 3 (Lisa 3 projektiplaan), mida mõlemad pooled peavad järgima. Juhul kui üks pool tähtaegasid ei

järgi, on teisel poolel õigus nõuda oma kohustuste täitmise tähtaegade proportsionaalset edasilükkamist.

4.3. Tööde üleandmise all mõistetakse tööde üleandmist Täitja poolt Tellijale akti (lisa 4) alusel.

4.4. Täitja kohustub koos aktiga Tellijale üle andma kõik Lepingu täitmisel saadud ja loodud materjalid.

4.5. Töö või töö etapi üleandmine Tellijale ei ole käsitatav selle vastuvõtmisena Tellija poolt.

4.6. Akti esitamisele järgnevast tööpäevast arvates on Tellijal 5 (viie) tööpäeva aega tööde üle vaatamiseks. Tellijal on õigus vajadusel nimetatud perioodi pikendada 1 (ühe) korra maksimaalselt eelmainitud aja võrra, teavitades sellest enne tähtpäeva saabumist Täitjat 3 (kolm) tööpäeva ette.

4.7. Akti allkirjastamine Tellija vastutava isiku poolt tähendab tema antud kirjalikku kinnitust, et tehtud tööd vastavad Lepingu tingimustele.

4.8. Kui Tellija tuvastab Täitja poolt teostatud töödes või aktis puudusi, võib ta tööde vastuvõtmisest keelduda või võtta vastu vaid nõuetekohaselt teostatud tööd. Vastuvõtmisest keeldumisel esitab Tellija Täitjale tööde mittevastavuse kohta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate, kirjeldades selles ära töödes või aktis esinevad puudused ja määrates puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja.

4.8.1. Juhul, kui Täitja ei kõrvalda töödes esinevaid puudusi Tellija poolt antud täiendava tähtaja jooksul, loetakse, et Täitja on Lepingut oluliselt rikkunud.

4.8.2. Juhul, kui Täitja ei kõrvalda puudusi põhjusel, et pooled ei jõua tehtud tööde kvaliteedi või Lepingule vastavuse osas kokkuleppele, siis kaasatakse sõltumatu ekspert. Eksperti otsus on pooltele täitmiseks kohustuslik. Eksperti kaasamise kulud tasub pool, kellele ekspert õigust ei andnud.

4.9. Tellija ei pea andma Täitjale täiendavat tähtaega töödes esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, kui tegemist on tööde olulise mittevastavusega Lepingule. Nimetatud juhul on Tellijal õigus keelduda teostatud tööde eest tasumisest puudustele vastavas osas, tellida vajalikud tööd kolmandalt isikult ning nõuda sellega seonduvalt tekkinud kulu sisse käesoleva Lepingu Täitjalt.

4.10. Enne töö üleandmist viib Täitja töö nõuetelevastavuse kindlakstegemiseks läbi testid.

4.11. Täitja esitab Tellijale kõik tema poolt läbiviidud testide tulemusena valminud dokumentide koopiad.

4.12. Enne töö vastuvõtmist viib Tellija töö nõuetelevastavuse kindlakstegemiseks läbi testid punktis 4.6. sätestatud tähtaegade jooksul.

4.13. Kui töö või mistahes töö osa ei läbi teste, viiakse otsekohe pärast seda, kui Täitja on teinud vajalikud korrektuurid testide edukaks läbiviimiseks, läbi kordustestid samadel tingimustel.

## **5. Kvaliteedi tagamine**

5.1. Täitja täidab lepingujärgsed kohustused vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni parimas praktikas rakendatavatele tehnilistele kvaliteedinõuetele, normidele ja standarditele.

5.2. Taitja peab omama tööde teostamiseks sobivaid keskkondi, koos kõige sinna juurde kuuluvaga sh kasutatava tarkvara litsentsid.

5.3. Tellijal on õigus tööde teostamise käigus kontrollida Taitja poolt teostatavate tööde kvaliteeti ja Lepingu tingimustest kinnipidamist.

5.4. Mittekvaliteetsete tööde või Lepingule mittevastavate tööde avastamisel informeerib Tellija kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koheselt Taitjat.

5.5. Taitjal on kohustus viivitamatult teavitada Tellijat probleemidest, mis segavad Lepingus toodud tööde teostamist ja tähtaegadest kinnipidamist ning õigus esitada Tellija kontaktisikule ettepanekuid tööde teostamise enda ja selle tähtaegade muutmiseks.

5.6. Tellijal on kohustus operatiivselt reageerida ja vastata Taitja poolsetele päringutele ja pöördumistele, mis segavad Lepingus toodud tööde teostamist ja tähtaegadest kinnipidamist.

5.7. Taitja lähtub arendustööde teostamisel kehtivatest andmekaitse printsiipidest.

5.8. Lepingu täitmise keel on eesti keel. Taitja tagab, et kõik Lepingu täitmisesse kaasatud meeskonnaliikmed valdavad eesti keelt väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas, alternatiivselt tagab omal kulul Lepingu kohase täitmise tõlgi vahendusel.

## **6. Garantii**

6.1. Garantii alla kuuluvaks puuduseks loetakse töö mittevastavust Lepingus ja selle lisades ning projekti käigus täiendavalt kokku lepitud nõuetele.

6.2. Tööde garantiiperiood algab iga tööetapi vastuvõtmisest Tellija poolt ja kehtib 12 (kaksteist) kuud tööetapi vastuvõtmisest arvates. Taitja kõrvaldab kõik garantiiperioodi jooksul ilmnevad puudused omal kulul, välja arvatud juhul, kui puuduste tekkimise eest vastutab Tellija.

6.3. Pooled arvestavad, et olukorras, kus töö pole akti alusel vastu võetud, on töö tulemite osaline või täielik toodangukeskkonnas (*live*) kasutuselevõtt aluseks nende tööde osade garantiiperioodide algusele.

6.4. Garantii kehtib tingimusel, et kõik infosüsteemi tööd mõjutavad muudatused töös on kooskõlastatud Taitjaga. Garantii katkeb juhul kui Tellija või kolmas osapool teeb tarnitud lähtekoodis kooskõlastamata muudatusi, välja arvatud juhul, kui Tellija suudab eristada lähtekoodis tehtavaid muudatusi.

6.5. Garantii alla kuulub muu hulgas operatiivne tugi probleemide lahendamisel ja vigade kõrvaldamisel Tellija poolt täiendavalt läbi viidavatel tarkvara testidel ning operatiivne vigade parandus probleemide ilmnemisel tarkvaras ja/või dokumentatsioonis. Garantii ei hõlma endas hooldus- ja tugiteenust.

6.6. Garantii kehtivusajal peab Taitja parandama rakenduses ilmnenu (varjatud) vead (sh turvavead) ilma selle eest lisa tasu võtmata, vigade parandamise tähtaeg lepitakse igakordselt eraldi kokku.

6.7. Juhul kui leitud puudus või viga ei kuulu garantiiteeninduse alla, teatab Taitja sellest Tellijale kirjalikult koos üksikasjaliku põhjendusega 3 (kolme) tööpäeva jooksul puuduse või vea teada saamisest.

6.8. Tellija informeerib Täitjat puuduse iseloomust ja ulatusest otsekohe selle ilmnemisel. Täitja on kohustatud eemaldama ilmnenu puudused vastavalt Lepingus toodule või Tellija poolt määratud ajale.

## **7. Load ja Litsentsid**

7.1. Täitja vastutab ainuisikuliselt Lepingu täitmiseks vajalike lubade ja litsentside saamise eest. Tellija teeb Täitjaga mõistlikku koostööd, hoidmaks ära selliste lubade või litsentside väljaandmise asjatut viivitamist või väljaandmisest keeldumist.

7.2. Tellija võib ilma ette teatamata Lepingu lõpetada, kui Täitja ei saa Lepingu täitmiseks vajalikku luba või litsentsi.

7.3. Täitja garanteerib, et tal on õigus anda Tellijale Lepingu objektiks oleva tarkvara ja teiste autori- või muude sarnaste õigustega kaitstavate esemete kasutamiseõigus.

7.4. Täitja garanteerib, et nimetatud kasutusõiguse üleandmisega ei rikuta kolmandate isikute õigusi. Juhul kui kolmas isik esitab oma õiguste rikkumise tõttu Tellija vastu hagi ning see rahuldatakse, tasub Täitja võimalikud kahjuhüvitusnõuded, samuti õigusabikulud ja muud seonduvad kulud.

## **8. Intellektuaalne omand**

8.1. Täitja loovutab Tellijale kõik varalised õigused autoriõiguse seaduse tähenduses käesoleva Lepingu alusel üle antud tulemitele, kaasa arvatud õiguse neid reprodutseerida, levitada ja üldsusele kättesaadavaks teha mistahes vormis ja kandjal, ilma geograafiliste piiranguteta. Autori varalised õigused loetakse Tellijale üle läinuks pärast tulemi lepingukohast vastuvõtmist Tellija poolt.

8.2. Täitja annab Tellijale ainulitsentsi isiklike õiguste kasutamiseks autoriõiguse seaduse tähenduses ja ulatuses, mis on vajalik, et Tellija saaks täiel määral teostada talle Lepinguga üle antud varalisi õigusi. Isiklike õiguste osas antav litsents on koos all-litsentseerimise õigusega ning kehtib ilma geograafiliste piiranguteta kogu autoriõiguste kehtivuse tähtajal alates tulemi lepingukohasest vastuvõtmisest Tellija poolt. Täitja kohustub tagama, et isiklikud õigused on teostatavad muuhulgas alljärgnevas ulatuses, võttes arvesse poolte vahel kokku lepitud garantiitingimusi ja hilisemalt kokkulepitavates hooldustingimustes:

8.2.1. Tellijal või Tellija tellimisel kolmandatel isikutel on õigus teha üle antud tulemis muudatusi ning seda täiendada ilma Täitja nõusolekuta (sellisel juhtumil lõpeb punktis 6 viidatud Täitja garantiikohustus);

8.2.2. Tellijal või Tellija tellimisel kolmandatel isikutel on õigus lisada tulemile teiste autorite teoseid ilma Täitja nõusolekuta (sellisel juhtumil lõpeb punktis 6 viidatud Täitja garantiikohustus);

8.2.3. tulemi üleandmisega Tellijale kinnitab Täitja, et tulem on üldsusele esitamiseks valmis ning Täitja on loobunud õigusest seda ise avalikustada, välja arvatud Tellija eelneval kirjalikul nõusolekul.

8.3. Täitja kinnitab ja tagab, et:



8.3.1. Täitja on vastavad õigused täielikult omandanud oma töötajate, töövõtjate, alltöövõtjate või koostööpartneritega sõlmitud lepingute alusel ning Täitjal on Lepingu alusel õigus nimetatud varaliste õiguste võõrandamiseks ning isiklike õiguste litsentseerimiseks Tellijale;

8.3.2. alates Lepingu sõlmimisest puuduvad temal, tema töötajatel, töövõtjatel, alltöövõtjatel, koostööpartneritel Tellija vastu mistahes nõuded tulenevalt varaliste autoriõiguste ja litsentseeritud isiklike õiguste võimalikust rikkumisest;

8.3.3. juhul kui tulemi kasutamine on takistatud kolmandate isikute intellektuaalomandi õigustest või nende rikkumisest tulenevate nõuete tõttu, on Täitja kohustatud nimetatud takistused omal kulul kõrvaldama;

8.3.4. Täitja ei paku tulemit ja/või sellega äravahetamiseni sarnaseid teoseid ja/või tuletatud tulemit kolmandatele isikutele. Äravahetamiseni sarnasuse määramisel arvestatakse tulemi ning selle kujunduse jäetavat üldmuljet, kusjuures suuremat osatähtsust omistatakse tulemis sisalduvatele autoriõigusega kaitstud elementidele.

8.4. Lepingu alusel üle antud õigused ja litsents hõlmab kõiki edasisi tulemi arendusi. Lepingu alusel annab Täitja Tellijale õiguse luua oma äranägemisel tuletatud teoseid tulemi edasiarendamise teel.

8.5. Täitjal on õigus tulemit või selle osa kasutada näidisena oma loomingut sisaldavas portfoolios, sealhulgas avaldada portfoolio digitaalsel kujul või paberkandjal, üksnes Tellija eelneval kirjalikul nõusolekul.

8.6. Tulemi vastuvõtmisega Tellija poolt läheb Täitjalt Tellijale üle õigus tulemit ja selle dokumentatsiooni muuta, täiendada, kasutada mistahes viisil ilma täiendava tasuta. Nimetatud õiguse üleminek jääb kehtima ka Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel.

8.7. Täitja tagab Tellijale kõik vajalikud õigused Lepingu täitmise käigus loodava tulemi kontrollimiseks, testimiseks ning süsteemi paigutamiseks ka ajaks, mil tarne on üle antud, kuid pole veel lepingukohaselt Tellija poolt vastu võetud.

## **9. Sanktsioonid**

9.1. Poolte koguvastutus käesoleva Lepingu täitmisel on piiratud Lepingu kogumaksumusega. Eelnimetatud piirang ei kehti Lepingu tahtliku rikkumise korral.

9.2. Lepinguliste kohustuste rikkumise eest võib Tellija Täitjalt sisse nõuda leppetrahvi või pidada leppetrahvi kinni Täitjale makstavast summast, mis aga ei välista muude õiguskaitsevahendite kasutamist, mh nõuda kahju hüvitamist.

9.3. Tööde teostamise kokkulepitud ajakavast kõrvalekaldumise korral pole Täitjal õigust nõuda kahjude korvamist, kui see on Täitja nõuetekohase tegevusega välditav ja kahjud ei ole tekkinud Tellija otsesel süül.

9.4. Kui Täitja viivituse põhjustab Tellija, on Täitjal õigus nõuda mõistlikku ajapikendust ja põhjendatud lisakulude hüvitamist. Täitja peab Tellijat viivitusest ning sellest tulenevatest tagajärgedest kohe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis informeerima.

9.5. Tellija peatab Täitjale lepingujärgsete summade maksmise kas osaliselt või täielikult, kui:

9.5.1. Taitja ei täida Lepingut;

9.5.2. tööde teostamise käigus, testimise käigus või aktis avastatakse puudusi või muid Taitja poolseid kohustuste rikkumisi;

9.5.3. Taitja lepingujärgsete kohustuste õigeaegset ja korrektset täitmist segab asjaolu, mille eest vastutab Taitja.

9.6. Taitja võib peatada tööde teostamise kas osaliselt või täielikult, kui:

9.6.1. Tellija ei täida Lepingut;

9.6.2. Tellija ei tasu lepingujärgset maksumust õigeaegselt;

9.6.3. Taitja lepingujärgsete kohustuste õigeaegset ja korrektset täitmist segab asjaolu, mille eest vastutab Tellija.

9.7. Tööde teostamisel sh vigade kõrvaldamisel tekkivate Taitja ja Tellija vaheliste erimeelsuste lahendamisel lähtutakse eelkõige tööde eesmärkidest Tellija seisukohalt. Kui Taitja ei nõustu Tellija seisukohaga, lasub Tellija seisukoha mitesobivuse tõendamise kohustus Taitjal.

9.8. Kui Tellija keeldub või hoiab kõrvale nõuetekohaselt teostatud tööde akti allkirjastamisest ja tööde eest tasumisest, on Taitjal õigus nõuda viivist 0,15% (null koma viisteist protsenti) päevas tasumata summalt, kuid mitte rohkem kui 15% (viisteist protsenti) vastuvõtmisest keeldutud tööde maksumusest.

9.9. Kui Tellija keeldub või hoiab kõrvale nõuetekohaselt teostatud tööde akti allkirjastamisest ja selle eest tasumisest üle 30 (kolmekümne) päeva, on Taitjal õigus Leping üles öelda.

9.10. Kui Taitja ei teosta töid, ei anna töid Tellijale akti alusel üle või ei kõrvalda vigu kokkulepitud ajal ja tingimustel, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi 0,15% (null koma viisteist protsenti) päevas teostamata või üle andmata tööde maksumusest, kuid kokku mitte rohkem kui 15% (viisteist protsenti) teostamata tööde hinnast. Tellijal on õigus tööde eest tasumisel vähendada Taitjale makstava tasu suurust leppetrahvi summa võrra.

9.11. Tööde tähtjaks esitamata jätmisel Taitja poolt on Tellijal õigus nõuda Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmisega tekitatud tõendatud kahju hüvitamist.

9.12. Pooled peavad esitama Lepingust tuleneva leppetrahvi nõude kohustusi rikkunud poolele mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) kuu jooksul arvates päevast, mil poolel tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus.

9.13. Lepingust tulenevate leppetrahvide maksmine, samuti tekitatud kahju hüvitamine, ei vabasta Lepingut rikkunud poolt lepingujärgsete kohustuste täitmisest.

## **10. Personal**

10.1. Lepingus kirjeldatud tööd peavad teostama Taitja pakkumuses esitatud ja Tellija poolt kvalifitseeritud isikud. Taitja võib pakkumuses toodud meeskonna liikmeid asendada ainult Tellija kirjalikul nõusolekul.

10.2. Vajadusel töötab Taitja projektimeeskond Tellija ruumides, järgides Tellija ruumide kasutamise korda ja teisi turvalisusega seotud nõudeid ja piiranguid, mida Tellija on Taitjale tutvustanud.

10.3. Täitja vastutab Tellija otstarbeka kaasamise eest, vältimaks puudusi dokumentatsioonis või kõrvalekaldumist tööde ajakavast.

10.4. Täitja poolt Lepingu täitmiseks esitatud isikud ei tohi olla Tellija teenistuses.

10.5. Tellija ja Täitja vastutavad kontaktisikud on Lepingus määratud isikud, kellel on õigus koostada ettekirjutusi, võtta vastu ja anda üle tööd, allkirjastada tööde üleandmisevastuvõtmise akte, protokolle ja teateid.

10.6. Tellija vastutavaks isikuks vastuvõtmise aktide, teadete jms Lepinguga seonduvate dokumentide allkirjastamisel on Markus Keerman (e-post: [markus.keerman@kaiitseliit.ee](mailto:markus.keerman@kaiitseliit.ee); tel 5103089, 53060023).

10.7. Täitja vastutavaks isikuks üleandmise aktide, teadete jms Lepinguga seonduvate dokumentide allkirjastamisel on valdkonnajuht Anneli Undrest (e-post: [anneli.undrest@finestmedia.ee](mailto:anneli.undrest@finestmedia.ee); tel 53332120).

## 11. Konfidentsiaalsus

11.1. Konfidentsiaalse informatsiooni all mõistavad pooled Lepingu täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid, turvaandmeid ning muud teavet, mille avalikuks tulek võiks kahjustada teise poole huve.

11.2. Pooled peavad Lepingu täitmise käigust teineteiselt ükskõik mis vormis saadud kogu informatsiooni, millele seda avaldanud pool on osutanud kui konfidentsiaalsele või mille konfidentsiaalsust võib mõistlikult eeldada, konfidentsiaalseks (sh *know-how*) ja ei anna seda edasi kolmandatele isikutele ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud seadustes ettenähtud juhtudel.

11.3. Täitja on kohustatud käsitlema Lepingu täitmisel temale teatavaks saanud informatsiooni Tellija ja tema tegevuse kohta konfidentsiaalsena. Täitja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Lepingu täitmise käigus temale teatavaks saanud Tellija asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet. Täitja on kohustatud kaitsma temale Lepingu täitmise käigus teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsust. Vastavasisulise informatsiooni müümine, pakkumine või levitamine Täitja või temaga seotud isiku poolt käsitletakse kui Lepingu olulist rikkumist.

11.4. Pooled täidavad kõiki Lepingu täitmise kohas kehtivaid isikuandmete töötlemisalaseid nõudeid, andmete turvalisust puudutavaid õigusakte ja muid eeskirju ning nende rikkumisel vastutavad iseseisvalt ja õigusaktides sätestatud korras.

11.5. Pooled võivad teise poole kirjalikul nõusolekul võimaldada juurdepääsu konfidentsiaalsele informatsioonile nendele isikutele, kellel on selleks oma tööülesannete täitmiseks vajadus ning tagavad, et need isikud on teadlikud isikuandmete töötlemisalastest nõuetest ja õigusaktidest.

11.6. Konfidentsiaalsuskohustuse nõue on tähtajatu ning kehtib osapooltele nii Lepingu täitmise ajal kui ka pärast Lepingu lõppemist.

## **12. Avalikud suhted**

12.1. Täitjal puudub volitus tegeleda Lepingu raames avalike suhetega ning anda teateid pressile, elektroonilisele meediale, üldsusele või teistele auditooriumidele, välja arvatud Tellija eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolekul.

12.2. Täitja paneb punktis 12.1 sätestatu kohustuseks kõikidele kolmandatele isikutele, keda ta kasutab oma lepingujärgsete kohustuste täitmisel.

## **13. Lepingu muutmine**

13.1. Kõik Lepingu muudatused vormistatakse Lepingu lisadena.

13.2. Täitja ei tohi Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda ega muul viisil loovutada kolmandale isikule ilma Tellija eelneva kirjaliku nõusolekuta.

13.3. Lepingu muutmises võib kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud võimalik Lepingu sõlmimise ajal ette näha ja Lepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või osalises osas ohtu Lepinguga taotletud eesmärgi saavutamise.

13.4. Tellija ei või Lepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega taotletavat eesmärki on võimalik saavutada uue hankelepingu sõlmimisega.

13.5. Lepingu muudatused jõustuvad nende allkirjastamisel mõlema poole poolt või allkirjastatud poolte kokkuleppes määratud tähtajal.

13.6. Lepingu tingimusi võib muuta ainult mõlemapoolselt allkirjastatud Lepingu lisana.

13.7. Muudatused tööde ajakavas ning kulude muudatused eelarveridade vahel ei ole käsitletavad Lepingu muutmisena tingimusel, et Lepingu täitmise lõpptähtaeg ei muutu ning Lepingu kogumaksumus ei suurene.

## **14. Infovahetus**

14.1. Kõik teated, millel ei ole õiguslikku tagajärge, võivad olla esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning peavad olema adresseeritud Lepingu punktis 10 sätestatud kontaktisikutele. Teade loetakse kättesaaduks, kui e-posti või telefoni teel saadud teate saamist on kinnitatud e-posti teel.

14.2. Kui teisele poolele edastatav teade eeldab vastust, tuleb vastata viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul.

14.3. Kõik Lepinguga ja Lepingu täitmisega seotud pretensioonid peavad olema esitatud kirjalikult.

14.4. Tellija varustab Täitjat tema käsutuses oleva mistahes informatsiooni ja dokumentatsiooniga, mis võib olla Lepingu täitmiseks oluline või mida Täitja mõistlikkuse piirides Lepingu täitmiseks nõuda võib.

14.5. Kontaktisikute muutumisel tuleb sellest viivitamatult teist poolt teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Nimetatud teade lisatakse Lepingu juurde ning ei käsitleta Lepingu muutmisena.

14.6. Täitja kohustub kohe kirjalikult informeerima Tellijat kõikidest Täitjale teadaolevatest asjaoludest, mis võivad takistada Lepingu õigeaegset täitmist.

14.7. Tellija kohustub kohe kirjalikult informeerima Täitjat kõikidest Täitjale teadaolevatest asjaoludest, mis võivad takistada Lepingu õigeaegset täitmist.

14.8. Tellijal on õigus tööde täitmise üle kontrolli teostamiseks nõuda Täitjalt kirjalike ja suuliste seletuste esitamist tööde teostamise kohta, kui see ei koorma Täitjat ebamõistlikult ega takista Lepingu tulemite saavutamist.

## **15. Töökorraldus ja dokumentatsioon**

15.1. Lepingu Lisas 3 osapoolte poolt ühiselt koostatud ja kokku lepitud projektiplaan, mille järgimine on mõlema osapoolle eesmärgiks.

15.2. Täitjal peab olema võimekus seada üles Täitja poolt hallatav arenduskeskkond, milles teenuse Täitja teostab oma arendusi kuni arendustöö tulemuse üleviimiseni Kaitseliidu keskkondadesse. Täitja loob eeldused ja võimalused efektiivseks testimiseks ning veahalduseks. Täitja veahalduse keskkonda saab Tellija registreerida avastatud vigu ja jälgida nende lahendamist.

15.3. Täitja kohustub süsteemi loomise ajal testkeskkonnas ja peale valmimist ning majutuskeskkonda paigaldamist viima läbi funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed testid ning vajalikud jõudluse testid. Lisaks omapoolsele testimisele on Täitja kohustatud koostama Tellijale testlood, kaasama Tellija esindajad testimisse ja esitama testimise raportid.

15.4. Täitja peab pakkuma elektroonse projekti halduse keskkonna töödokumentatsiooni salvestamiseks ja projekti käigus infovahetuseks. Arendusprojekti suhtlus Tellija ja Täitja vahel peab toimuma ühes elektroonilises keskkonnas. Keskkond peab olema Tellijale ligipääsetav ka pärast projekti lõppemist 1 (ühe) aasta jooksul, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

15.6. Täitja peab pakkuma agiilise arenduse (SCRUM) arendusmetoodikat, kombineerituna järjestikkulise tarkvaraarenduse metoodikaga.

15.7. Kasutajaliidese kõik disainiotsused peavad kirjalikult taasesitataval kujul olema kooskõlastatud Tellijaga.

15.8. Juurutamine viiakse läbi Tellija poolt, vastavalt Täitja koostatud ja täienduste osas ajakohastatud juhenditele. Täitja abistab distantsilt nõustamisega, vahetu tegevus kohapeal vaid äärmisel vajadusel ja eelneval sellekohasel kokkuleppel.

15.9. Täitja lepingujärgsete kohustuste täitmine ei tohi tekitada häireid Tellija mistahes teiste liidestatud süsteemide talitluses.

15.10. Tellija võib igal ajal Lepingu kehtivuse vältel muuta või kehtestada juurdepääsupiiranguid ja turvaprotseduure. Kui Täitja tõendab, et selline muudatuste tegemine või piirangute või protseduuride kehtestamine põhjustas lisakulusid, on tal õigus nende hüvitamisele.

15.11. Täitja tagab Tellija süsteemi administraatoritele tehnilise konsultatsiooni, kindlustamaks tarkvara ja teenuste rahuldava ja efektiivse toimimise, mahus 2 x 2h.

15.12. Lepingu täitmisel kaasneva dokumentatsiooni loomisel toetutakse hankedokumentide koosseisu esitatud üle antava dokumentatsiooni loetelule ning eelistatakse dokumentide elektroonset vormi.

15.13. Täitja varustab Tellijat piisava dokumentatsiooniga, mis on vajalik, et Tellija saaks käesoleva Lepingu alusel loodud töid efektiivselt kasutada, hooldada ja kohandada, täiendades juba olemasolevat dokumentatsiooni või koostades vajadusel uue dokumentatsiooni.

## **16. Vääramatu jõud**

16.1. Pool ei vastuta kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise eest, kui Lepingu rikkumine oli tingitud vääramatust jõust. Vääramatu jõu esinemisel lükkub kohustuste täitmine edasi vastavalt asjaoludele ja nende tulemuste kestmise aja võrra. Pooled eeldavad, et kohustuste rikkumine ei ole tingitud vääramatust jõust.

16.2. Vääramatuks jõuks loetakse loodusõnnetusi, üldisi elektrikatkestusi, sõjategevust, blokaadi või rahvusvaheliselt tunnustatud muid poolte tahtest sõltumatuid asjaolusid, mida ei võinud ette näha, mis ei allu poolte tahtele ning teevad võimatuks Lepingust tulenevate kohustuste täitmise.

16.3. Vääramatu jõu poolt mõjutatud pool peab 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates vääramatu jõu esinemisest sellest teisele poolele kirjalikult teatama, hinnates millises ulatuses ja kui pika perioodi vältel ta on võimetu oma kohustusi täitma. Vääramatust jõust tingitud takistuste lakkamisel peab mõjutatud pool teatama sellest kohe sellele poolele. Juhul, kui pool ei ole õigeaegselt vääramatust jõust teatanud, puudub tal õigust sellele tugineda.

## **17. Lepingu kehtivus ja lõpetamine**

17.1. Leping jõustub selle allakirjutamisest ning kehtib kuni lepinguliste kohustuste täitmiseni. Mõlemal poolel on õigus Lepingut ühepoolset ennetähtaegselt lõpetada Lepingus ja seaduses toodud alustel.

17.2. Tellija võib igal ajal Lepingu üles öelda, teatades sellest 1 (üks) kuu ette. Sellisel juhul on Täitjal õigus nõuda tasu vaid Lepingu ülesütlemise hetkeks faktiliselt tehtud tööde eest.

17.3. Täitjal on õigus lõpetada Leping ennetähtaegselt, teatades sellest Tellijale kirjalikult ette vähemalt 2 (kaks) nädalat alljärgnevatel juhtudel, kui:

17.3.1. Tellija ei anna Täitjale õigeaegselt tööde teostamiseks vajalikku informatsiooni, dokumente, jooniseid, materjale jms;

17.3.2. Tellija keeldub või hoiab kõrvale nõuetekohaselt teostatud tööde vastuvõtmisest ja/või selle eest tasu maksmisest.

17.4. Ülaltoodud alustel Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel on Täitjal õigus Tellijalt sisse nõuda vaid tasu Lepingu lõpetamise hetkeks faktiliselt tehtud tööde eest.

17.5. Tellijal on õigus Leping erakorraliselt ette teatamata lõpetada täitjapoolse olulise Lepingu rikkumise korral. Oluliseks Lepingu rikkumiseks loetakse muuhulgas järgmised juhud:

17.5.1. Täitja on korduvalt jätnud täitmata lepingujärgsed kohustused;

17.5.2. Täitja ei kõrvalda puudusi või viivitab nende kõrvaldamisega üle 20 (kahekümne) tööpäeva;

17.5.3. Täitja rikkus kohustust tahtlikult või raske hooletuse tõttu;

17.5.4. Täitja ei saa Lepingu täitmiseks vajalikku luba või litsentsi;

17.5.5. Täitja rikub personaliga seonduvaid tingimusi;

17.5.6. Täitja rikub konfidentsiaalsusnõuet.

17.6. Käesoleva Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused ja lahkarvamused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

17.7. Leping tühistab kõik varasemad poolte vahelised suulised ja kirjalikud kokkulepped, mis puudutavad käesoleva Lepinguga ettenähtud tööde teostamist. Leping omab juriidilist jõudu ning saadetakse pärast allkirjastamist pooltele.

## 18. Lisad

Käesoleva Lepingu lahutamatuks lisadeks on:

18.1. Lisa 1. AS Finestmedia ..... 04.2024 Pakkumus Kaitseliidule;

18.2. Lisa 2. Hankedokumendid „Kaitseliidu vabatahtlike infoportaali ja väljaõppe infosüsteemi arendustööde hankimine“ (hanke nr 277757);

18.3. Lisa 3. Projektiplaan (.....04.2024 pakkumuse osa, koostatud KL-i soovitude alusel lepingueelsete läbirääkimiste käigus, hanke registris avaldamise järgselt);

18.4. Lisa 4. Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti näidis.

## 19. Poolte kontaktandmed

	<b>Tellija:</b>	<b>Täitja:</b>
Nimi:	Kaitseliit	AS Finestmedia
Reg. kood:	74000725	10714404
Aadress:	Toompea 8 10142 Tallinn	Tartu mnt 80D 10112 Tallinn
Tel.nr:	717 9005	655 8043
E-post:	<a href="mailto:info@kaitseliit.ee">info@kaitseliit.ee</a>	<a href="mailto:fm@finestmedia.ee">fm@finestmedia.ee</a>
Kodulehekülg	<a href="http://www.kaitseliit.ee">www.kaitseliit.ee</a>	<a href="http://www.finetmedia.ee">www.finetmedia.ee</a>

## Poolte esindajate allkirjad

Käesoleva Lepingu allakirjutamisega tõendavad mõlemad Lepingu pooled, et on tutvunud ja on nõus Lepingus toodud tingimustega ning mõistavad täielikult enesele võetavate kohustuste sisu ja tagajärgi.

Tellija:

*(allkirjastatud digitaalselt)*

---

Ilmar Tamm  
Kaitseliidu ülem

Täitja:

*(allkirjastatud digitaalselt)*

---

Jan Urva  
juhatuse liige



## Hankelepingu Lisa 4: TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

Käesolev tööde üleandmise- vastuvõtmise akt (edaspidi akt) on koostatud ..... (edaspidi Täitja) projektijuhi ..... poolt ja esitatud Kaitseliidu vastutavale isikule (edaspidi Tellija) ....., (edaspidi koos nimetatud pool või pooled) tõendamaks, et Täitja andis üle poolte vahel ..... 2024. a sõlmitud Lepingu nr ..... alusel teostatud tööd alljärgnevalt:

1. .... (tehtud tööd, maht, täidetud tingimused, vajadusel viited lepingupunktile vm).
2. Käesolevale aktile allakirjutamisega loetakse tööd Täitja poolt Tellijale üle antuks ning tööde juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Tellijale üle läinuks.
3. Käesolev akt on aluseks Täitja poolt Tellijale arve esitamiseks summas ..... eurot (millest ....eurot on käibemaks).
4. Käesolev akt omab juriidilist jõudu ning saadetakse pärast allkirjastamist pooltele.
5. Käesoleva akti lahutamatud lisad on:  
  
5.1. ....

Tellija:

*(allkirjastatud digitaalselt)*

---

Täitja:

*(allkirjastatud digitaalselt)*

---
