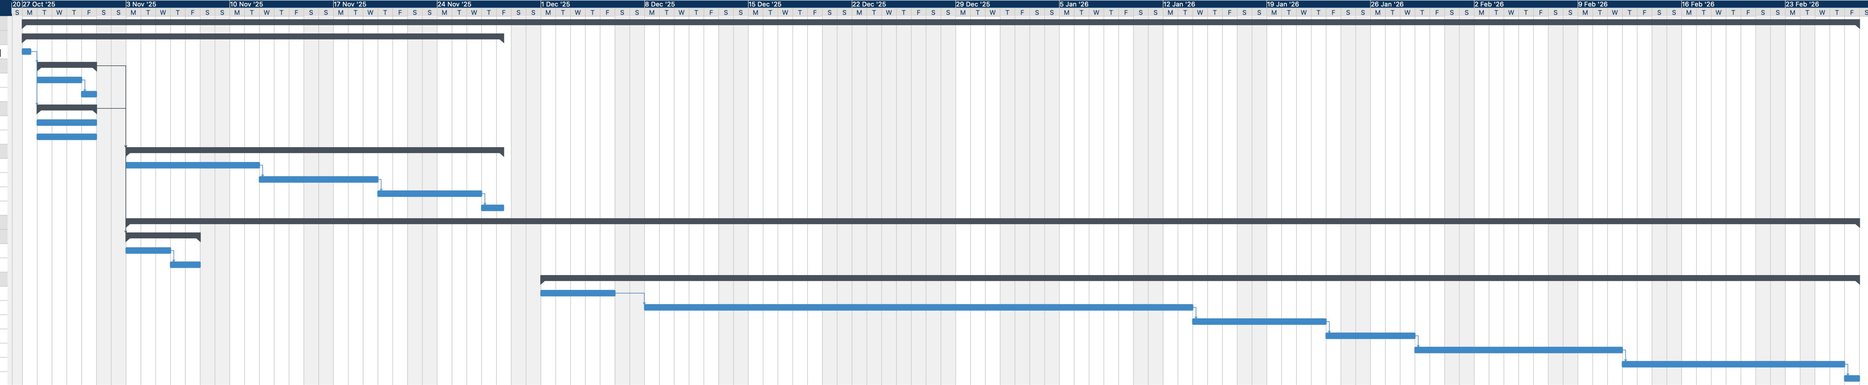| # | Task Name | Duration | Start | End | Resources |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Projekt** | 82 days | 27.10.2025 | 27.02.2026 | |
| 2 | **Etapp I** | 24.5 days | 27.10.2025 | 28.11.2025 | |
| 3 | Avakoosolek | 4 hrs | 27.10.2025 | 27.10.2025 | Projektijuht[40%];Arendaja[15%];Testija[15%];Hankija[15%];Analüütik[15%] |
| 4 | **Analüüs** | 4 days | 28.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 5 | Analüüsikoosolekud | 24 hrs | 28.10.2025 | 30.10.2025 | Analüütik[50%];Hankija[50%] |
| 6 | Dokumenteerimine | 8 hrs | 31.10.2025 | 31.10.2025 | Analüütik[200%] |
| 7 | **Arenduse eeltöö** | 4 days | 28.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 8 | Arenduskeskkonnade seadistus | 32 hrs | 28.10.2025 | 31.10.2025 | Arendaja |
| 9 | Ligipääsude hankimine ja seadista... | 32 hrs | 28.10.2025 | 31.10.2025 | Projektijuht[50%];Arendaja[50%] |
| 10 | **Arendus ja testimine** | 19.5 days | 03.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 11 | Drupal 11 uuendus | 56 hrs | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Arendaja[80%];Testija[20%] |
| 12 | CKEditor 5 uuendus | 48 hrs | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Arendaja[80%];Testija[20%] |
| 13 | Moodulite kohandamine | 40 hrs | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Arendaja[80%];Testija[20%] |
| 14 | Vastuvõtutestimine | 12 hrs | 27.11.2025 | 28.11.2025 | Hankija[80%];Projektijuht[20%] |
| 15 | **Etapp II** | 77 days | 03.11.2025 | 27.02.2026 | |
| 16 | **Analüüs** | 5 days | 03.11.2025 | 07.11.2025 | |
| 17 | Analüüsikoosolekud | 24 hrs | 03.11.2025 | 05.11.2025 | Analüütik[50%];Hankija[50%] |
| 18 | Dokumenteerimine | 16 hrs | 06.11.2025 | 07.11.2025 | Analüütik |
| 19 | **Arendus ja testimine** | 57 days | 01.12.2025 | 27.02.2026 | |
| 20 | Esituskihi ajakohastamine | 40 hrs | 01.12.2025 | 05.12.2025 | Arendaja[80%];Testija[20%] |
| 21 | Kasutatavuse probleemide lahenda... | 160 hrs | 08.12.2025 | 13.01.2026 | Arendaja[80%];Testija[20%] |
| 22 | Dockeri ühilduvus ja Helm skriptide... | 56 hrs | 14.01.2026 | 22.01.2026 | Arendaja |
| 23 | Dokumentatsiooni koostamine ja aj... | 32 hrs | 23.01.2026 | 28.01.2026 | Analüütik[40%];Arendaja[40%];Projektijuht[20%] |
| 24 | Puhveraeg | 80 hrs | 29.01.2026 | 11.02.2026 | |
| 25 | Vastuvõtutestimine | 80 hrs | 12.02.2026 | 26.02.2026 | Hankija[80%];Projektijuht[20%] |
| 26 | Tulemite üleandmine / Tootestamine | 8 hrs | 27.02.2026 | 27.02.2026 | Arendaja[60%];Projektijuht[20%];Hankija[20%] |
